

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 27/08/2024

Inspecteur: Brian Van Ingelghem

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23021913

Datum verslag: 27/08/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Bredabaan
Huisnummer 460
Busnummer 1002
Postcode 2930
Gemeente BRASSCHAAT
Land België

Eigenaar

Naam Enveco
Straatnaam Bredabaan
Huisnummer 460
Busnummer 1002
Postcode 2930
Gemeente BRASSCHAAT
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : appartement

EAN : 541 448 860 006 003 771

Teller Nr.: : 1SAG1100546121

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 1,85 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V


Meter / bord verbinding: 10 mm

Max beveiliging: 40 A

Aantal kringen: 10

RE: 3,15 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I-t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
--------	--------	-----------------	-----	------	--------------------	------	-------

I Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	16		2	1,5
7	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT


- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 27/8/2049
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Brian Van Ingelghem



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.


Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
 Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
 Elk ongeval, overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
 De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
 De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 27/8/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

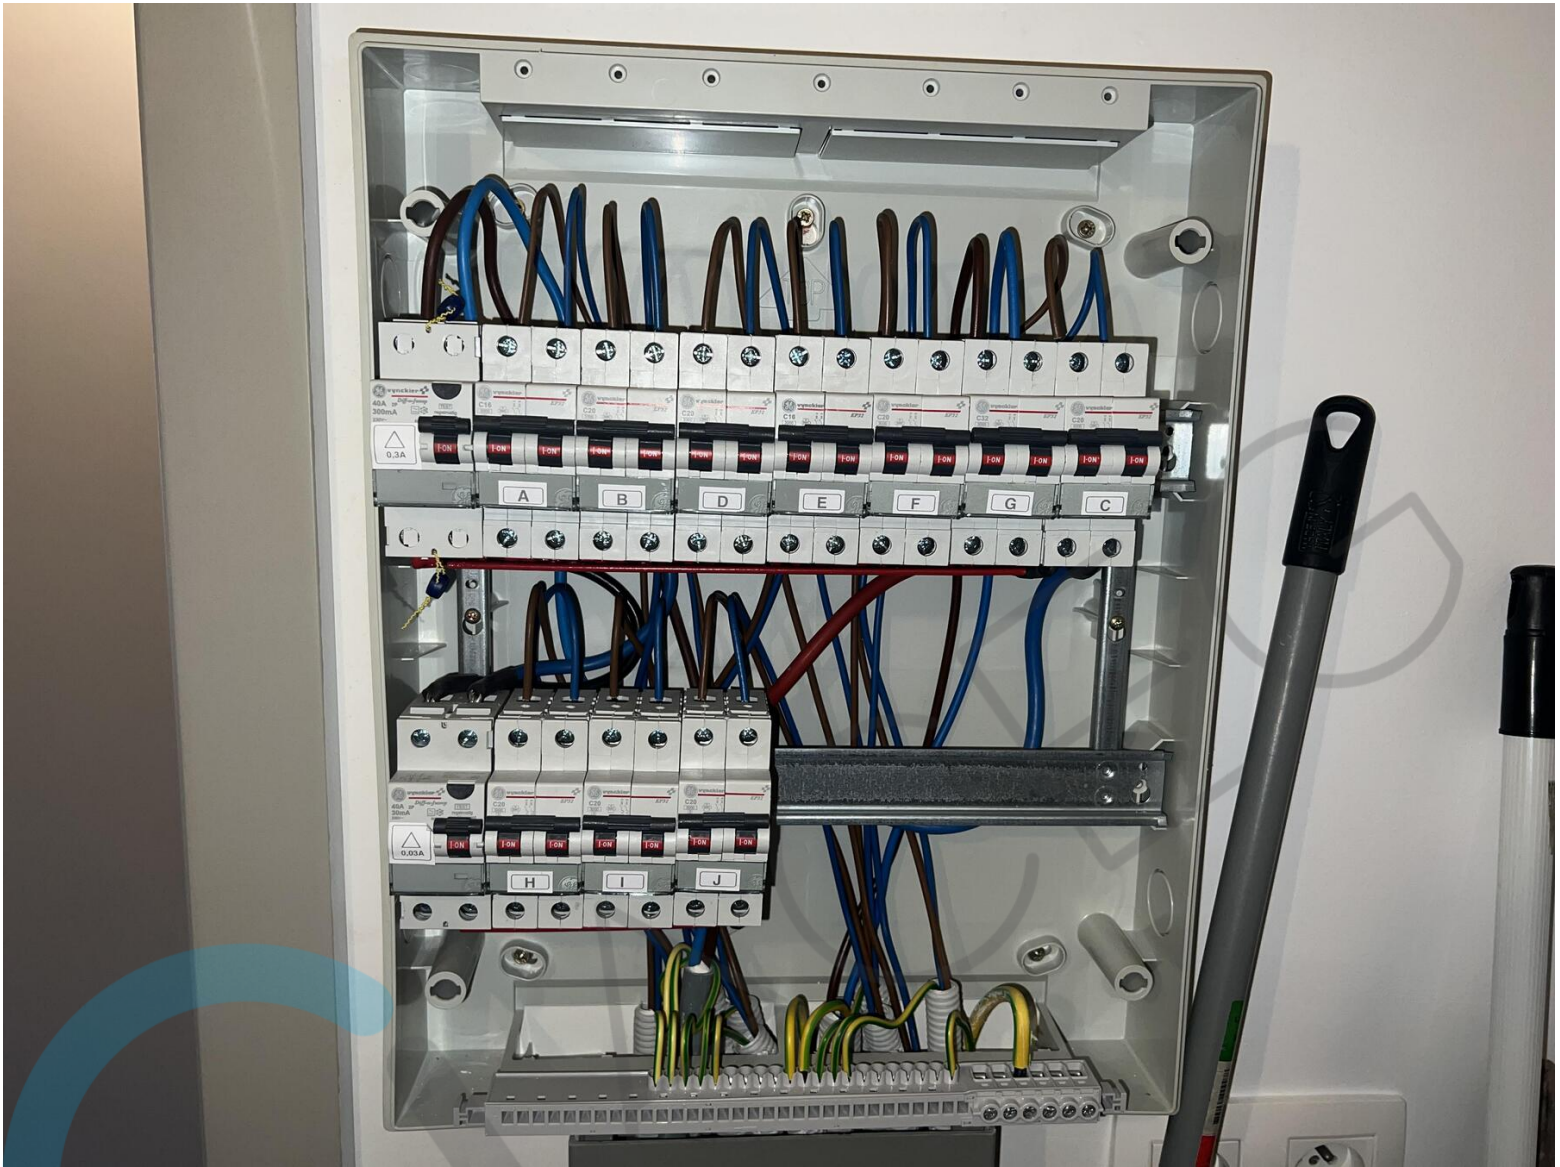

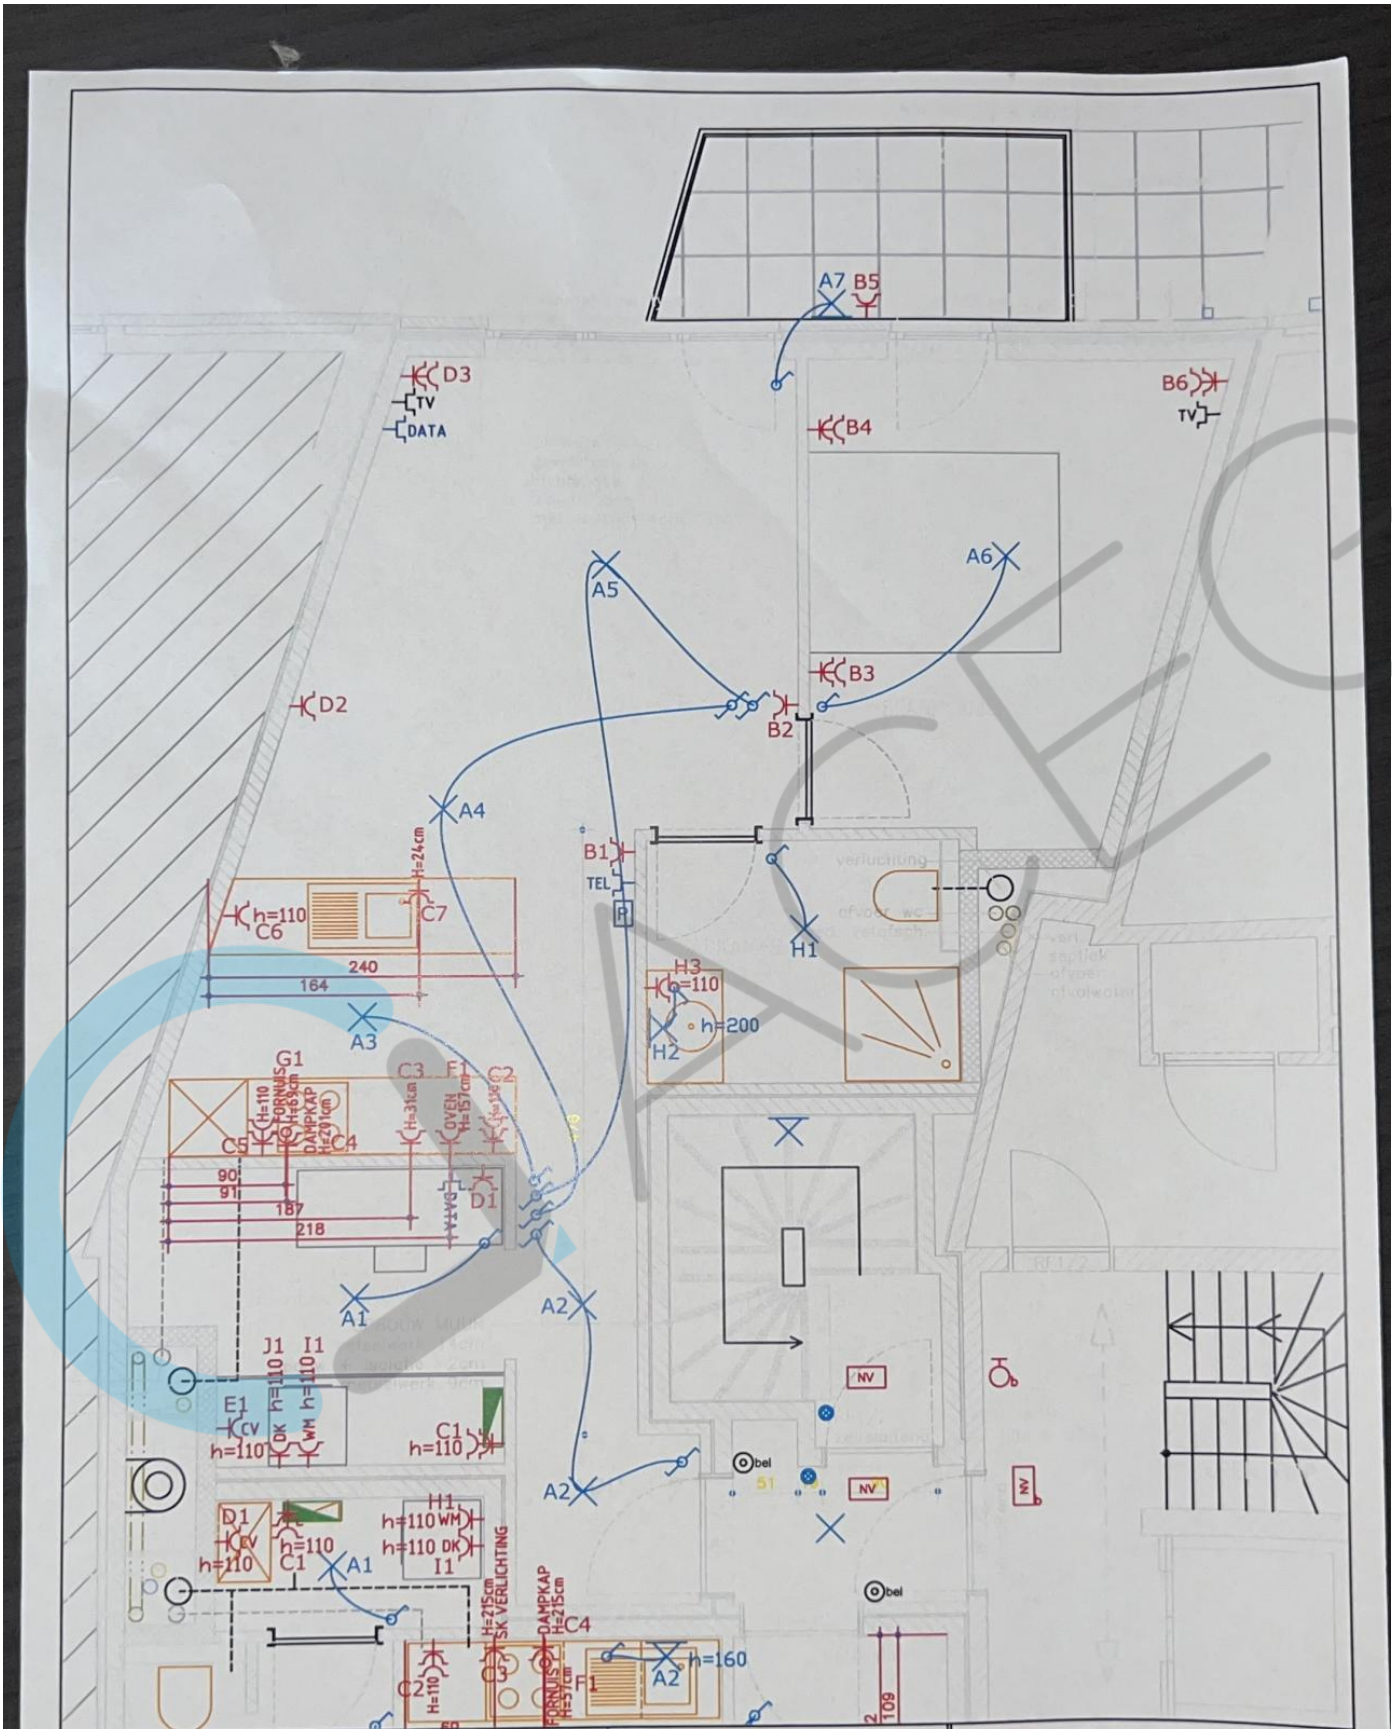

Project : ~~CUBE FACTORY~~ - BREDABAAN 458⁴⁶⁰ 2930 BRASSCHAAT

UITVOERINGSPLAN APPARTEMENT 1.2


Rev.	Datum	Wijzigingen

CONTROLE



Brian Van Ierselhem


Datum	20/05/2011	Nr.	
Plan nr.			
Getekend			
Keppens Gert			

 **Van den Broeck NV**
ALGEMENE ELEKTRICITEIT

Tel. +32 (0)3 669.87.10
Fax. +32 (0)3 669.81.87
B.T.W. 419.511.043

Bredabaan 47-49
B-2990 Wuustwezel



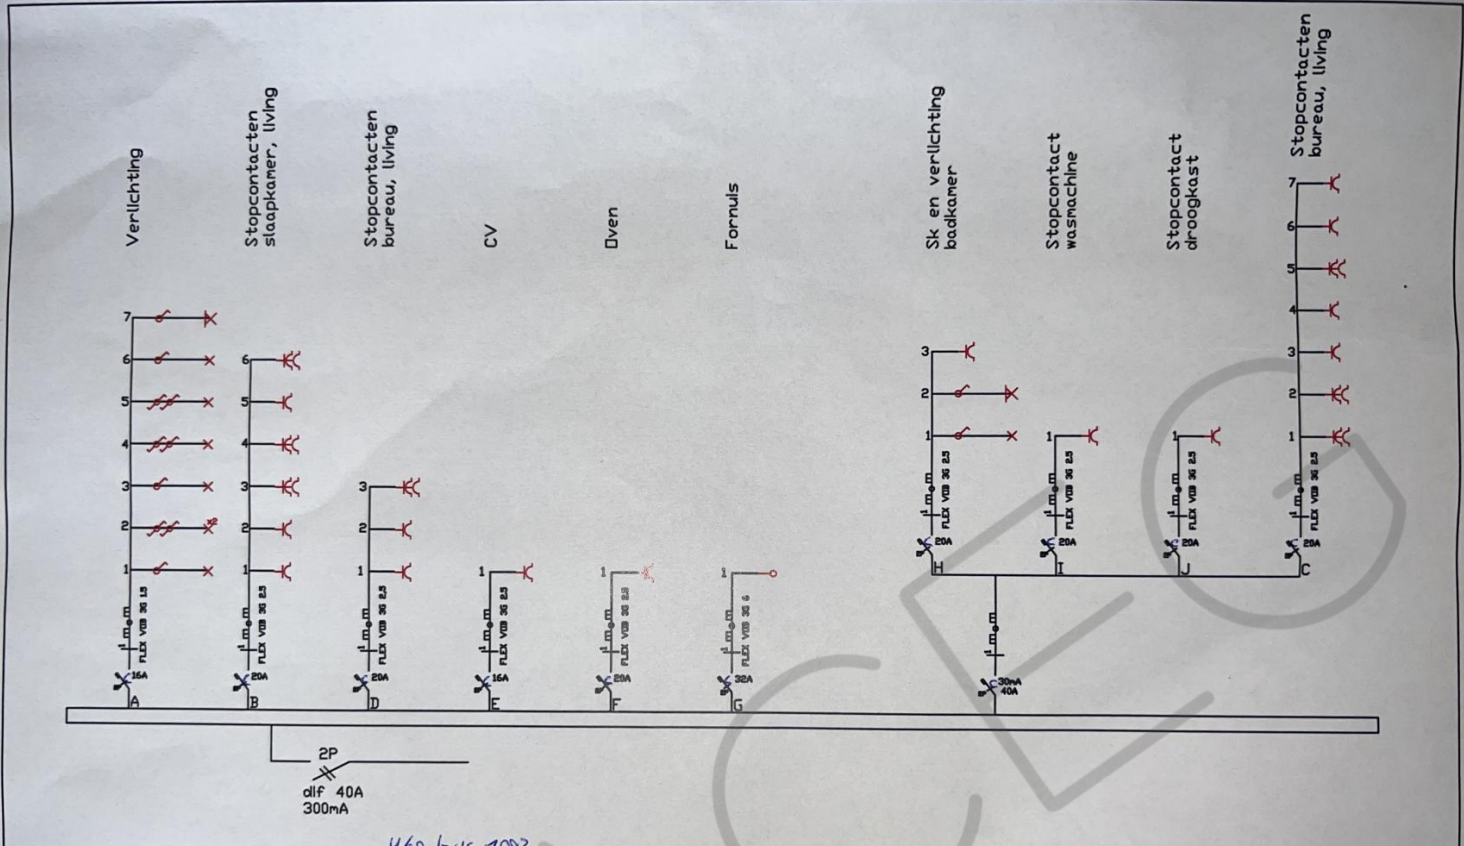

460 bus 1002
 Projekt : ~~GURF FACTORY~~ - BREDABAAN 458 - 2930 BRASSCHAAT

Rev.	Datum	Wijzigingen

CONTROLE
 203
 Brian Van Ingelghem
 27/08/2024

Datum
 20/05/2011
 Plan nr.
 Getekend
 Keuppens Gert

BORDENSHEMA APPARTEMENT 1.2

Van den Broeck NV
 ALGEMENE ELEKTRICITEIT

Tel. +32 (0)3 669.87.10
 Fax. +32 (0)3 669.81.87
 Bredabaan 47-48
 B-2990 Wuustwezel
 B.T.W. 419.511.043



