

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CO NFO RM

Datum keuring: 08/04/2024

Inspecteur: Kurt De Smedt

Mentor:

Installateur: i

ID-label: Idegem EK1

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 18460170

Datum verslag: 08/04/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Hu is n u mme r
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Ninoofsestraat
62
9506
Idegem
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Hu is n u mme r
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Ninoofsestraat 62
9506
Idegem
België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E -ma il


Type: woning

EAN: 54

Teller Nr.: 20179984

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

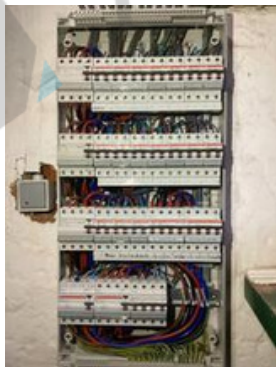

Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Is de installatie aangevat voor
01/06/2023?

Nee

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 20

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 1,085 MΩ

RE: 13,10 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ(mA)	In (A)	In - andere (A)	I2t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	20	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Cur v e	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm2)
1	C	40		4	10
2	C	25		4	4
11	C	16		2	2,5
6	C	20		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen)	OK	OK	in afwachting	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen				schema in bijlage door Aceg	vzw NA		
Equipotentiale verbindingen				Doorsnede geleiders	OK		
Contingenties	OK			Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen.
- nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang.
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 8/4/2049
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema('s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Kurt De Smedt

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte sreeks of onrecht sreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 8/4/2049	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



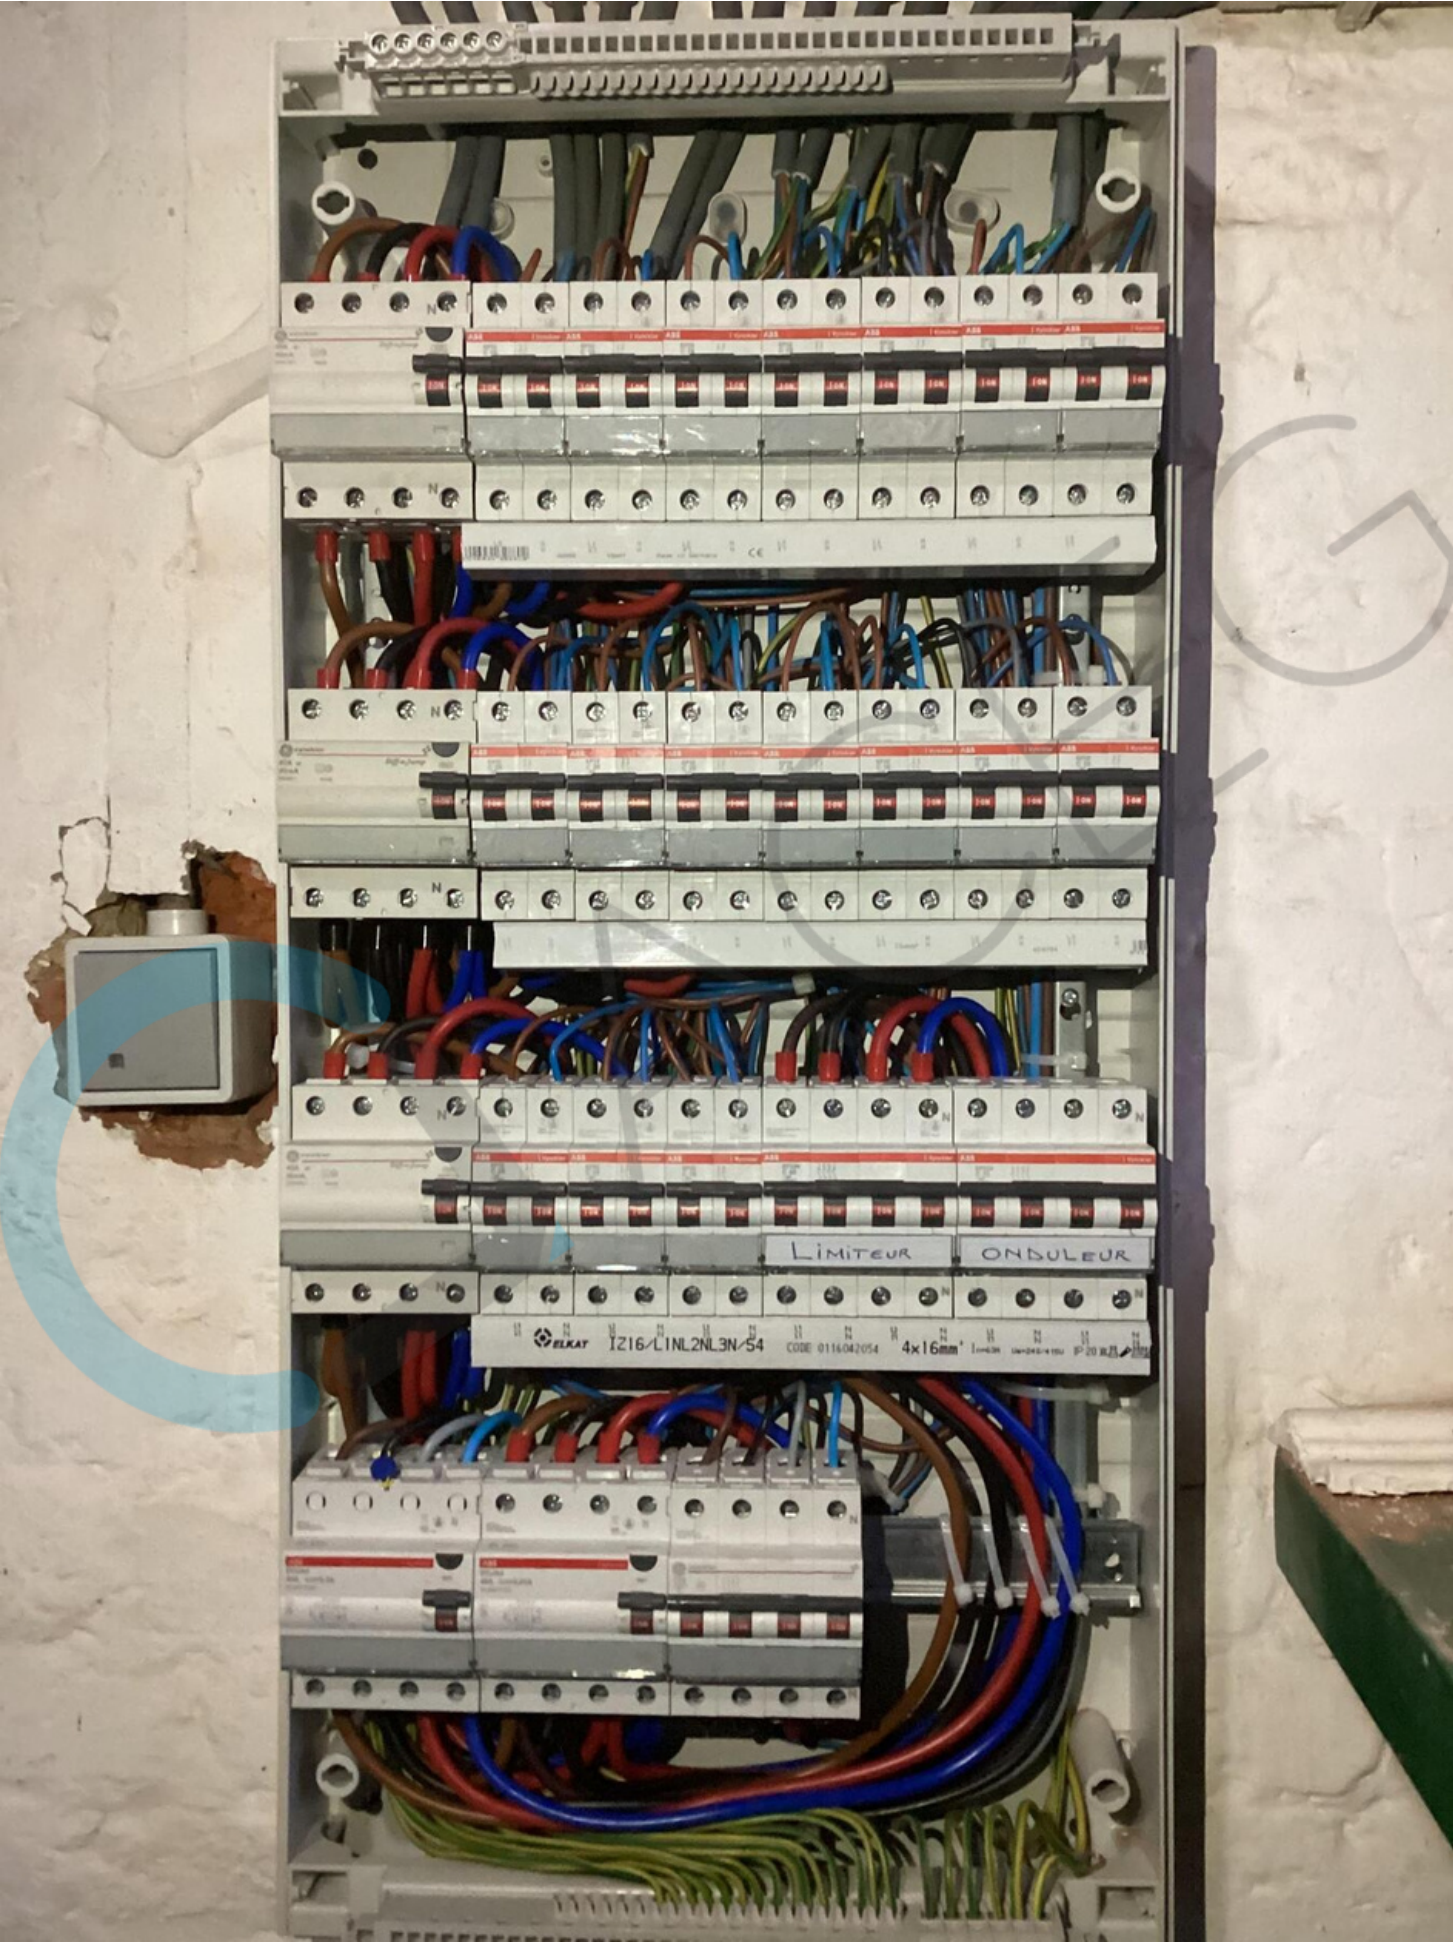



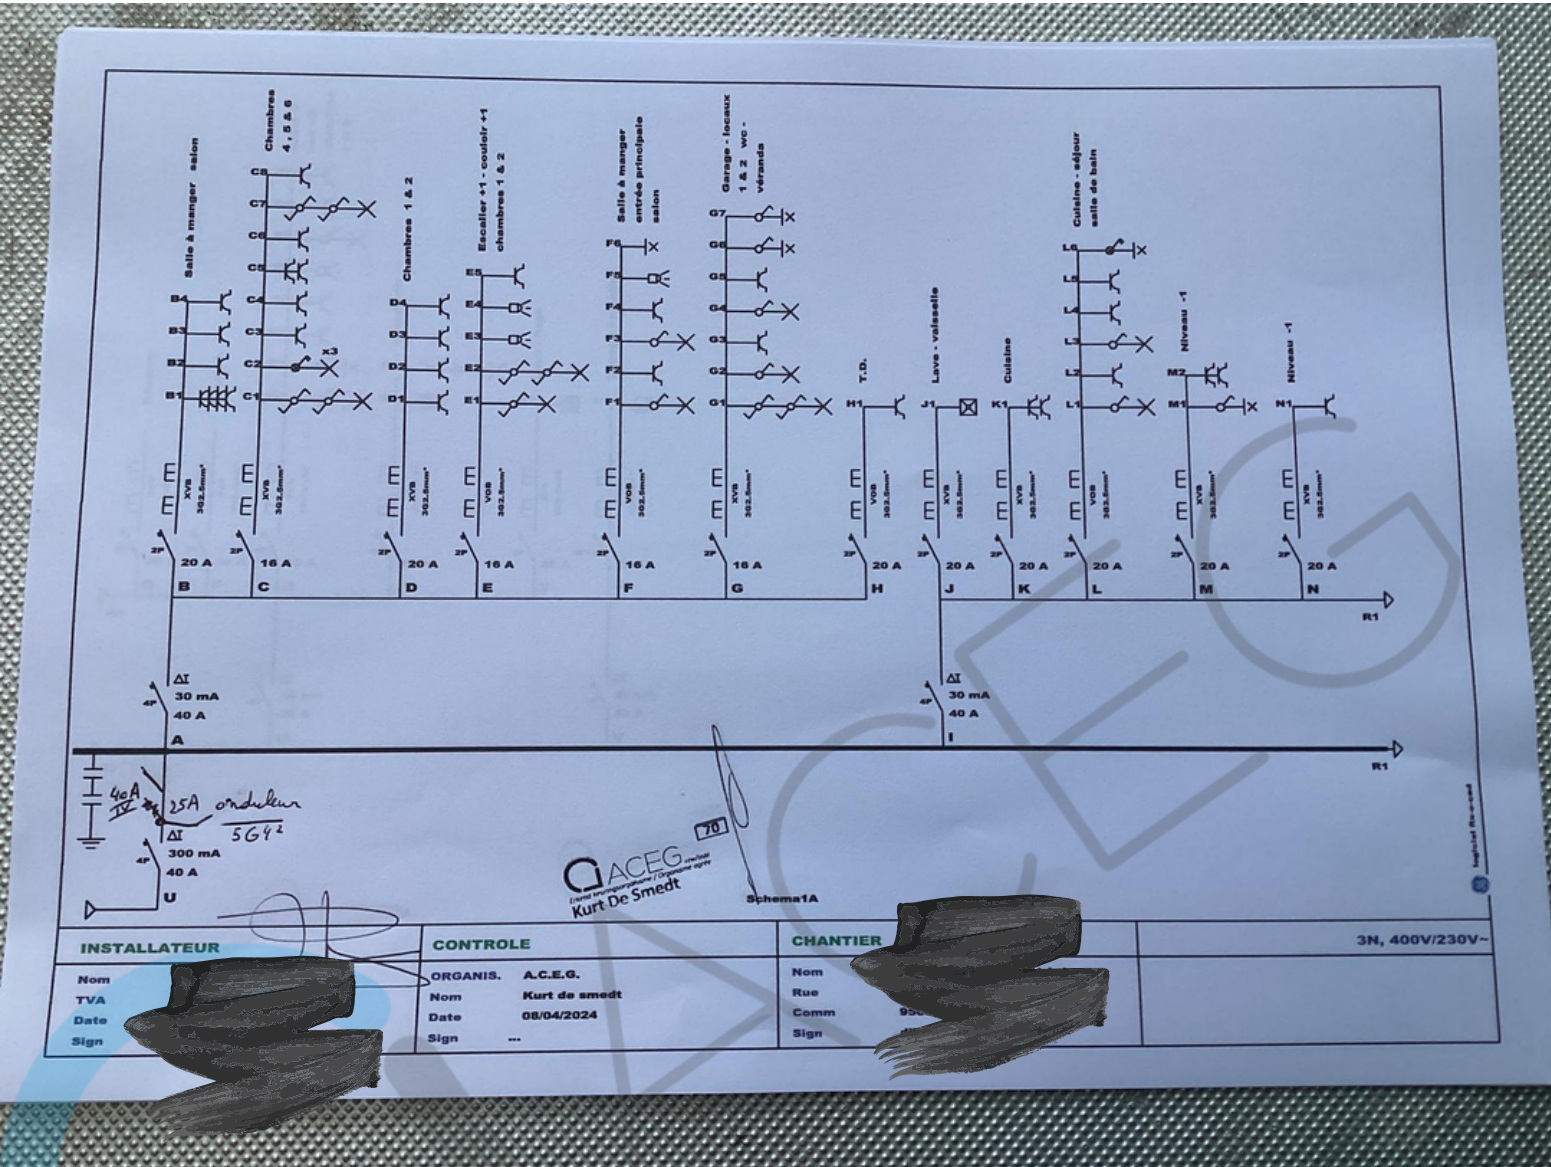

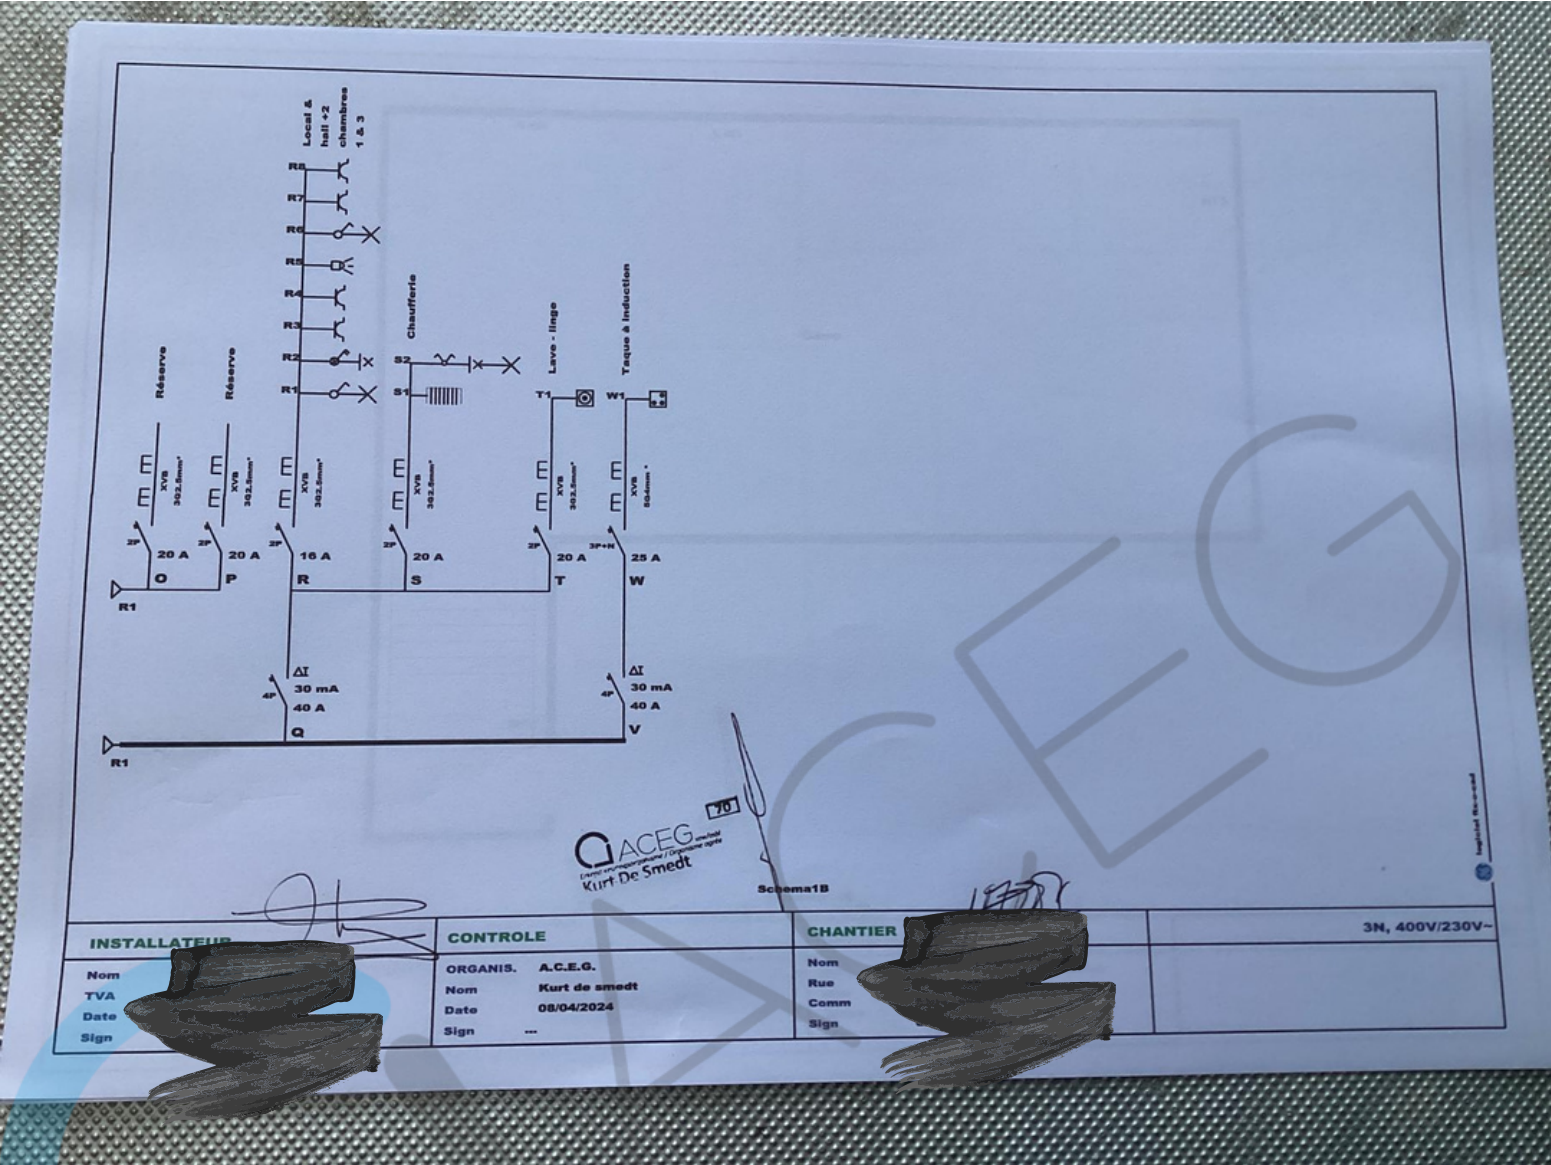

Folie 5

A M2

J M1

N1 >

Cave

M1 <

70

Niveau -1

ACEG

L'expert en sécurité électrique / l'expert en électricité

Kurt De Smedt

INSTALLATEUR	CONTROLE	CHANTIER	3N, 400V/230V~
Nom	ORGANIS. A.C.E.G.	Nom	
TVA	Nom Kurt de smedt	Rue	
Date	Date 08/04/2024	Comm	
Sign	Sign	Sign	

