



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0288-190227-01

Datum van het onderzoek: 27/02/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE :

KONINGSLAAN 24
2340 BEERSE

Visualisatie van de installatie



EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

ELETRON
ASTERSTRAAT 31
2340 BEERSE

BTW of IK : 0821944742

EAN :

Teller nr.

56135294

Index :

49439

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :

Type der Lokalen :

wooneenheid

Begin werken fundering: Voor 01/10/81

Elektrische installatie :

Voor & Na 01/10/81

Aansluiting spanning : 3x400V + N

AREI art. :

86

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²

Bescherming van de aansluiting :

32 A

Type van de aardelektrode: Pennen

Alg. schakelaar: type :

4p 40A/300mA

Aantal borden : 1

Aantal eindstroombanen :

17

Uitwendige invloedsfactoren :

Schema :

TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 276bis,

VMA - 45

MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Controlebezoek

METINGEN:

RA: 9,2 Ohm RI tot 2 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

Geen

BESLUIT

De installatie is conform.

De ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 27 02 2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0288 PATRICK VAN GORP

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271):

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
 - e) de controle van de foutlus en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstromen en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.


STAP 3


Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 27 02 2044.


STAP 4


BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

Bouwheer: Stappaerts
Adres: Koningslaan 24
2340 Beerse

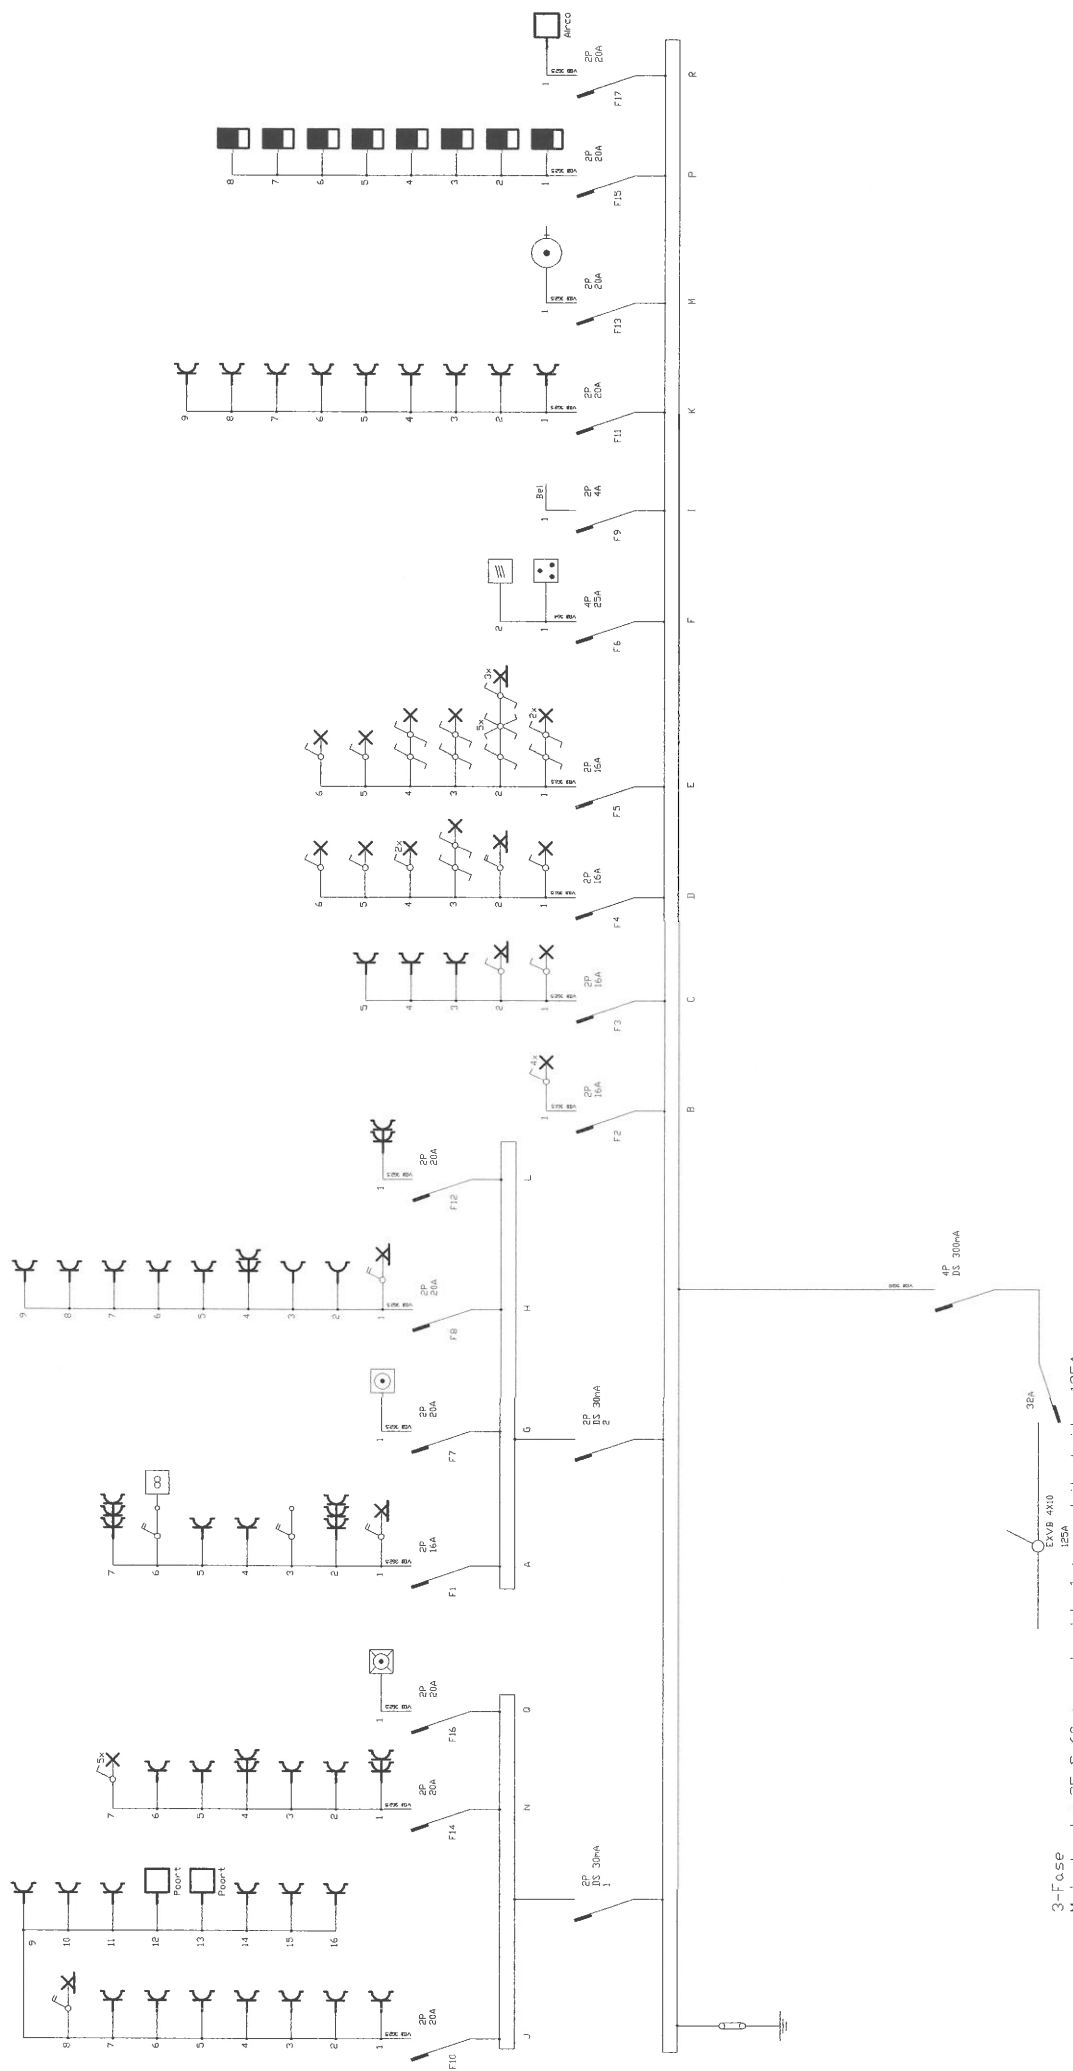

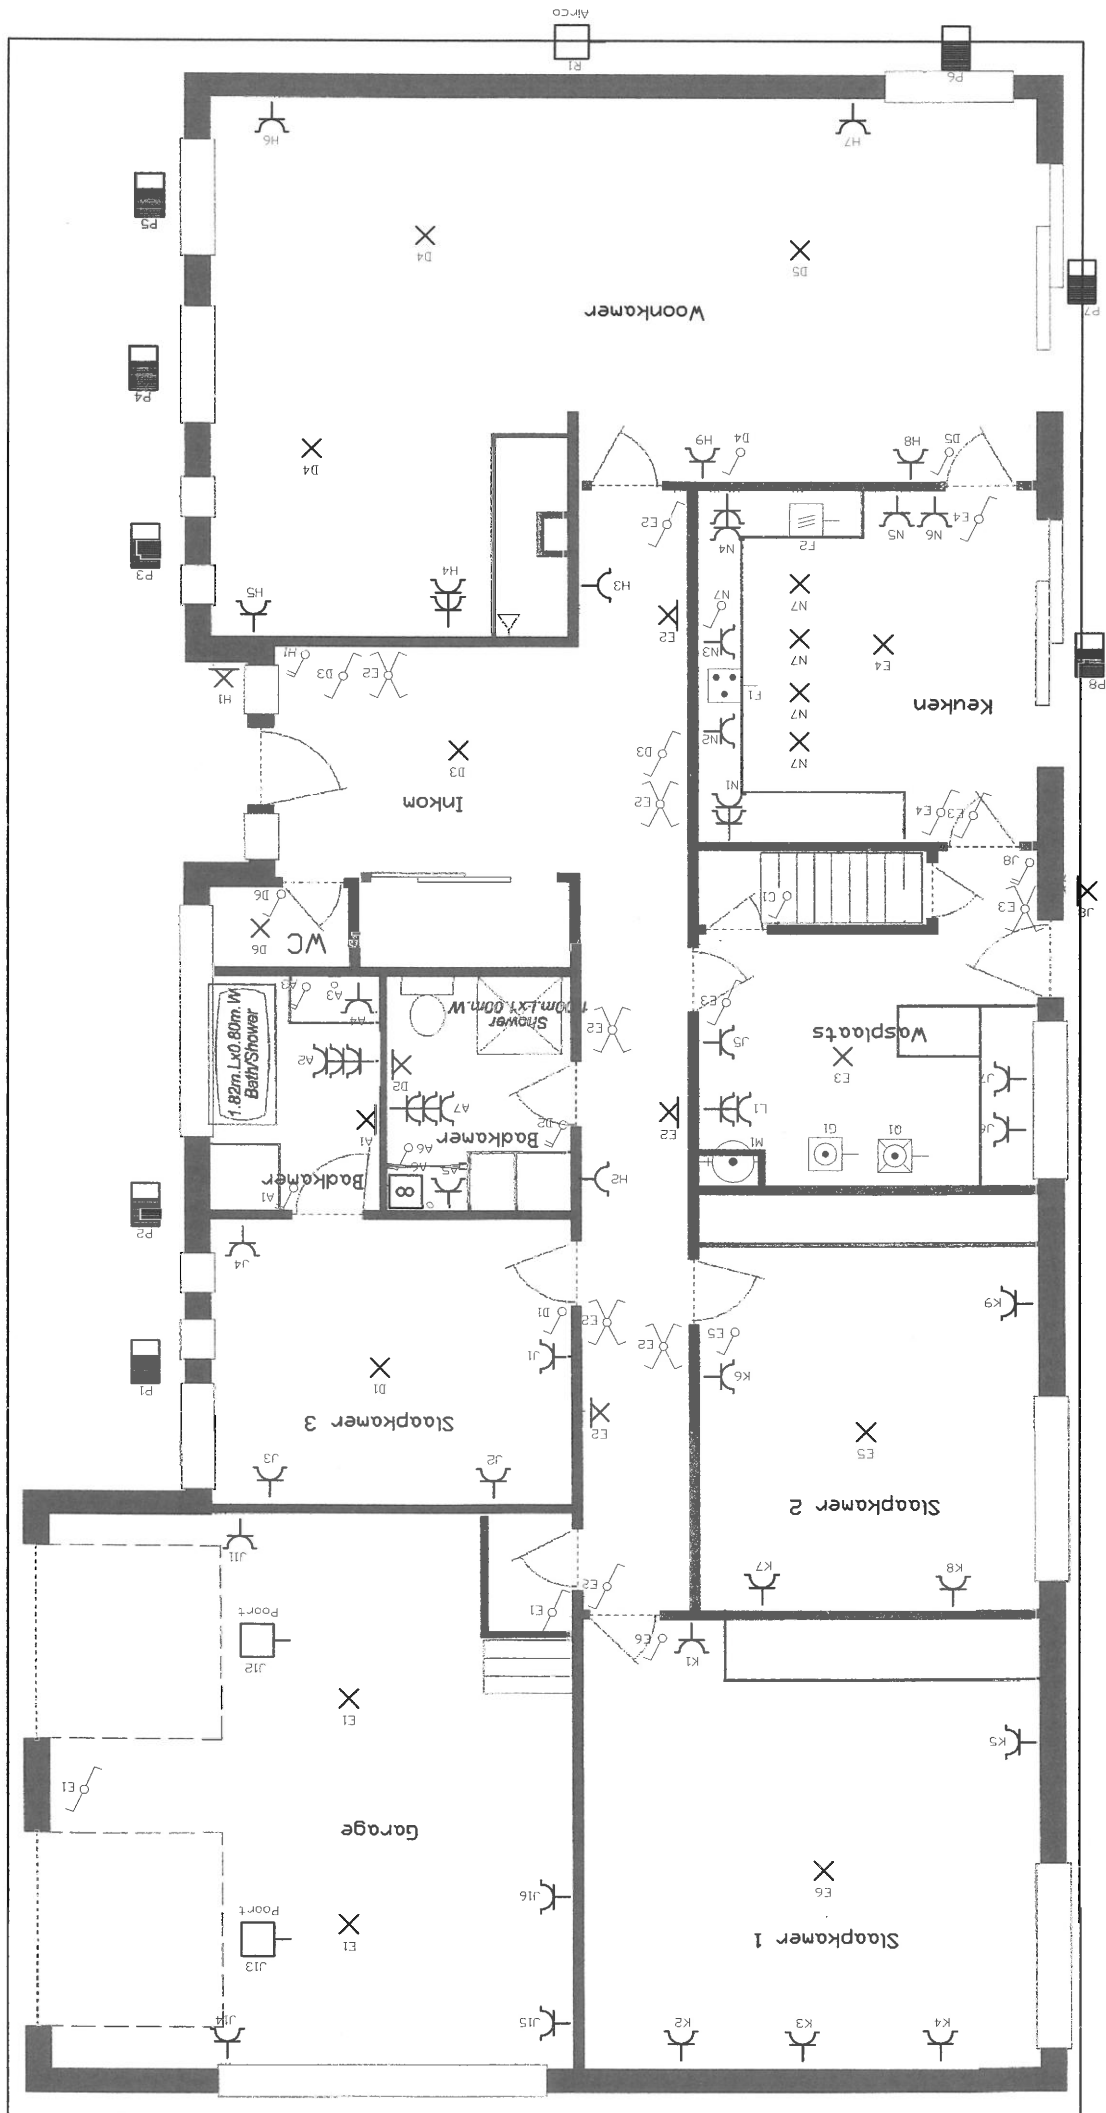

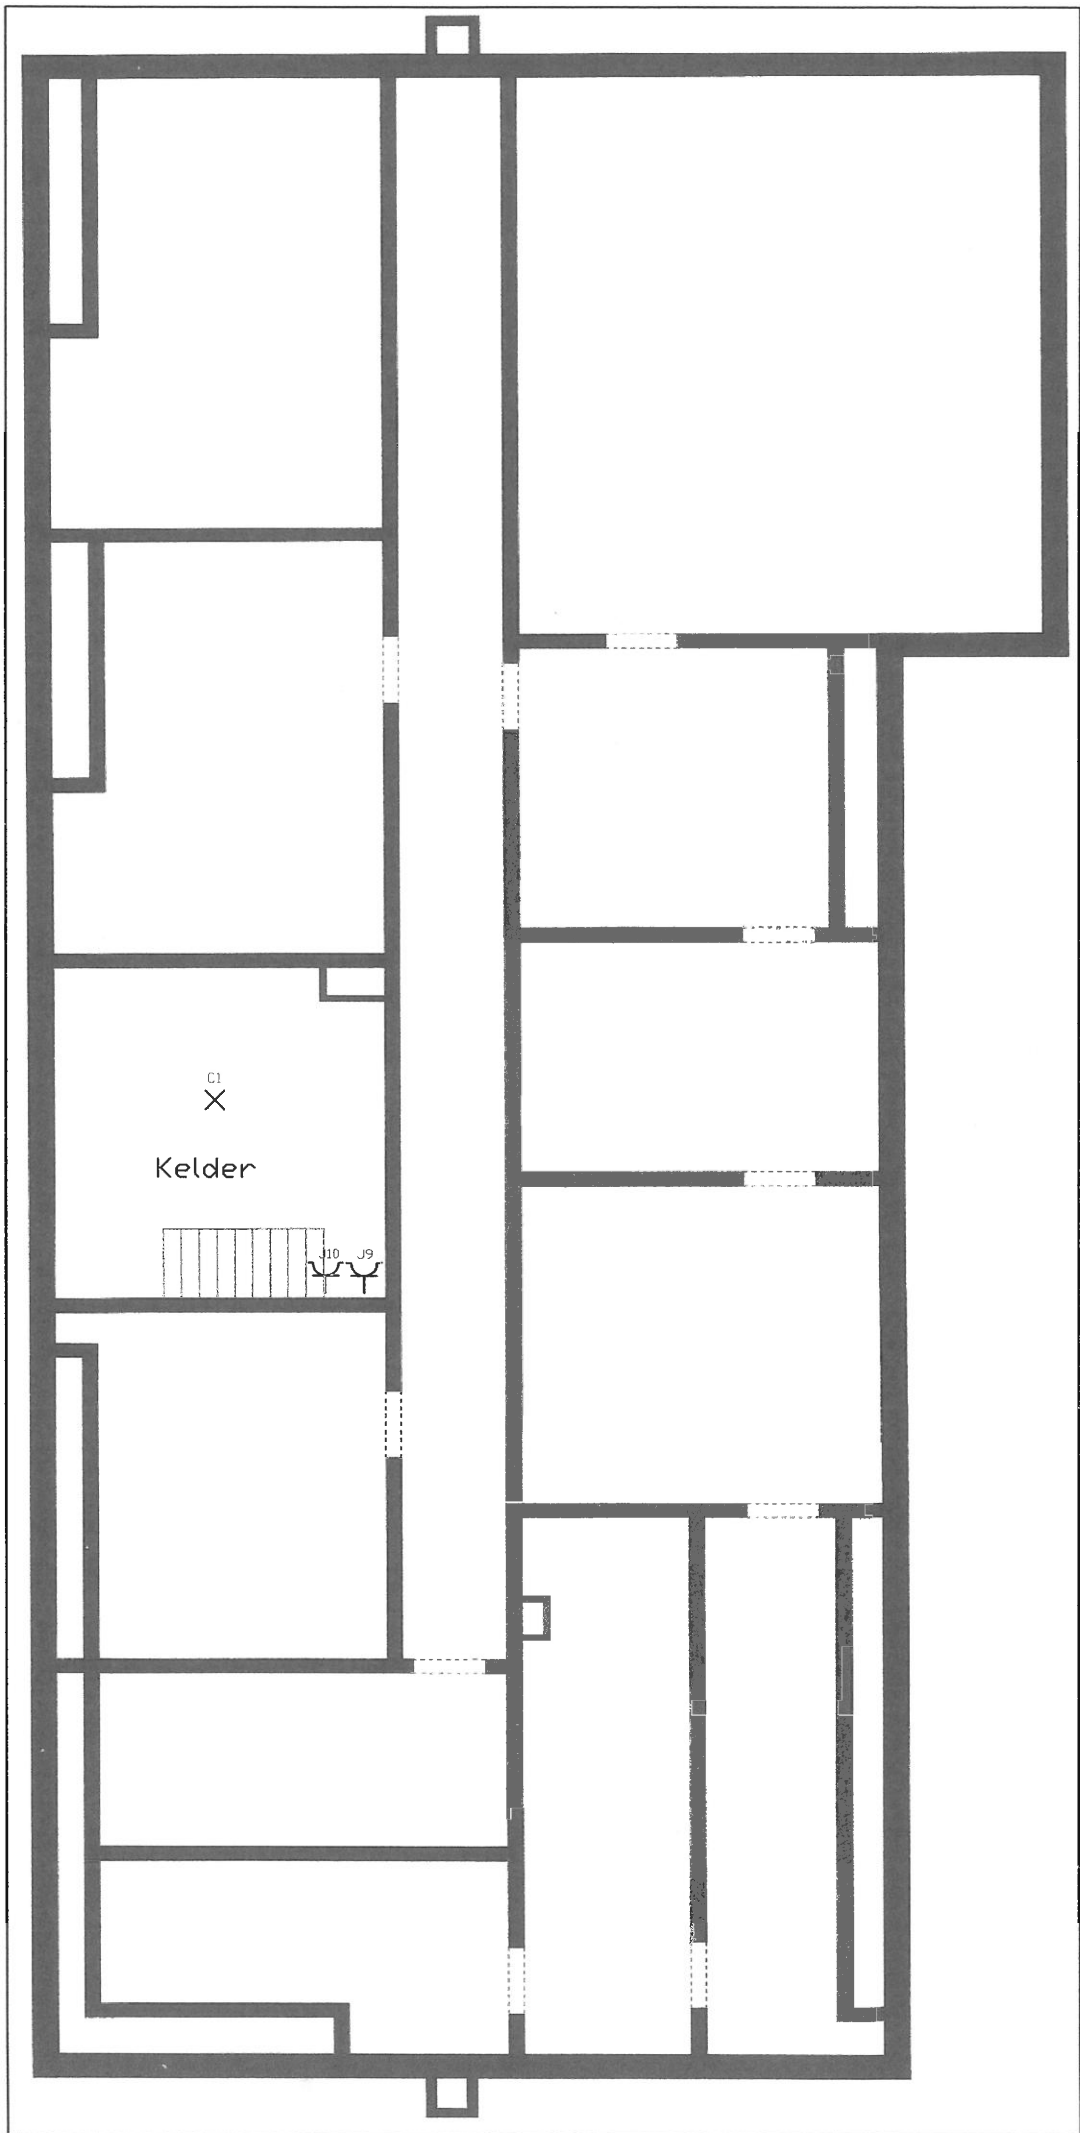

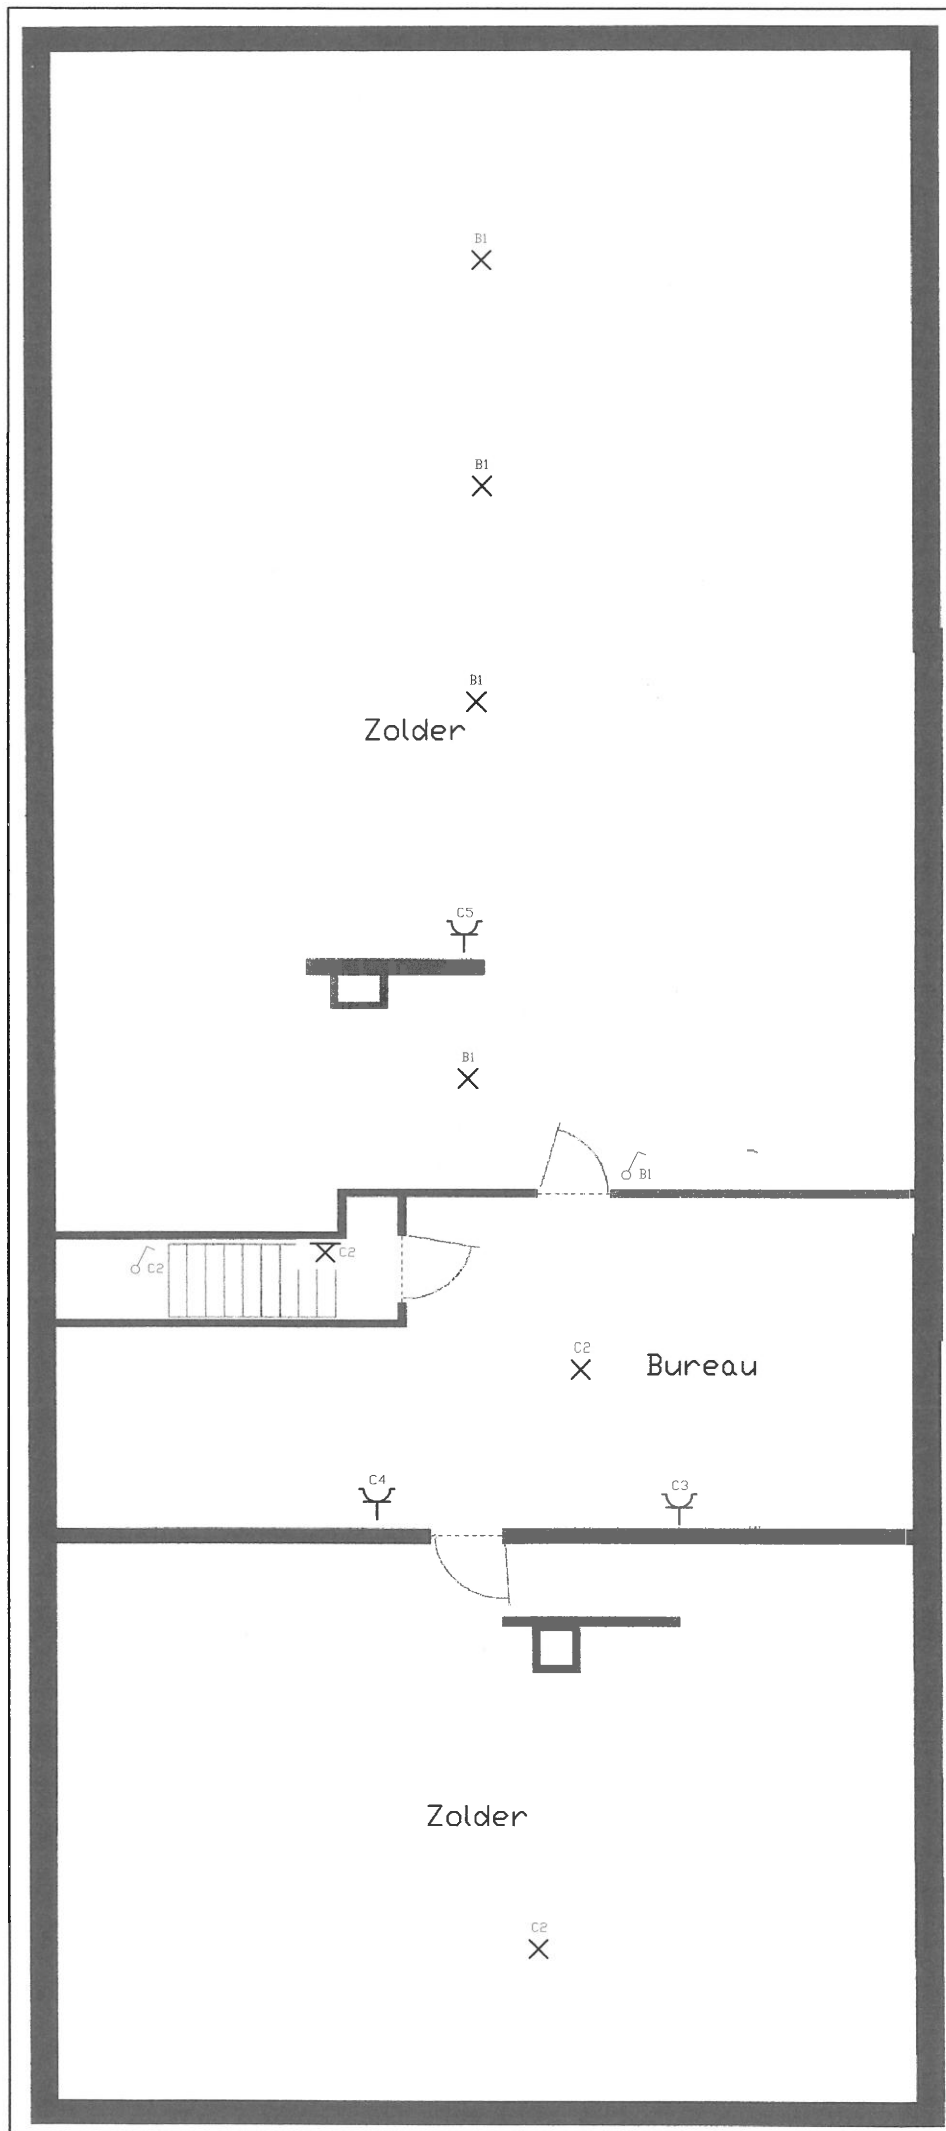

KAST 1		
300mA	30mA (1)	J Stopcontacten Slaapkamer 3, Wasplaats, Garage, Kelder + Buitenlicht achter
		N Stopcontacten Keuken
		Q Afwasmachine
	30mA (2)	A Verlichting + stopcontacten badkamer
		G Wasmachine
		H Buitenlicht voordeur + stopcontacten Hal, Woonkamer
		L Stopcontacten Berging (droogkast)
		B Verlichting zolder
		C Verlichting zolder, Bureau, kelder
		D Verlichting Badkamer, Inkom, Woonkamer, Slaapkamer 3
		E Verlichting Garage, Hal, Slaapkamer 1, Slaapkamer 2, Wasplaats, Keuken
		F Kookplaat + Microgolf
		I Bel
		K Stopcontacten Slaapkamer 1 + 2
		M CV
		P Rolluiken
		R Airco

Bouwheer: Stappaerts
Koningslaan 24
2340 Beerse

