

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 09/11/2021

Inspecteur: Fabio Van Londersele

Mentor: -

Installateur: Depauw Kevin

ID-label: Eeckhoutstraat

B.T.W. nr.: BE 0708 993 685

Klantreferentie: -

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19120255

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 640881

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Eeckhoutstraat
Huisnummer	17
Busnummer	
Postcode	9310
Gemeente	Aalst
Land	België

Eigenaar

Naam	Bull Renov
Straatnaam	Frédéric van der nootstraat
Huisnummer	6
Busnummer	A
Postcode	9300
Gemeente	Aalst
Land	België

Installateur


Naam	Depauw Kevin
BTW nr.	BE 0708 993 685
Telefoonnummer	0473 39 67 60
E-mail	depauw.kevin@gmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541

Teller Nr.: -

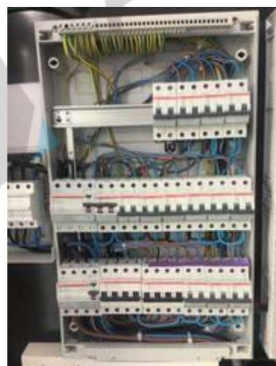

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1


Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.

Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 16

Meter / bord verbinding: 10 mm²
Ri algemeen: 76.7 MΩ

Max beveiliging: 63 A


OK



Aardelektrode: Aardingslus

RE: 3,10 Ω

OK

**DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING**

I_{Δ} (mA)	I_n (A)	I_n - andere (A)	I_{zt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	16	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
2	C	20		4	4
12	C	20		2	2,5
2	C	16		2	2,5

Visueel nazicht (algemeen) OK

Aansluitingen OK

Equipotentiale verbindingen in afwachting

Continuïteit OK

Directe aanraking OK

schema in bijlage door Aceg vzw NA

Doorsnede geleiders OK

Verlichting / toestellen NVT

Indirecte aanraking OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

O9 Badkamer is nog niet volledig afgewerkt. Bad en/of douche dient nog geplaatst te worden.

BESLUIT

☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 9/11/2046

☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.

☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Fabio Van Londersele

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be

02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 9/11/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

