

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller : *1111*
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° *207/21-8-16/7*

EAN
code

HC

Aard onderzoek : Boek 1 KB 8/9/2019	Huishoudelijk	H/C 6,4	H/C 6,5	H/C 8,4.1	H/C 8,4.2	H/C 8,4.3	Netsysteem	Voorschr. netbeheerder
Genre de contrôle : Livre 1 AR 8/9/2019	Résidentiel	<i>01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60</i>	Prescription du gest. de réseau de distr.

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle : *ru de Jean Vante usee d'avis*

Eigenaar

Propriétaire : *Pois Cora* Adres : *HC*

Installateur : *van V. L. L. L.* BTW / TVA : *451420456*

Datum van het onderzoek : *16-8-2021* Ik. / C.I. :

Date du contrôle : *16-8-2021* Inspecteur : *Wimbaert*

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison *W* ☐ ppart. *78A-7*

Spanning : <i>24130</i>	Meter / bord verbinding : <i>1664-10</i>	Max. beveiliging : <i>63</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode :	Isolatie :	Aantal verdeelborden :
Electrode de terre : <i>3</i> Ohm	Isolément : <i>10</i> Mohm	Nombre de tableaux : <i>1</i>

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre de circuits terminaux : 18	Test ΔIn		1. ΔIn					
In [A]	Δ In [mA]	type		OK	NOK	OK	NOK				
63	500	A	Pays	☐	☐	☐	☐				
63	30	A		☐	☐	☒	☐				
				☐	☐	☒	☐				
				☐	☐	☐	☐				
				☐	☐	☐	☐				

Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK	NOK directe aanraking : ☒ OK	Indirecte aanraking : ☒ OK
Contrôle visuel : général : ☒ OK	contact direct : ☒ OK	Contact indirect : ☒ OK

Aansluitingen : ☒ OK	Potentiaalvereffeningen : ☒ OK
Raccordements : ☒ OK	Liaisons equipotentielles : ☒ OK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :

VISUM :
Datum/date :

note : recepteurs + schakelaars aan plaats

Afwijkingen toegepast van / Application des dérogations du ☐ 8.2.1 ☐ 8.2.2

Besluit / Conclusion :	Niet conform	Conform	N° vorig rapport
☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre 1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek 1.	☐	☒	<i>1111</i>
☐ Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage. De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de la position ont été visés et sont conformes avec l'installation. Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (6.5.2-Livre1) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (6.5.2. Boek 1) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : <i>16-8-2026</i>	☐	☐	
☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du AR 8/9/2019 Livre1. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 8/9/2019 Boek1.	☐	☐	
☐ Conformément 6.5.7. Livre 1, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le.....	☐	☐	
Overeenkomstig 6.5.7. Boek 1, de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder uitstel uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor.....	☐	☐	
La visite de contrôle prévue par 8.4.2.2 Livre 1 doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door 8.4.2.2 Boek 1 moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakkoord.	☐	☐	

voor de directeur, de inspecteur/pour le directeur, l'inspecteur..... *Wimbaert*

Rapport des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenant dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. avant l'intervention dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.

INBREUKEN

A. AARDING

1. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 30 Ohm.
2. De spreiding van de aardingsweerstand is hoger dan 100 Ohm.
3. De spreiding van de aardingsweerstand is te hoog volgens de gevoeligheid van de differentieelschakelaar.
4. Er is geen aardelektrode/aardingslus aanwezig.
5. De aardeleider bezit een onvoldoende sectie (min 16 mm² Cu).
6. De aardingsonderbreker is niet aanwezig.

B. EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN (E.V.)

1. E.V. niet aanwezig.
2. E.V. niet bevestigd volgens de regels van de kunst.
3. De sectie van de hoofd E.V. is onvoldoende (min 6 mm²).
4. Bijkomende E.V. in badkamer niet geplaatst of onjuist.
5. Bijkomende E.V. bezitten een onvoldoende sectie (beschermd 2,5 mm²).
6. De continuïteit is niet verzekerd.
7. De kleurcode is onjuist.

C. ISOLATIEWEERSTAND

1. Per kring : minder dan 500 kOhm.

D. DIFFERENTIEELSCHAKELAARS (D.S.)

1. Er zijn geen D.S. aanwezig.
2. De nominale stroom van de Algemene D.S. (A.D.S.) bedraagt minder dan 40A.
3. De nominale stroom van D.S. is onvoldoende.
4. De verzegelplaatjes van de A.D.S. zijn niet aanwezig.
5. Er is geen D.S. geplaatst voor de beveiliging van de badkamer, wasmachine.
6. Test 1 in : N.O.K.
7. Test 2.5 : N.G.K.

E. VERDEELBORDJEN EN KRINGEN

1. De kringen zijn niet of onjuist gemerkt.
2. Het bord is niet bereikbaar of niet op een hoogte van +/- 1,5 m geplaatst.
3. Rechtstreekse aanraking is mogelijk.
4. Er zijn geen kalibreerelementen geplaatst of deze zijn niet in functie van draadsectie.
5. Er zijn overbrugde veiligheden aanwezig.
6. Er zijn geen 2 kringen minimum aanwezig voor de verlichting.

F. LEIDINGEN

1. Niet gebruikte leidingen zijn niet verwijderd.
2. Er is geen reglementaire kleurcode gebruikt.
3. De aanwezige blauwe geleider wordt gebruikt als fasegeleider en er is een andere kleur beschikbaar.
4. Kabels zijn niet beschermd bij muurdoorvoering.
5. Kabels en PVC buis zijn niet mechanisch beschermd over een afstand van 10 cm boven het vloerniveau.
6. De gebruikte XVB en XFVB kabels verzonken in de muur volgen niet de voorgeschreven trajecten.
7. Installatiedraad niet beschermd of niet reglementair.

G. SCHAKELAARS EN STOPCONTACTEN

1. De stopcontacten zijn niet op voldoende hoogte van het vloerniveau geplaatst (van as tot vloer : 25 cm in vochtige lokalen en 15 cm droge lokalen).
2. Een schakelaar(s) schijdt niet de fasegeleider.
3. Het gebruikte materiaal stemt niet overeen met de vereiste beschermingsgraad.
4. Directe aanraking mogelijk.

H. TOESTELLEN

1. De gebruikte toestellen dragen geen gelijkvormigheidslabel van een erkend Europees labo.
2. De toestellen voldoen niet aan de gewenste beschermingsgraad.
3. De isolatieklasse stemt niet overeen met de plaats van het toestel.
4. De verwarmingstoestellen zijn nog niet geplaatst.
5. Directe aanraking mogelijk.

I. VISUEEL NAZICHT

1. Algemene opmerkingen.
2. Directe aanraking mogelijk.
3. Indirecte aanraking mogelijk.

J. ELEKTRISCH DOSSIER

1. Eëndraadschema niet aanwezig.
2. Situatieschema niet aanwezig.

INFRACTIONS

A. PRISE DE TERRE

1. La résistance de la prise de terre dépasse 30 Ohms.
2. La résistance de la prise de terre dépasse 100 Ohms.
3. La résistance de la prise de terre est trop élevée en fonction de la sensibilité de l'interrupteur différentiel.
4. Absence d'une électrode de terre (boule de terre).
5. La section du conducteur de mise à la terre est insuffisante (min 16 mm² Cu).
6. Il n'existe pas de coupe-terre.

B. MAISONS EQUIPOTENTIELLES (L.E.)

1. L.E. non réalisés.
2. L.E. non fixées d'après les règles de l'art.
3. La section de la L.E. principale est insuffisante (min 6 mm²).
4. L.E. supplément. dans salle de bains non réalisées ou incorrectes.
5. L.E. suppl. ont une section insuffisante (protégées 2,5 mm²).
6. La continuité n'est pas assurée.
7. Le code des couleurs n'est pas correct.

C. RESISTANCE D'ISOLEMENT

1. Par circuit : inférieur à 500 kOhm.

D. INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS (I.D.)

1. Absence de différentiels.
2. Le courant nominal de l'I.D. général est inférieur à 40A.
3. Le courant nominal de l'I.D. est insuffisant.
4. Les plaquettes de plombage de l'I.D. général manquent.
5. Absence d'un I.D. pour salle de bains, machine à laver.
6. Teste 1 in : P.O.K.
7. Teste 2.5 : P.O.K.

E. TABLEAU(X) DE DISTRIBUTION ET CIRCUITS

1. Les circuits ne sont pas ou incorrectement marqués.
2. Le tableau n'est pas accessible ou n'est pas à une hauteur de +/- 1,5 m.
3. Contact direct est possible.
4. Absence d'éléments de calibrage ou inadaptés en fonction des sections des canalisations.
5. Il y a des faibles pontes.
6. Il n'y a pas au minimum 2 circuits d'éclairage.

F. CANALISATIONS

1. Les canalisations non utilisées ne sont pas éliminées.
2. Il n'y a pas de code de couleurs réglementaire utilisé.
3. Le conducteur bleu présent est utilisé comme conducteur de phase et une autre couleur est disponible.
4. Les conducteurs ne sont pas protégés dans les traversées des murs.
5. Conducteurs et tubes PVC ne sont pas protégés mécaniquement à une distance de 10 cm au-dessus du niveau de sol.
6. Les canalisations XVB et XFVB noyées dans le mur ne suivent pas le parcours privilégié.
7. Conducteur d'installation non protégé ou pas réglementaire.

G. INTERRUPTEURS ET PRISES DE COURANT

1. Les prises de courant ne sont pas placées à une hauteur suffisante vis à vis du niveau de sol (25 cm dans des locaux humides et 15 cm dans des locaux secs).
2. Le conducteur de neutre est coupé au lieu du conducteur de phase.
3. Le matériel utilisé n'est pas conforme au degré de protection exigé.
4. Contact direct possible.

H. APPAREILS


1. Les appareils utilisés ne sont pas pourvus d'un label de conformité d'un labo européen agréé.
2. Les appareils ne répondent pas au degré de protection exigé.
3. La classe d'isolation n'est pas en conformité avec l'emplacement de l'appareil.
4. Les appareils de chauffage électrique ne sont pas encore installés.
5. Contact direct possible.

I. CONTRÔLE VISUEL

1. Remarques générales.
2. Contact direct possible.
3. Contact indirect possible.

J. DOSSIER ELECTRIQUE

1. Le schéma unifilaire n'est pas présent.
2. Le schéma de position n'est pas présent.

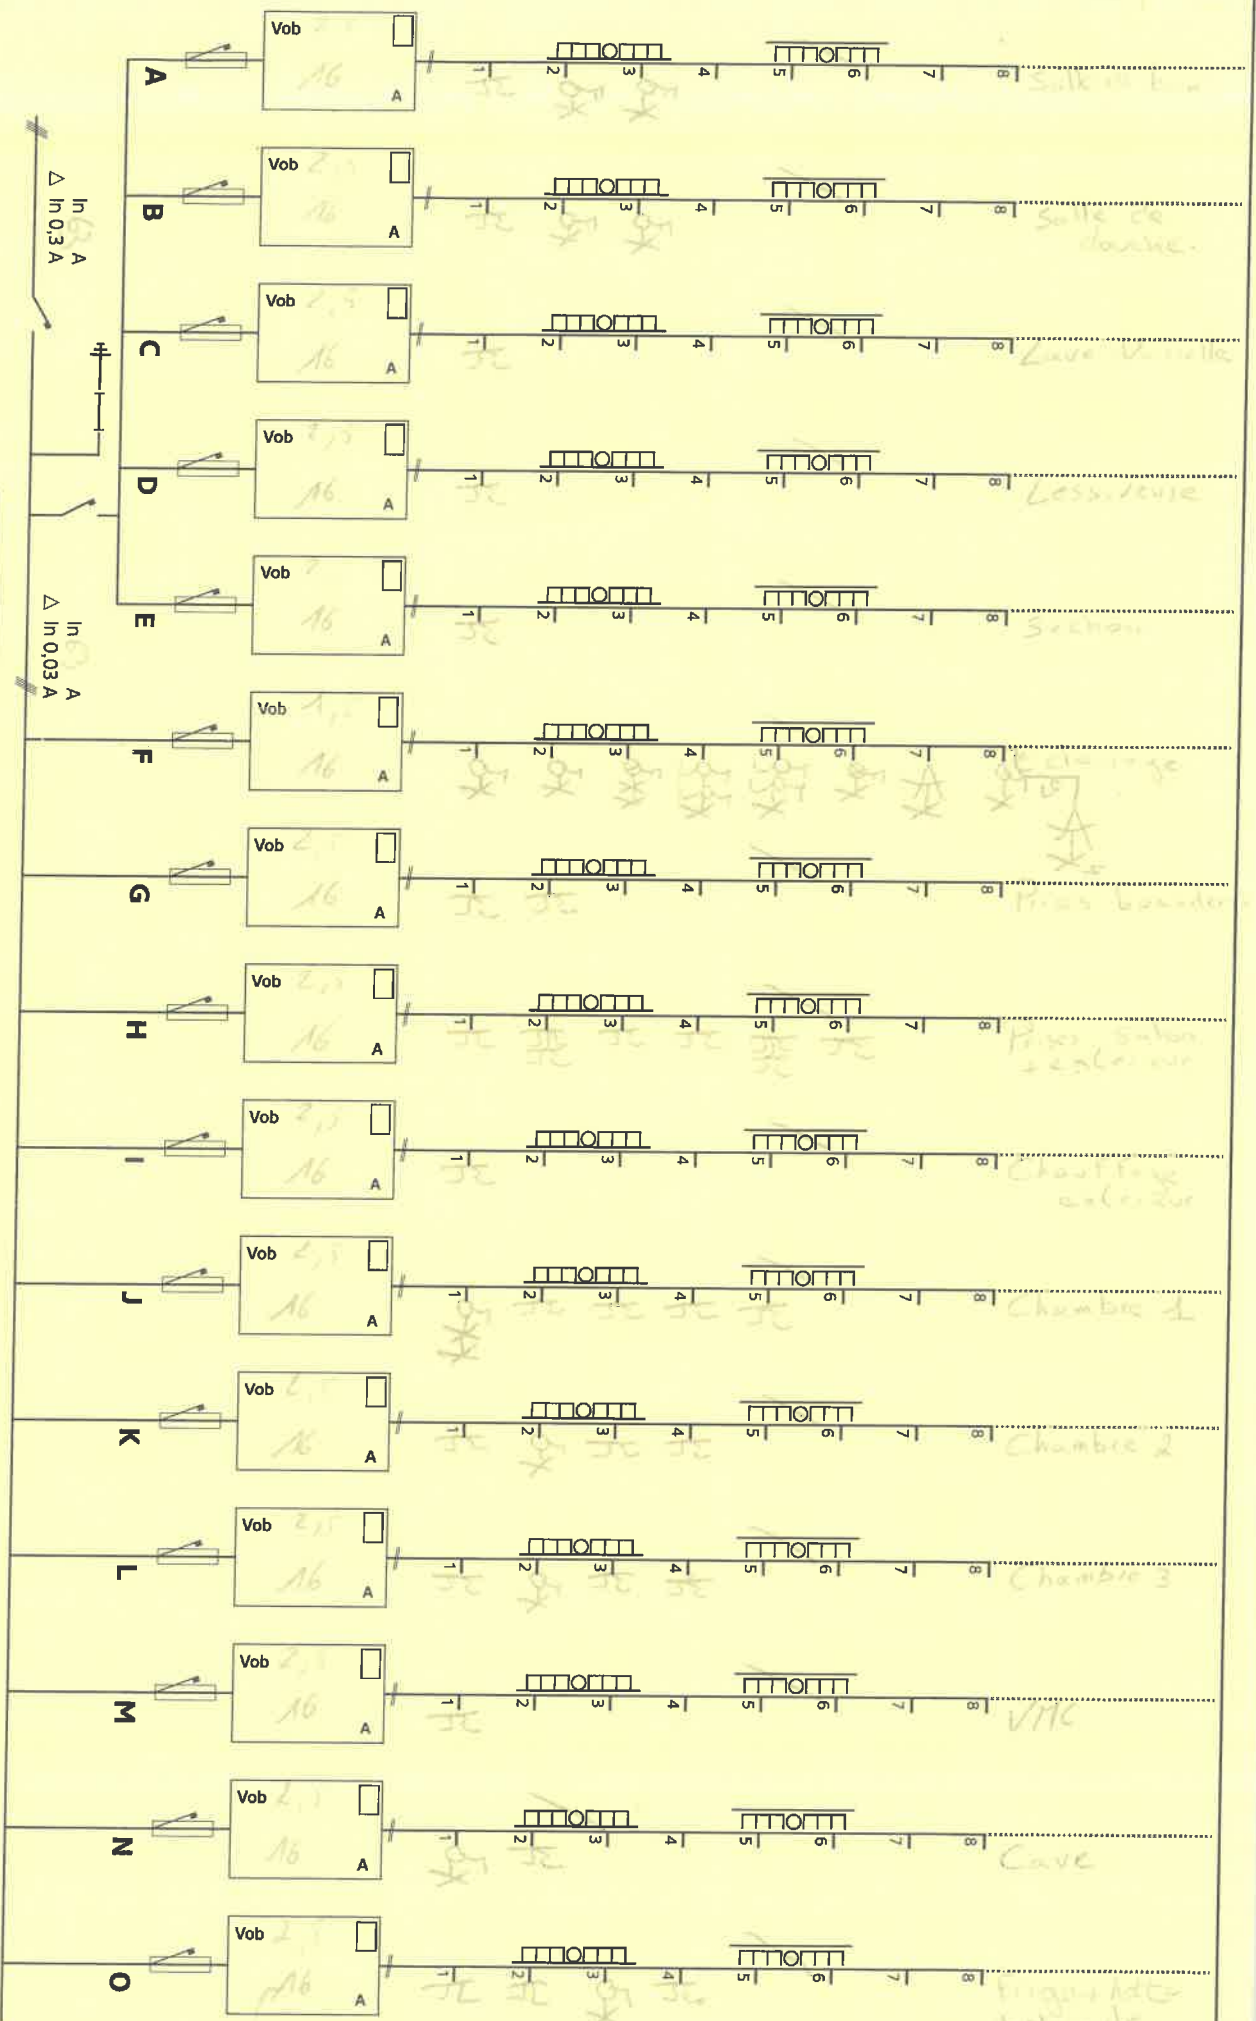

Agence de Contrôle Agrée



ELECTROTEST
LOMBARD Laurent
Inspecteur

Date de contrôle 04/05/09 3D
 Signature Agent

Chantier

Client
 Adresse

Signature Agent

TENSION mono 230 V

TRI 230 V
 TRI 400 V + N

COFFRET BIHORAIRE
 COFFRET ACCU.

Suite voir feuillet n°

Feuillet n°

