

Rapport n° 2005/286/02/22/01.  
N° client société distributrice :  
N° compteur :  
Index I :  
Index II :

| DISTRIBUTEUR | PV vu  |
|--------------|--------|
| Nom          |        |
| Date         | Appt 4 |
| Signature    |        |



Organisme de contrôle a.s.b.l.

## PROCES-VERBAL D'INSPECTION D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE - DE CHANTIER - D'UN RACCORDEMENT PROVISOIRE/DEFINITIF RESIDENTIEL

Type d'inspection : examen de conformité avant mise en service / visite de contrôle  
suivant : RGIE art. 270 / RGIE art. 271 / RGIE art. 276 / 1<sup>er</sup> mod.

Complément au rapport n°

Type d'installation : Nouvelle / Extension / Modification / Provisoire / Existante / Renforcement / Scission du Comptage / Modification de tension d'alimentation

Type de locaux : Habitation + local domestique

Lieu d'inspection : Rue de Ténosse 12 5190 Spy

Propriété de : Vranckx; Rue du Parc 53 5190 Spy

Mandant : Egalee; Rue des Viaducs 115 7020 Nimy

Installateur : idt

TVA : 445.046.499 carte ID : Délivré à : Date :

Inspecteur : Gernon ph. 286 Date d'inspection : 22/02/2005

### DESCRIPTION

Tension de service : 1 x 230 V 3 x 230 V 3N 400V Protection max : Max 40 Commutateur; position :

Protection principale : Disj. Max 40 à 100 Interrupteur / sectionneur : Diff 4P 40A 0,3A 3KA

Liaison comptage - coffret de répartition : type de câble : EXUB nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²

Câble de raccordement au réseau : type de câble : 4 nombre de conducteurs : 4 diamètre : 16 mm²

Réseau aérien / Raccordement souterrain au réseau aérien / Réseau souterrain - Fourreau : présent / absent - Plaque d'isolation : présente / absente

Electrode de terre : Type : boucle / barres / piquets / conducteurs horizontaux Section : 16 mm² Résistance de dispersion : 6 Ω

Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 14 Résistance d'isolation général : 5 MΩ

Interrupteur différentiel : Général : Diff 4P 40A 0,3A 3KA Supplémentaire : Diff 4P 40A 0,03A 3KA

Description : voir les schémas en annexe

### NOTES

La liaison équipotentielle principale et supplémentaire ~~est~~ / ne sont pas encore raccordées.

La salle de bains - le(s) compteur(s) d'eau, - de gaz, - le chauffage central - ~~est~~ / ne sont pas encore placés.

### INFRACTIONS

### CONCLUSION

L'installation est conforme / ~~est pas conforme~~ aux prescriptions du RGIE.

L'interrupteur différentiel général a été plombé par des scellés au sigle d' OCB.

Le(s) schéma(s) unilaire(s) et de position ont été signés pour approbation.

La visite de contrôle prévue par l'article 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : 22/02/30, ainsi

qu'avant la mise en service d'une modification / extension importante réalisée avant cette date.


L'installation ~~se peut pas~~ être mise en service / ~~ne peut rester en service~~ qu'à condition de remédier sans délais aux

infractions constatées et que toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des


biens.

Pour le directeur,  
l'inspecteur

Gernon ph. 286

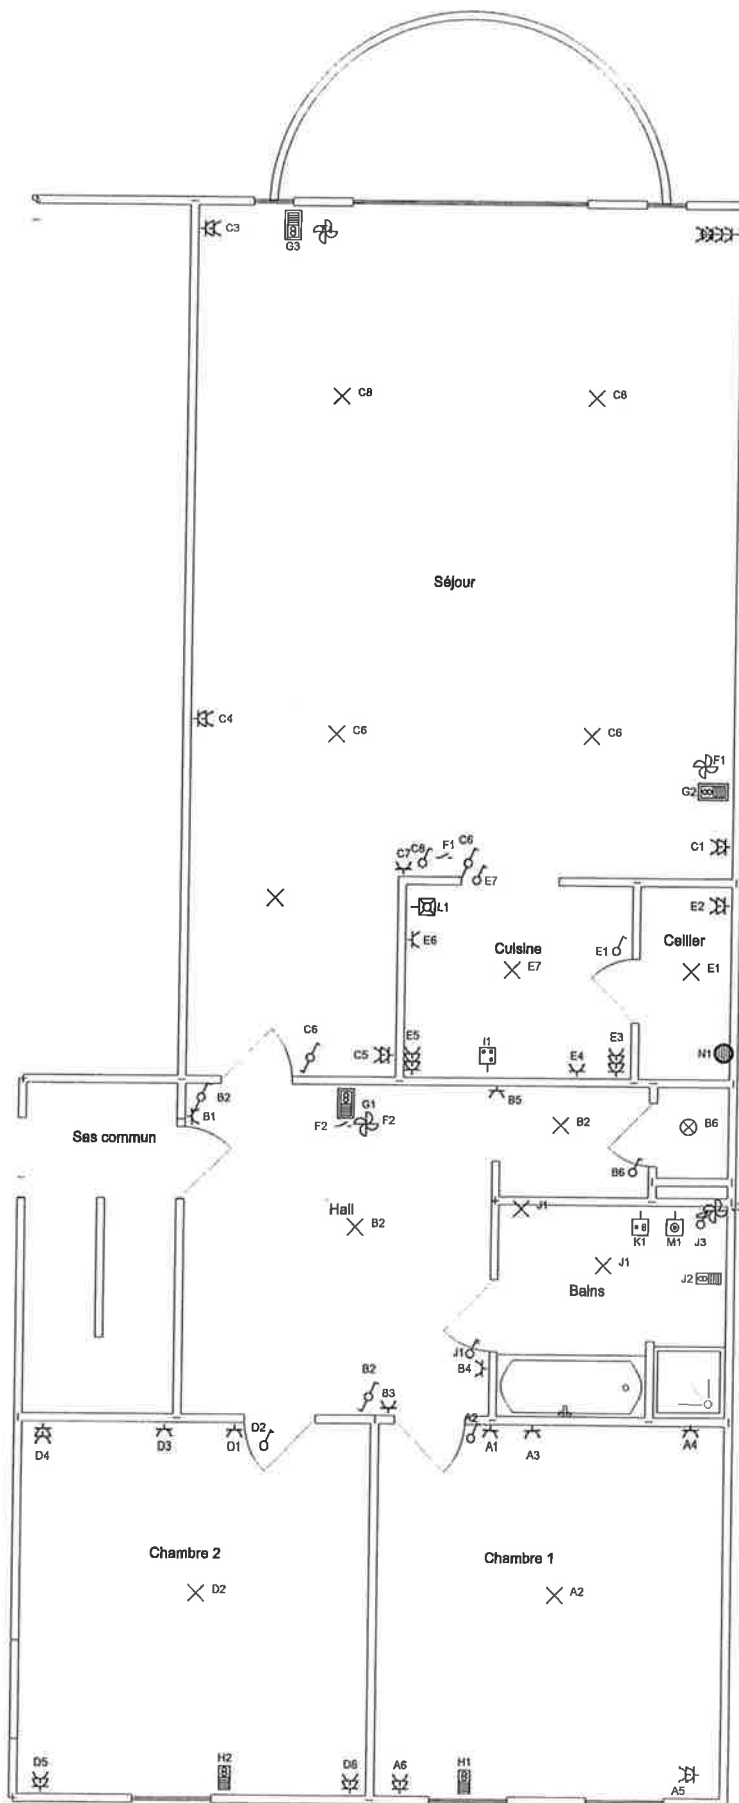

VRANCKX 1ER DROIT  
Rue de Tempoux 12  
5190 SPY

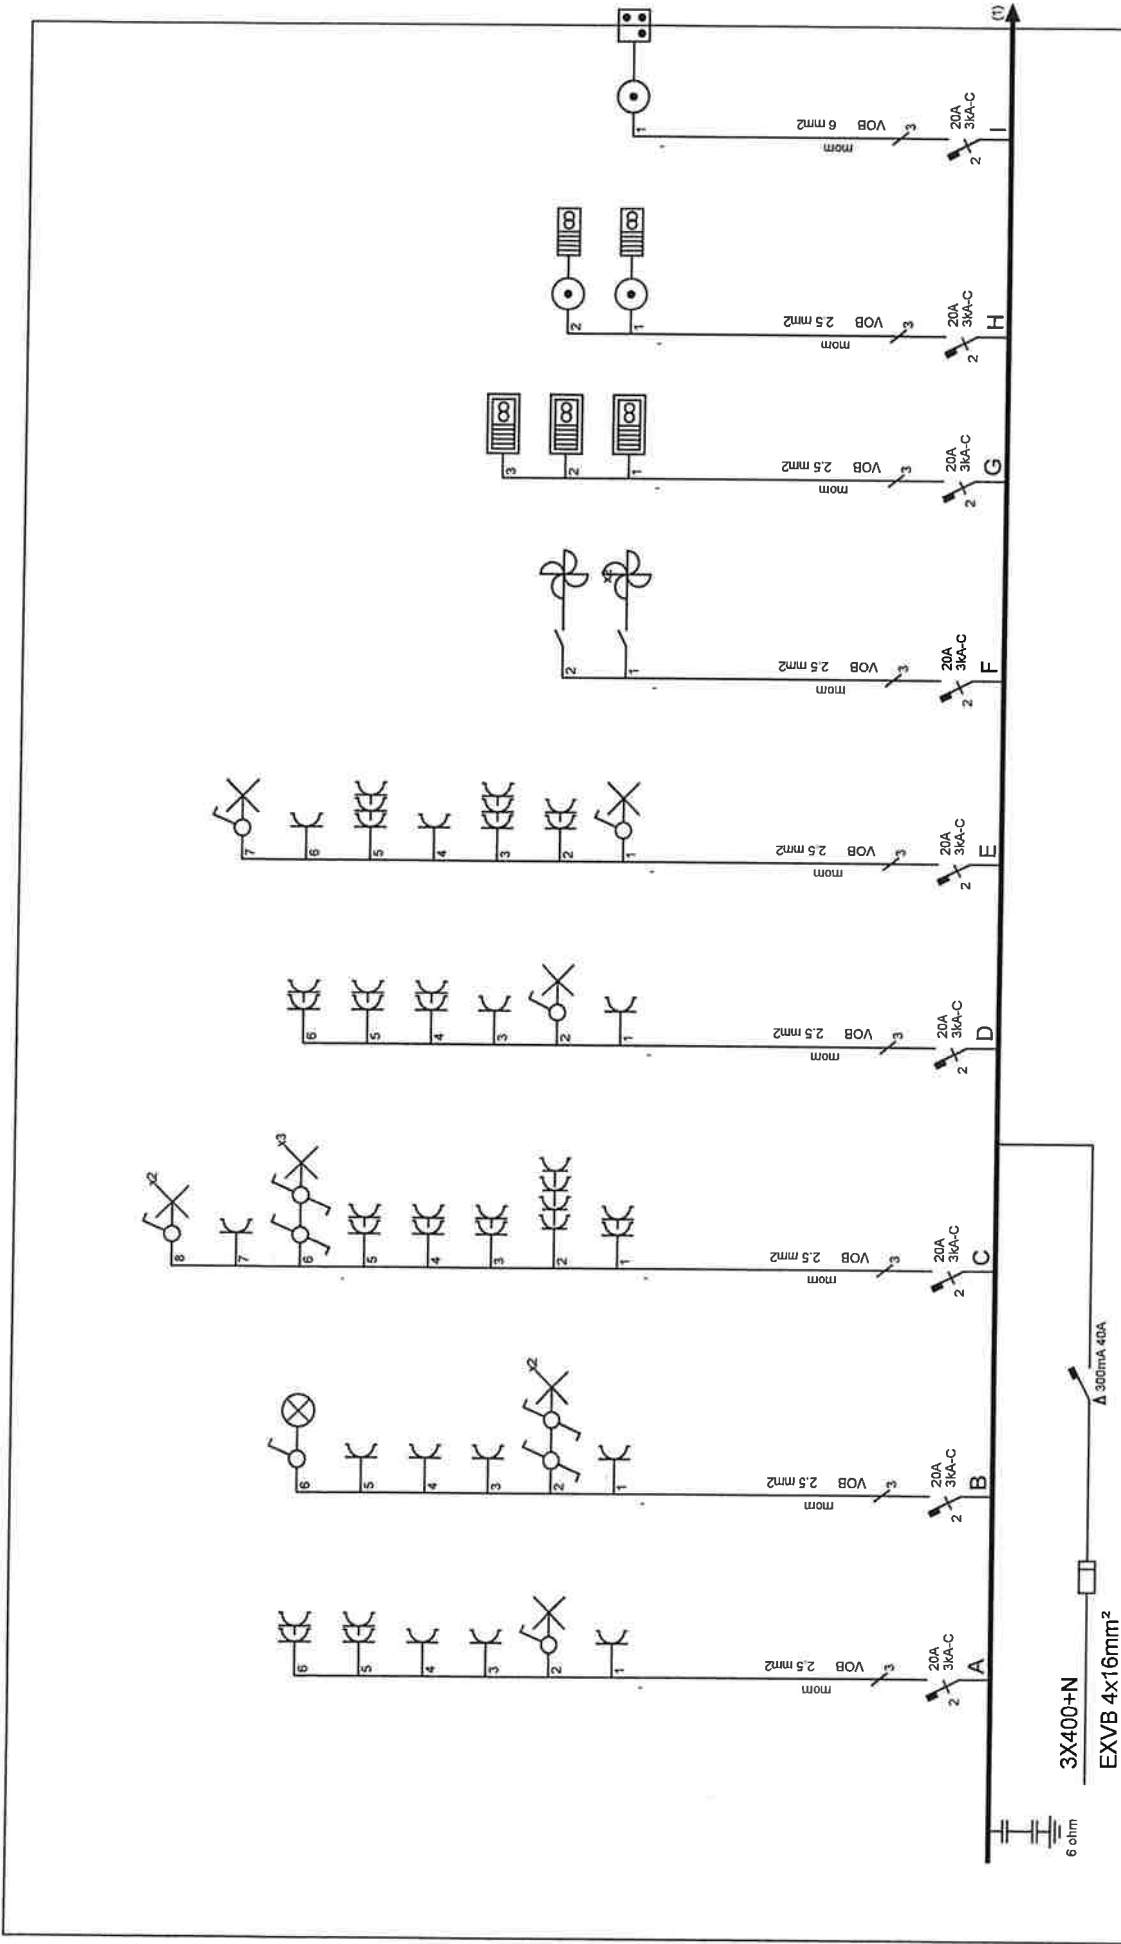

Organisme agréé


.. / .. / 2005

Propriétaire

Vranckx 1ER DROIT  
rue de templeux 12  
5190 SPY

Le responsable

.. / .. / 2005

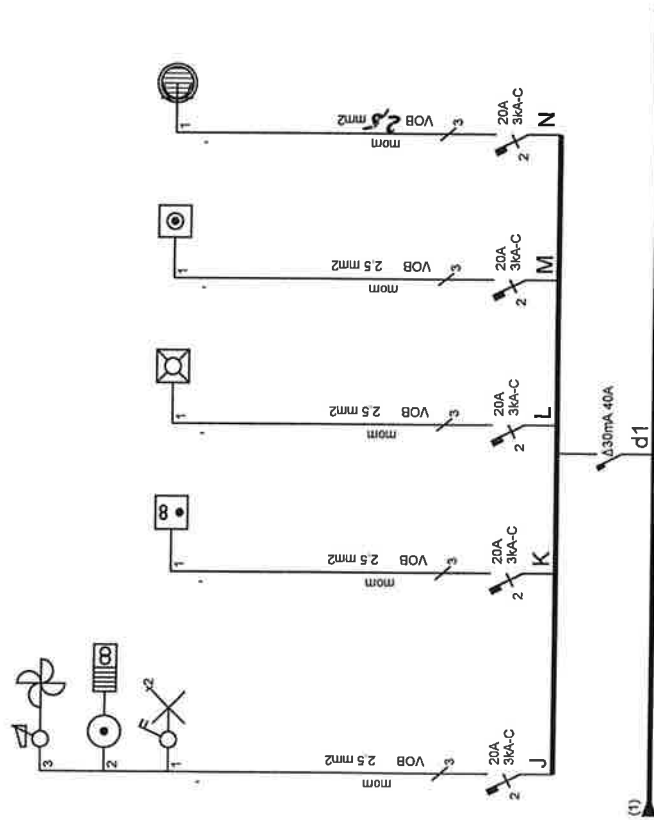

Organisme agréé

.. / .. / 2005

Propriétaire

Vranckx 1ER DROITE  
rue de templeux 12  
5190 SPY

Le responsable

.. / .. / 2005

**1er étage droite (Bte 4)**


|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 |
| A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  |

|    |            |    |               |    |         |    |                |    |                 |    |             |    |   |
|----|------------|----|---------------|----|---------|----|----------------|----|-----------------|----|-------------|----|---|
| 25 | Cuisinière | 20 | Salle de bain | 20 | Séchoir | 20 | Lave-vaisselle | 20 | Machine à laver | 20 | Chauffe-eau | 20 | N |
| I  | J          | K  | L             | M  |         |    |                |    |                 |    |             |    |   |

|    |     |    |      |                    |                   |            |
|----|-----|----|------|--------------------|-------------------|------------|
| 40 | 0,3 | 40 | 0,03 | Délestage 300 Mili | Délestage 30 Mili | Régulation |
|    |     |    |      |                    |                   |            |

**1er étage droite (Bte 4)**

A Éclairage et prises grande chambre



- B** Éclairage et prises hall d'entrée & wc
- C** Éclairage et prises living
- D** Éclairage et prises petite chambre
- E** Éclairage et prises cellier & cuisine
- F** Commande ventillos
- G** Accus
- H** Radiateurs chambres
- I** Cuisinière
- J** Salle de bain
- K** Séchoir
- L** Lave-vaisselle
- M** Machine à laver
- N** Chauffe-eau

