

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 17/09/2026

Inspecteur: Koen De Meyer

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

B.T.W. nr.:-

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel:

Serienummer:

Datum verslag: 18/09/2026

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 2503551

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Keiberg
Huisnummer 51
Busnummer
Postcode 9340
Gemeente Lede
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Keiberg
Huisnummer 51
Busnummer
Postcode 9340
Gemeente Lede
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820056954027

Teller Nr.: : 1SAG1100071715



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 3

Aardelektrode: Aardingslus

Ri algemeen: 4,89 MΩ

OK

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V


Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 50 A

Aantal kringen: 39

RE: 3,93 Ω

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		-	A	Alle	OK	OK
30	40		-	A	4	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	2	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	6		2	1,5
2	U	6		2	1,5
1	C	10		2	1,5
15	C	16		2	1,5
19	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6

Visueel nazicht (algemeen)	NOK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	NOK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.02 Eëndraadschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.04 Situatieschema van de installatie komt niet overeen met de werkelijkheid. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I5.12 De doorsneden van de interne verbindingen en/of van de verdeelrails in het bord zijn onvoldoende. (Boek 1 Onderafdeling 4.4.1.1. en 4.4.1.5.)
- I9.15 In een elektrische installatie mogen slechts veilige elektrische machines, toestellen en leidingen aangewend worden. Dit wil zeggen dat ze moeten gebouwd zijn volgens de regels van goed vakmanschap en dat ze in geval van foutloze installatie en onderhoud, en toepassing volgens hun bestemming, zowel de veiligheid van personen als het behoud van goederen niet in gevaar mogen brengen. (Boek I, onderafdeling 1.4.2.1.)
- N23 Alle differentieelstroombeschermingsinrichtingen werden getest en in orde bevonden.
- De interne bedrading moet minstens 10mm zijn voor de netstroom van 50A
- De bruggen, aan de bovenzijde, tussen de 2 bovenste linkse automaten betuigt van geen goed vakmanschap en is niet reglementair.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 17/9/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.
- Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:
- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd

- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
Inspectietijd: van 15:26 tot 16:10
De inspecteur Koen De Meyer



Koen De Meyer
ACEG VZW - #543

De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.






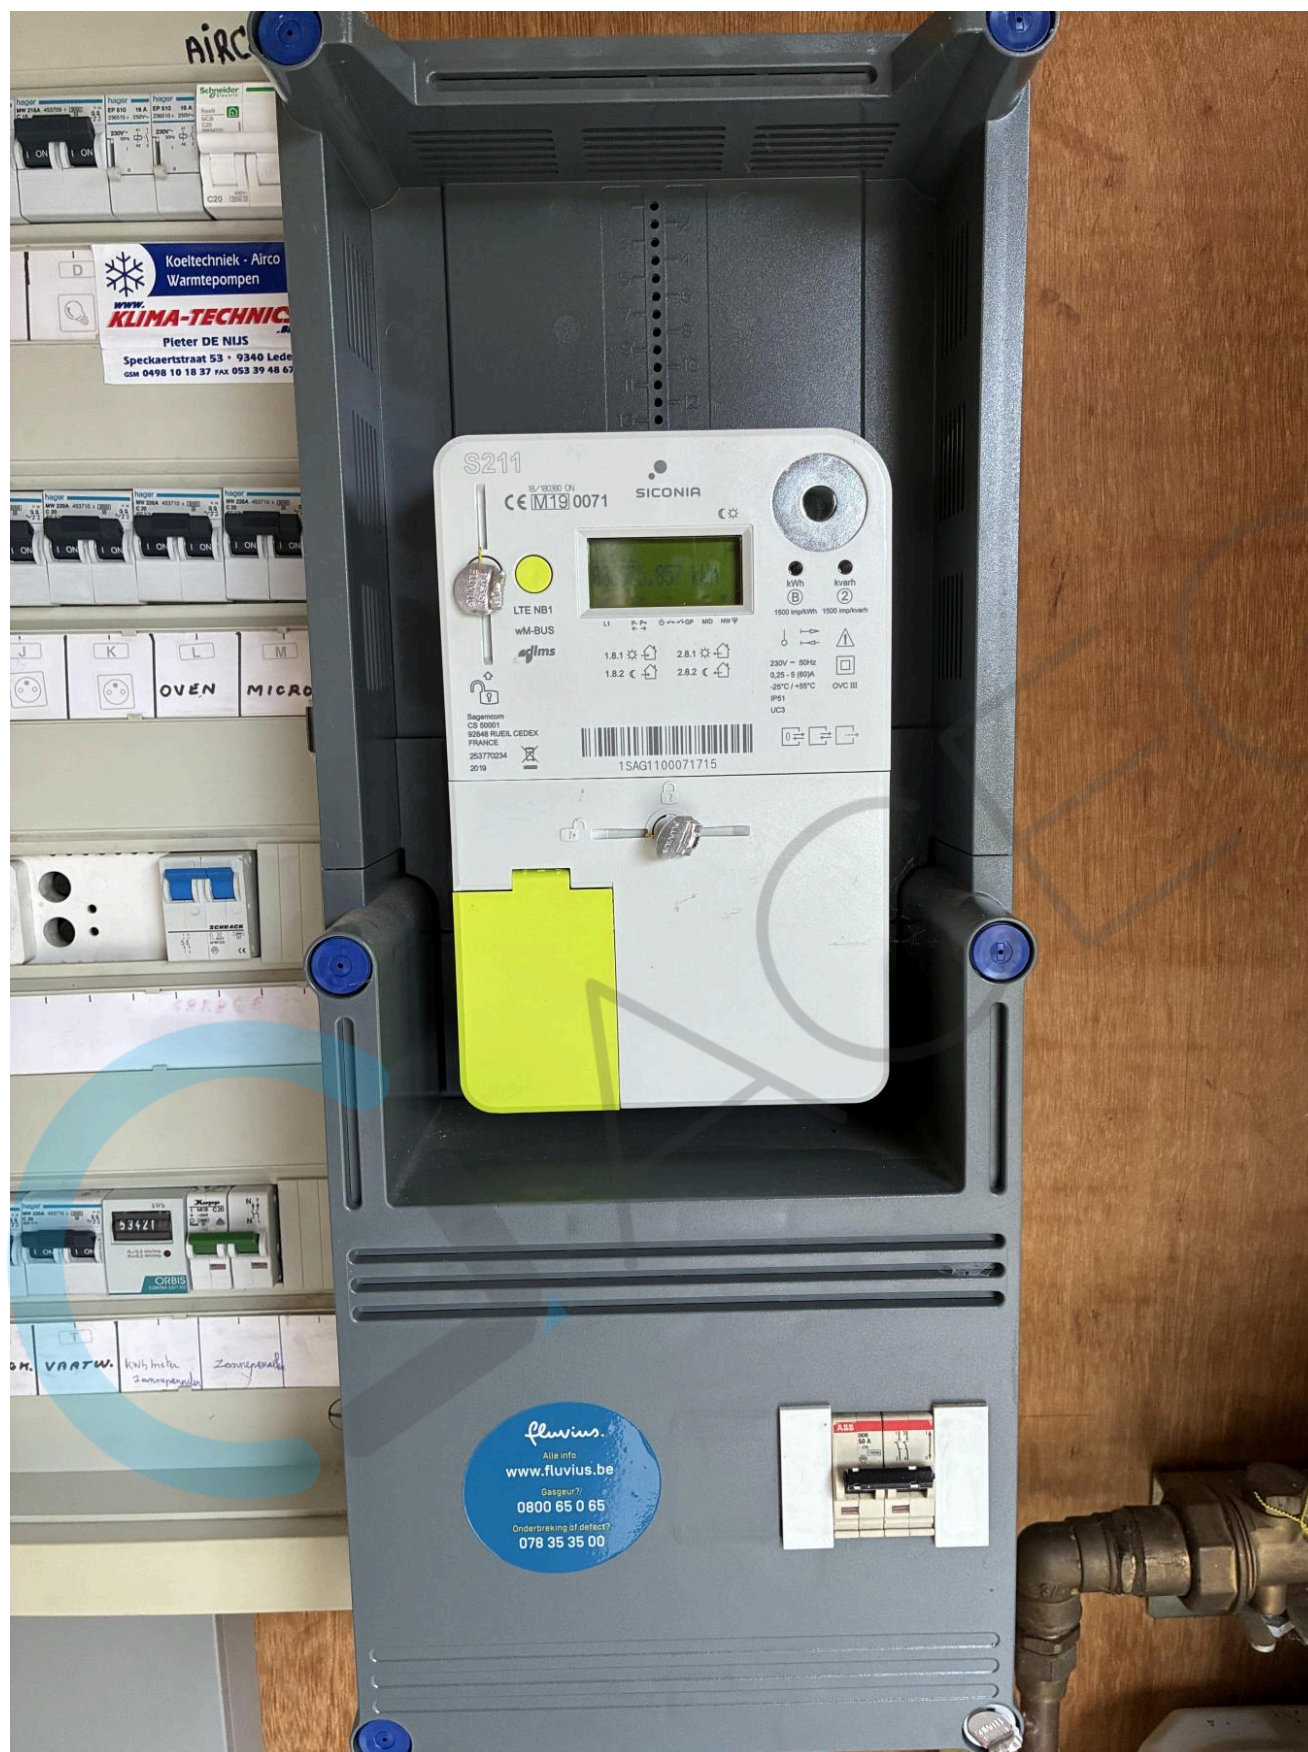









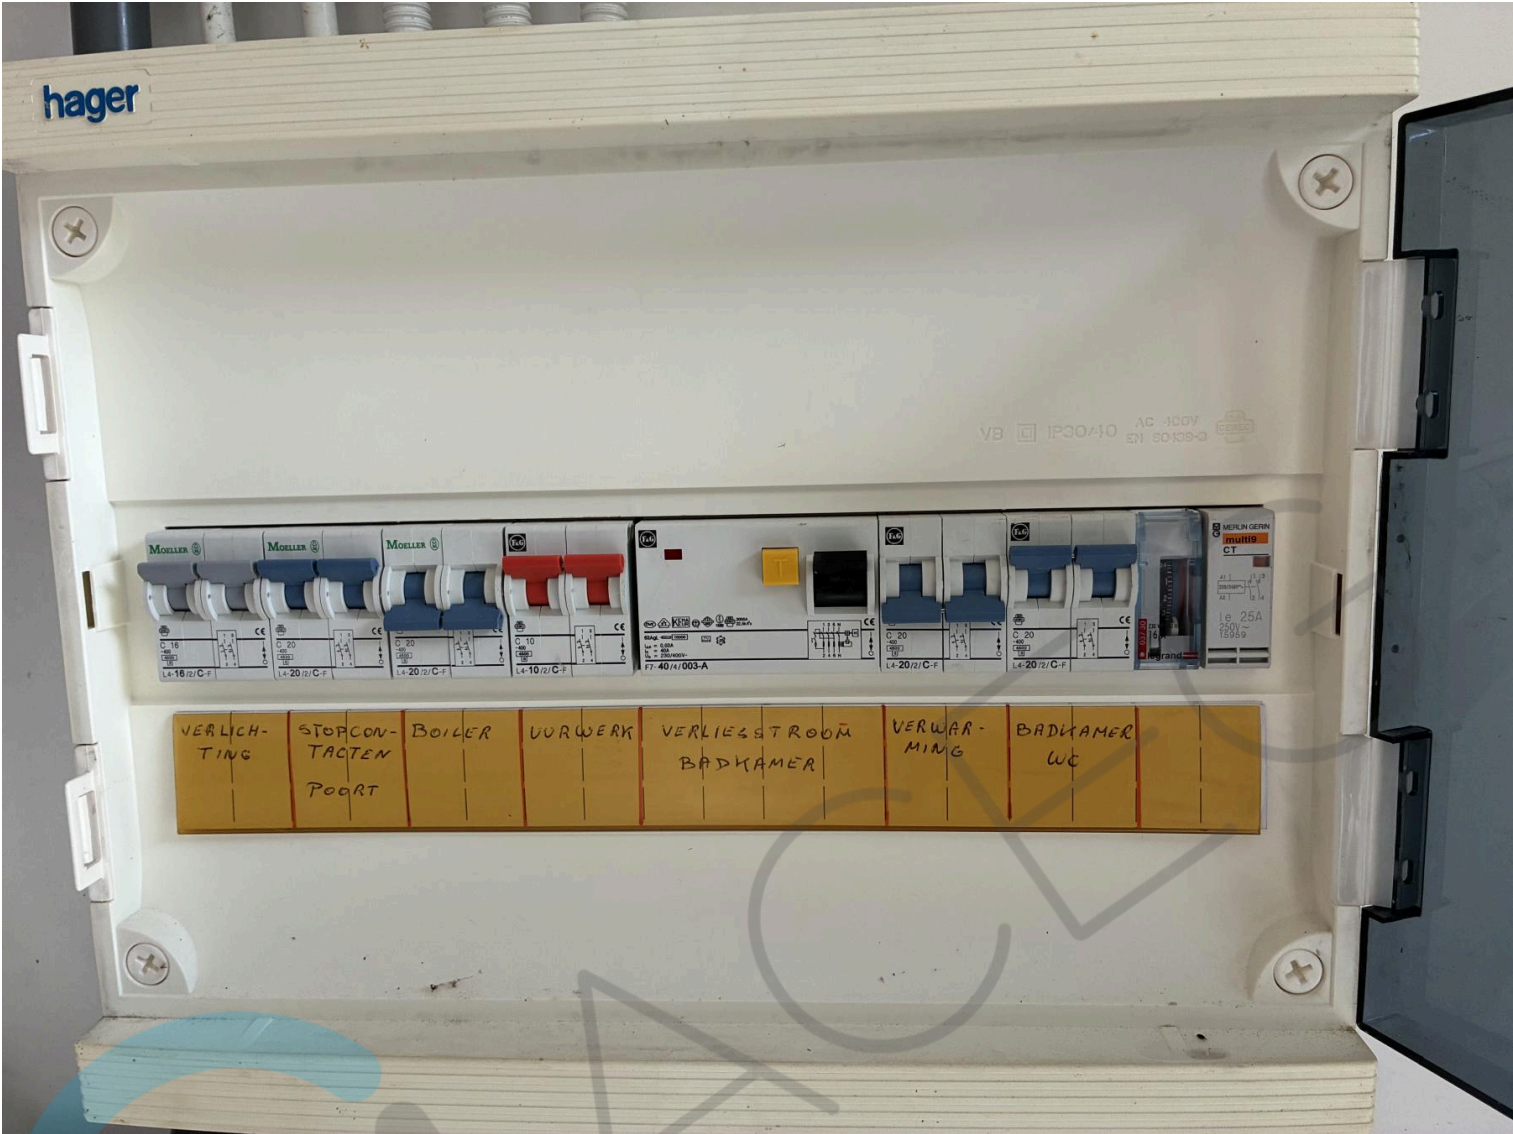

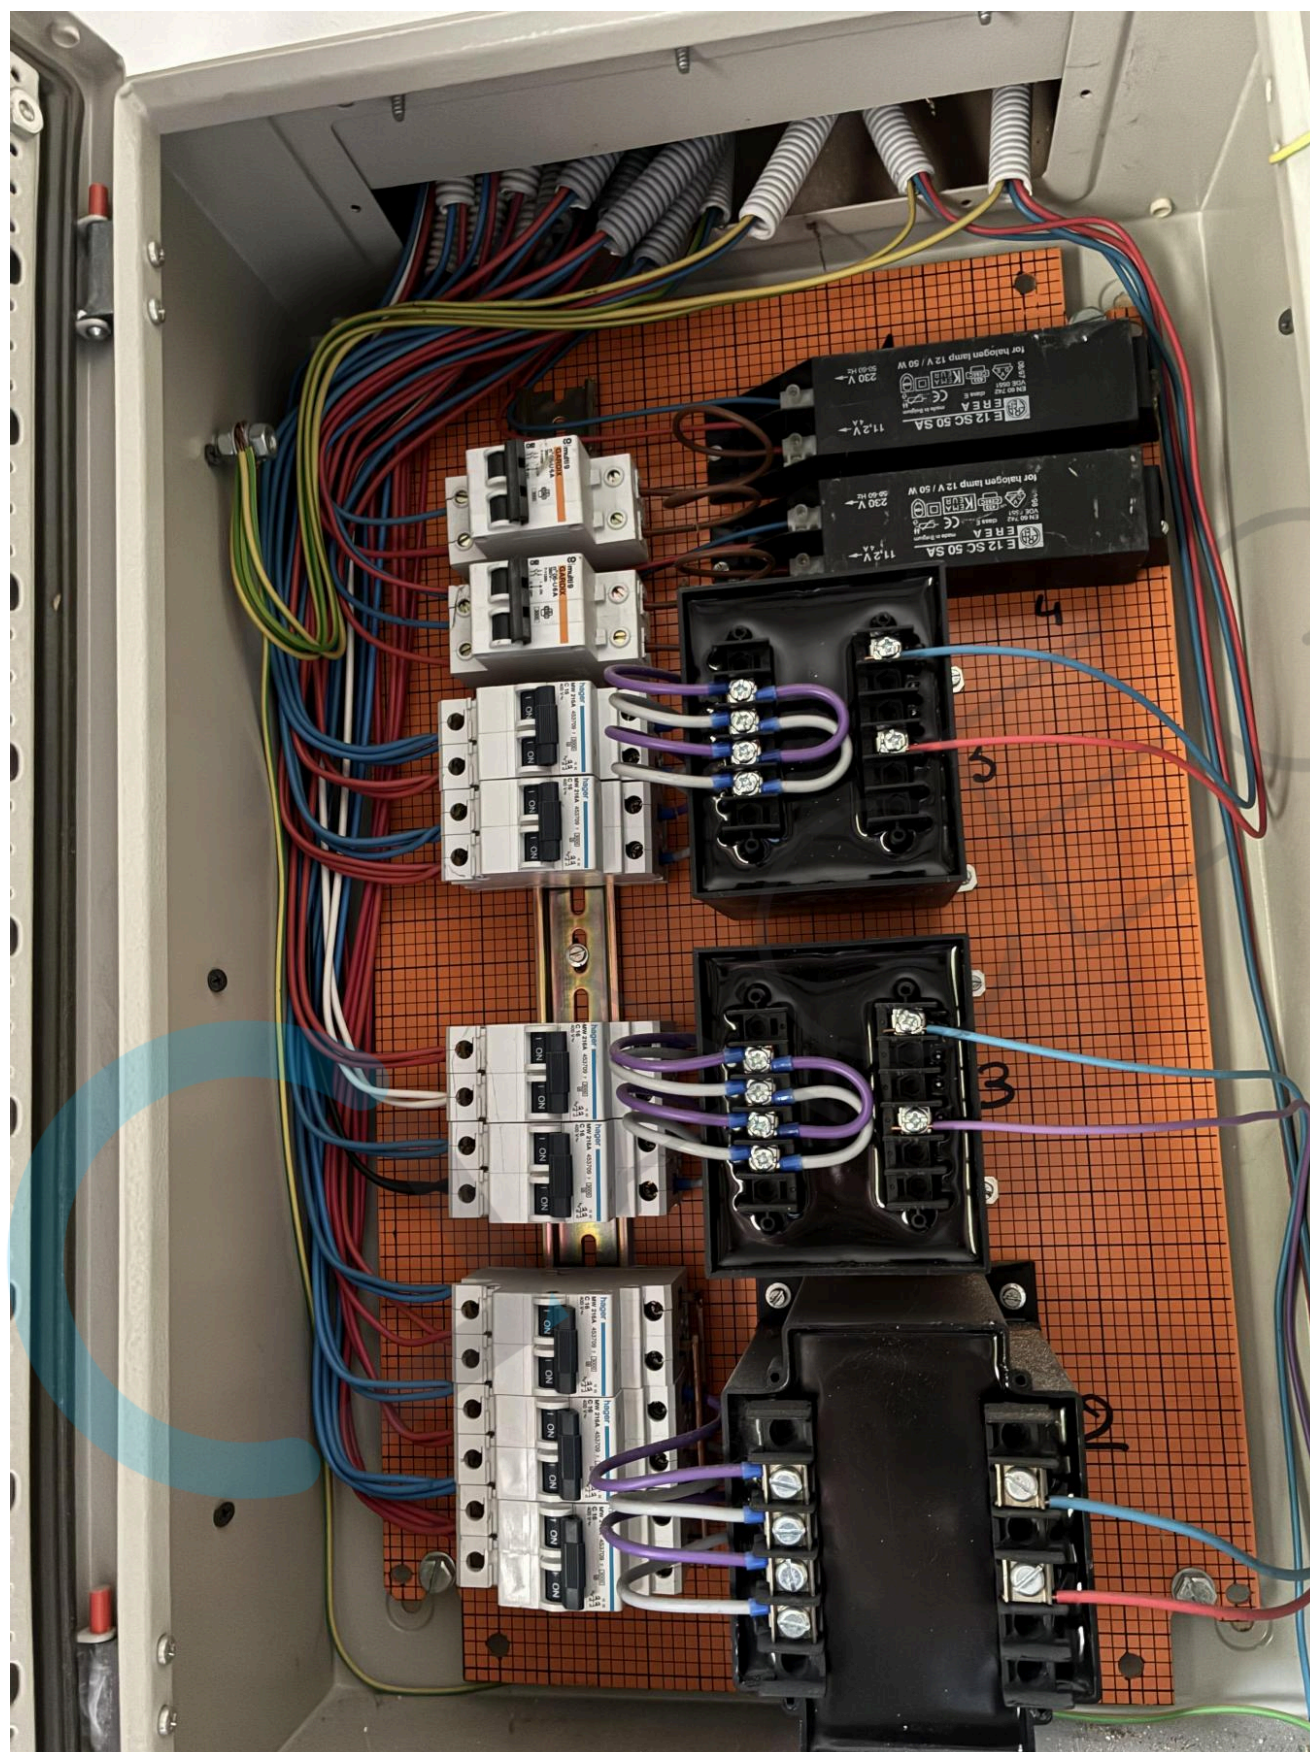

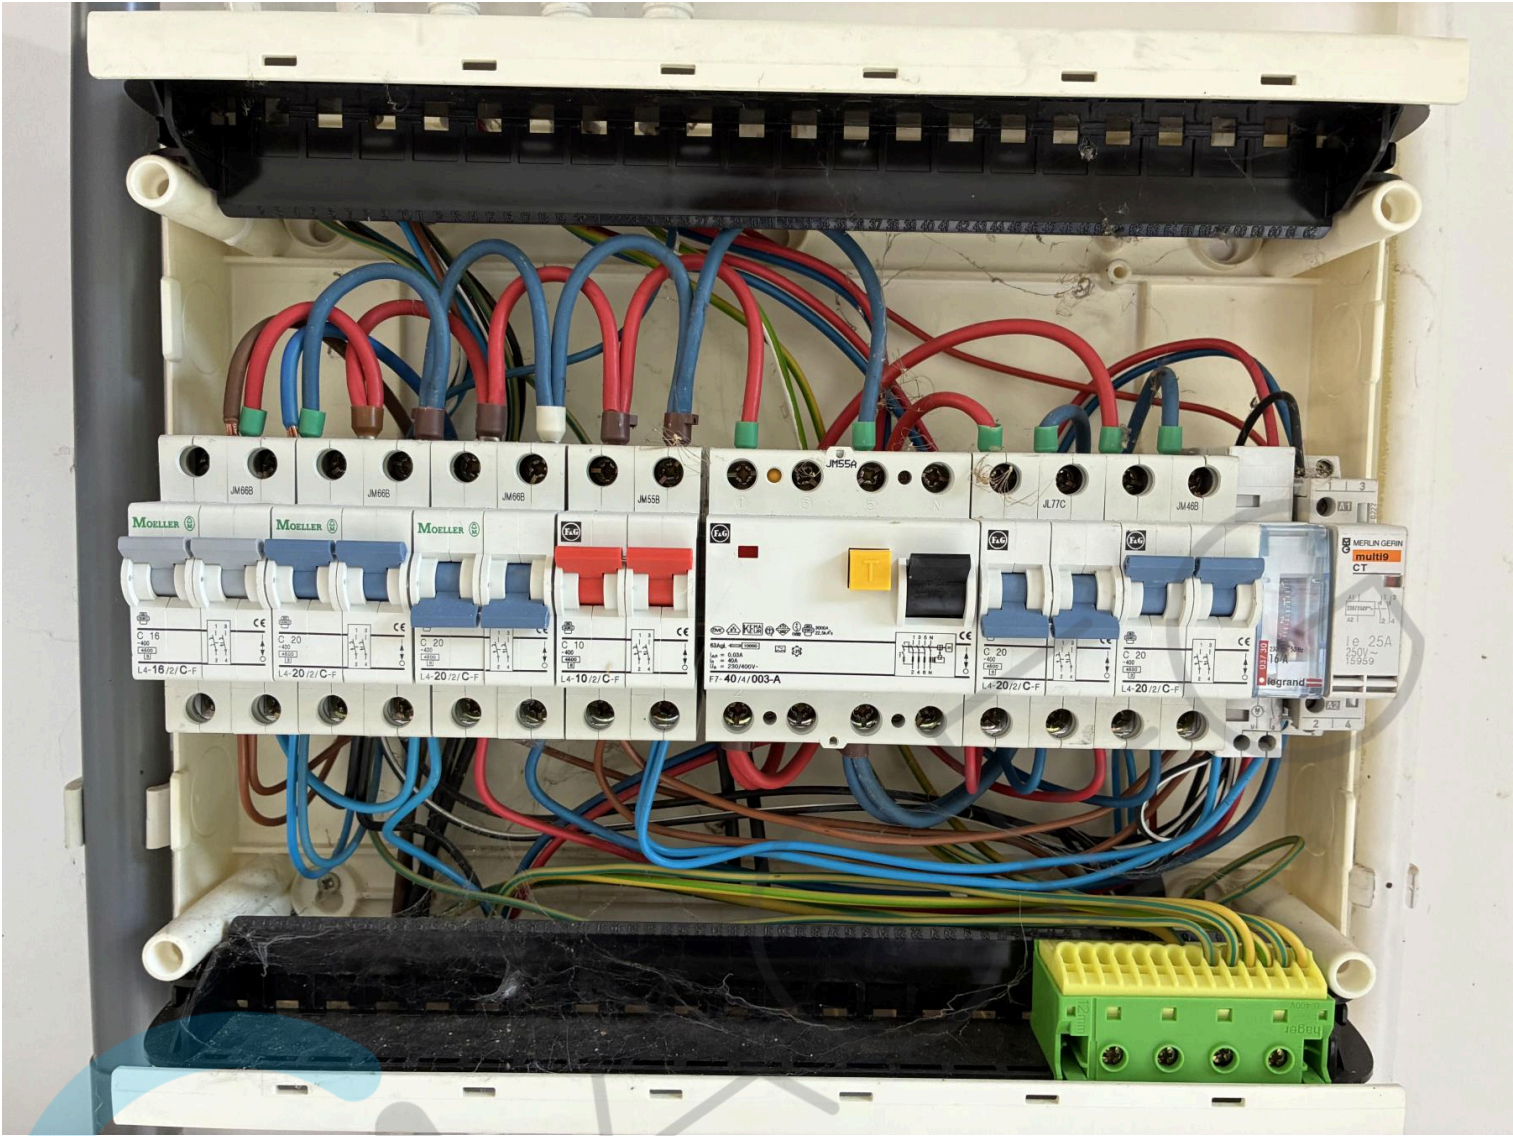

EENDRAADSSCHEMA

Bijlage nr 1
Verslag: nr


Adres installatie: Straat
Post nr.

Huybrecht - Bonne
De Kieberg 51 (lot 3)
Gemeente
LEDE



BESTAANDE INSTALLATIE

Bord:

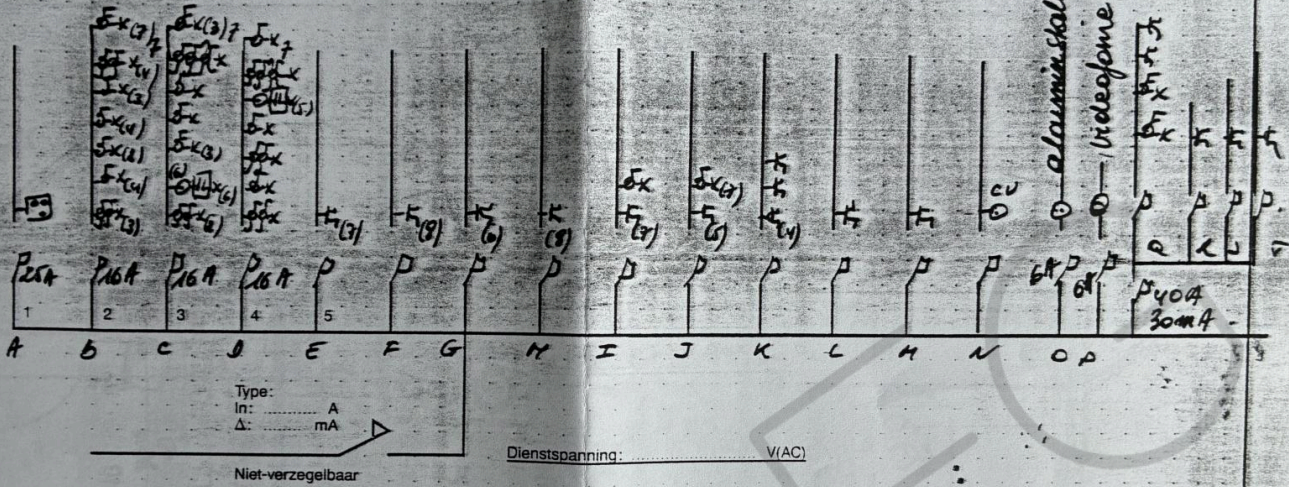

De erkende controle-instelling:

Handtekening:
Datum:


DEPOORTER ELEKTRO


Sint Antoniusstraat 107


8570 INGGOIGEM

BTW BE423.476.066

ALLE LEIDINGEN ZIJN UITGEVOERD IN VOB 2,5 mm² IN BUI
BEVEILIGD MET AUTOMATEN 20 A TENZIJ ANDERS
VERMELD IN SCHEMA

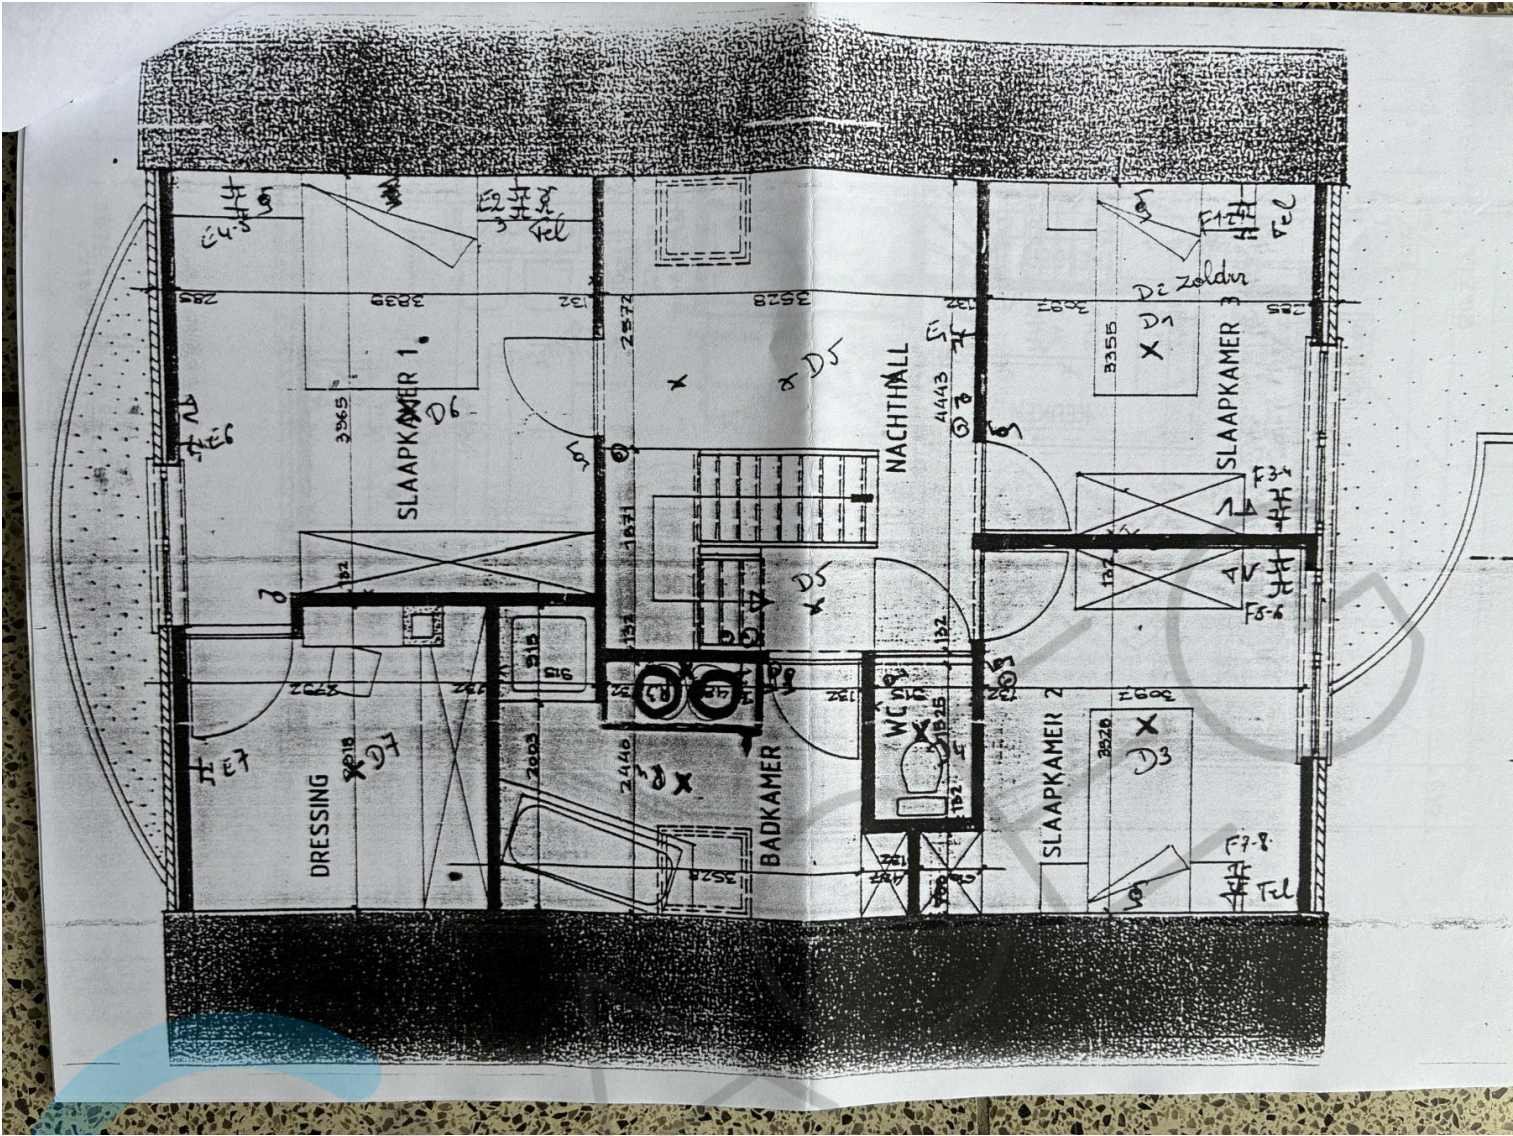

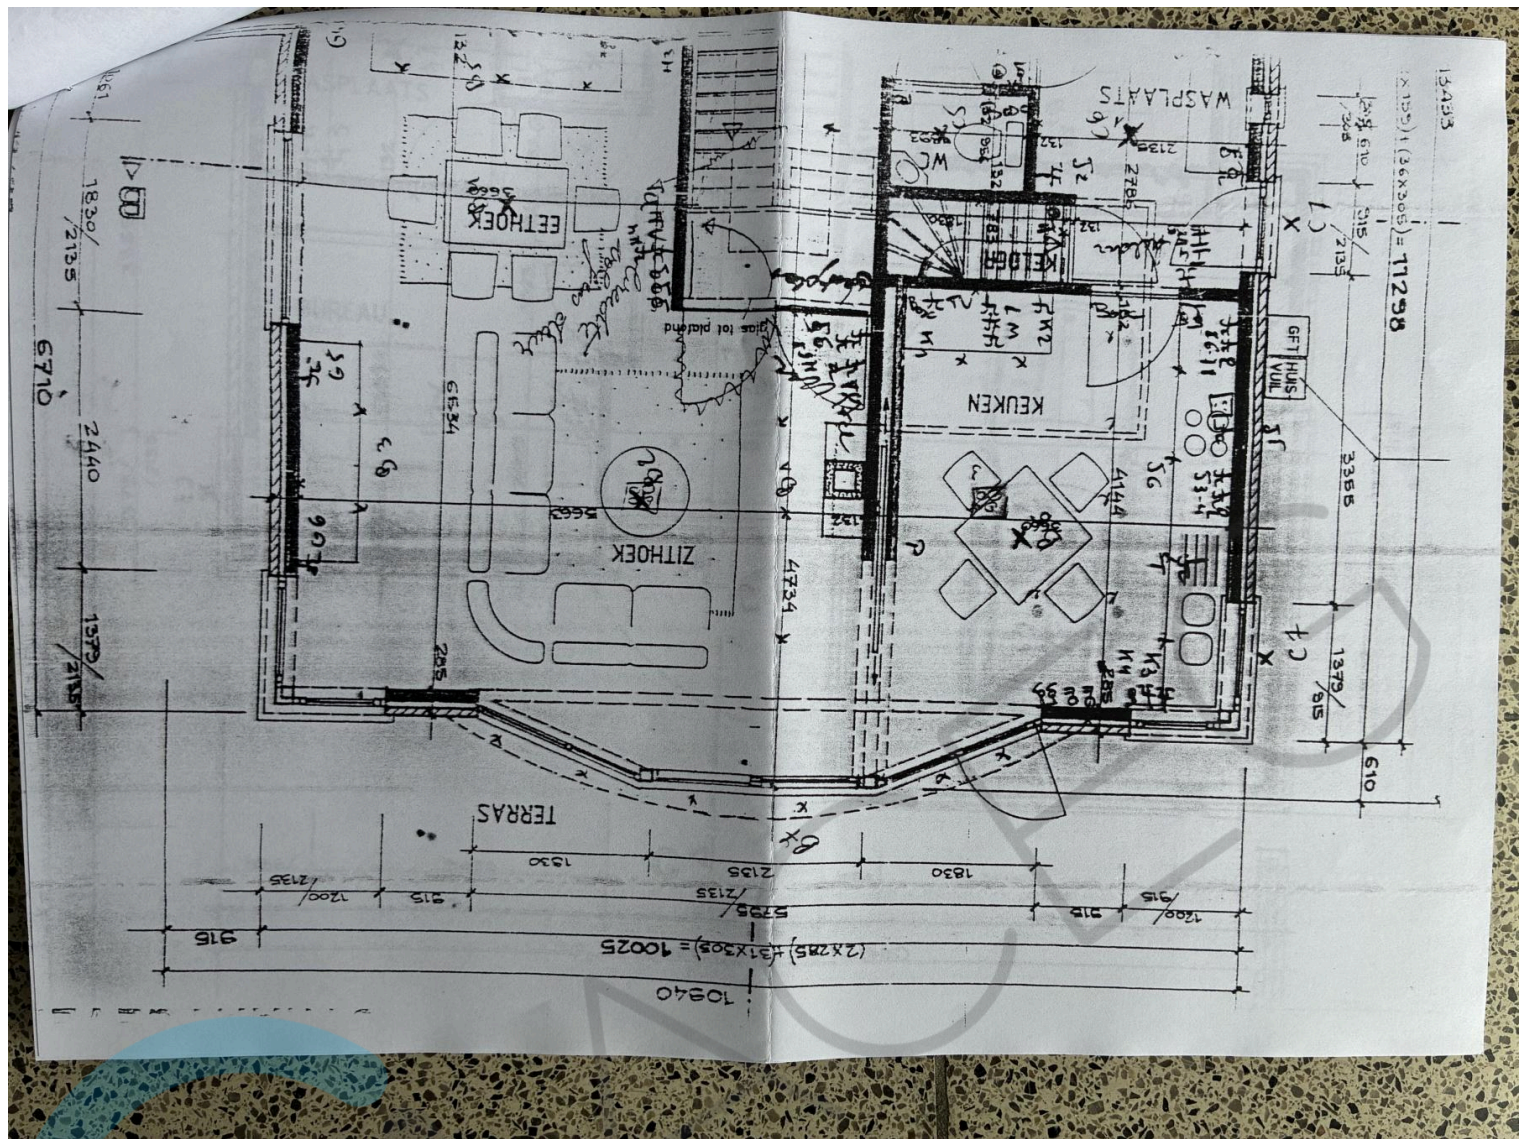

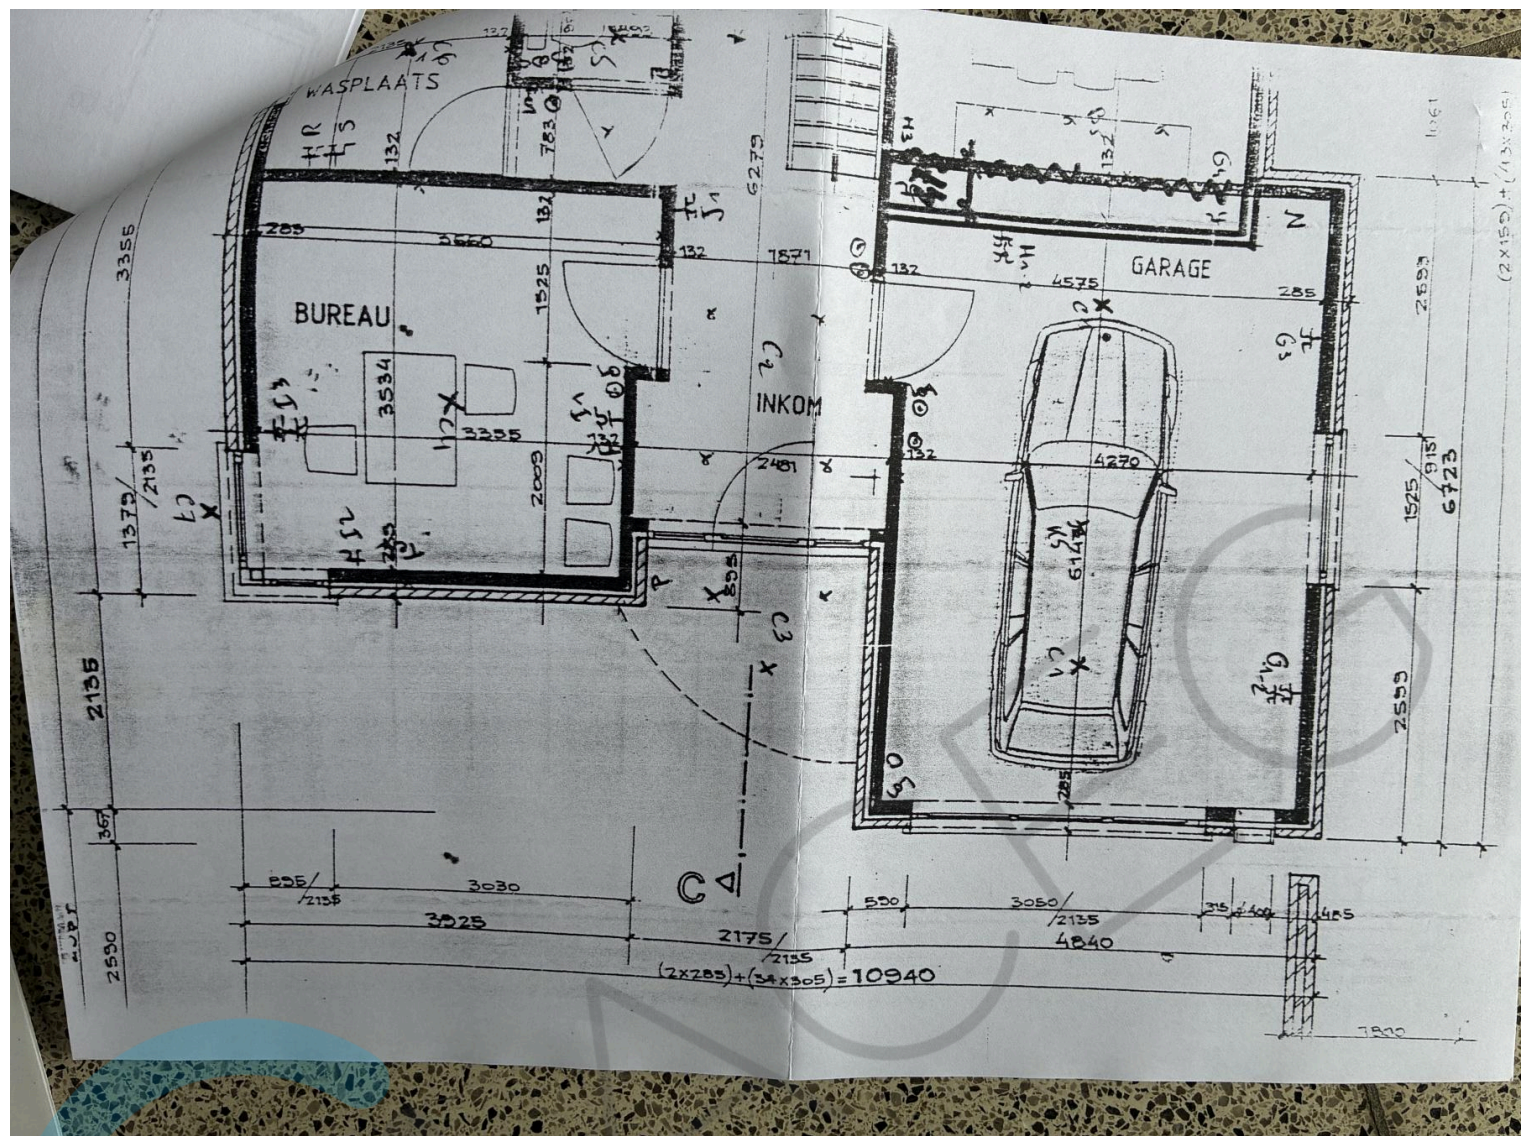


PRINCIPESCHETS: Netgekoppelde installatie aangesloten op laagspanningsnet, 16 x 230Wp


adres
Peter Huybrecht
Keiberg 51
9340 Lede



SENSICO bvba
David Van Der Velde
Martelarenlaan 2
9160 Lokeren
gsm 0497 91 24 63
www.sensico.be

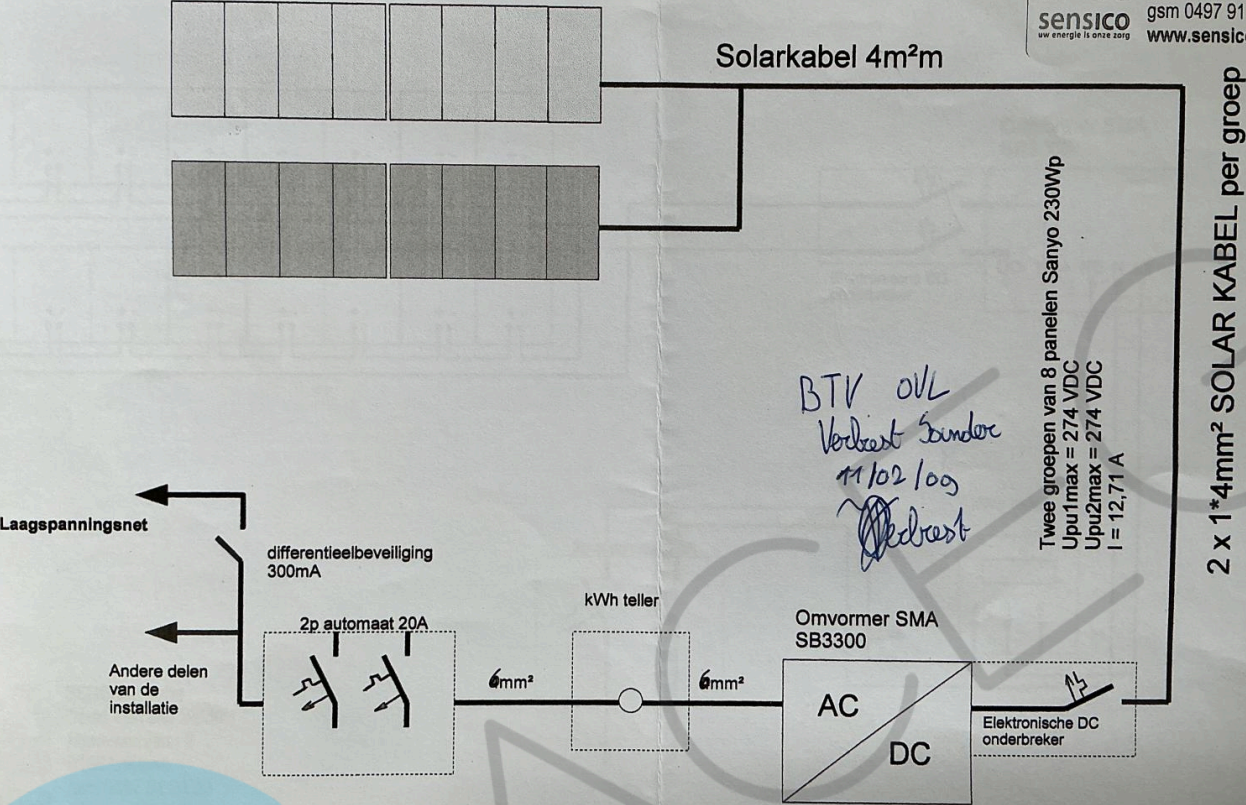

PRINCIPESCHETS: Netgekoppelde installatie aangesloten op laagspanningsnet, 16 x 230Wp
 adres Peter Huybrecht
 Keiberg 51
 9340 Lede

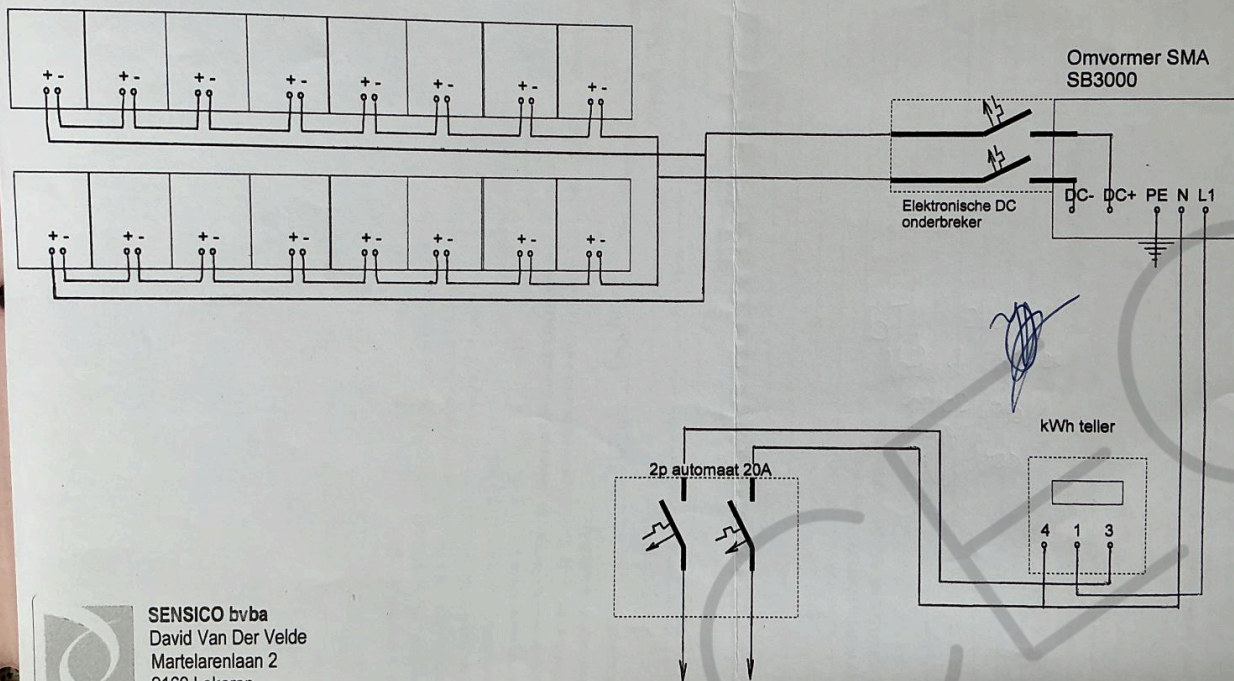

SENSICO bvba
 David Van Der Velde
 Martelarenlaan 2
 9160 Lokeren
 gsm 0497 91 24 63
 www.sensico.be







