



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

Afdeling: ELE

VOORLOPIG VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE I.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: _____ Aard installatie: nieuwe Type lokalen: appartement
Plaats onderzoek: Swal Engelenstraat 46 bus 2 TURNHOUT 2300
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling Volgens AREI Art.: 86/271
Datum onderzoek: 17/06/2015 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/06/2040 Onderzoeker: ALAERS TOM
Eigendom van: _____
Installateur: _____
B.T.W.: _____ ID-kaart: _____ Uitgereikt te: _____ Datum: _____

BESCHRIJVING

EAN nr.: _____ Teller nr.: _____ Stand I: _____ Stand II: _____
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: niet aanwezig
Dienstspanning: 1 N 400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 16 mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: 35 mm² spreidingswaarde: 4,6 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutflus: in orde Algemene isolatieweerstand: 34 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ☒ zie schema in bijlage ☒ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 14

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker

Alaers
28/6


ALAERS
17/6/15
OL

2 pelt
 400 km 0,30 m/hp


11-20
 Staat Engeland
 Frankrijk

46 bes 2
 Met D 0.2



SWBA AERTS MIL
 SYKAMPAD 3
 216 MEELDE TEL: 057996
 11M 140. 020 256

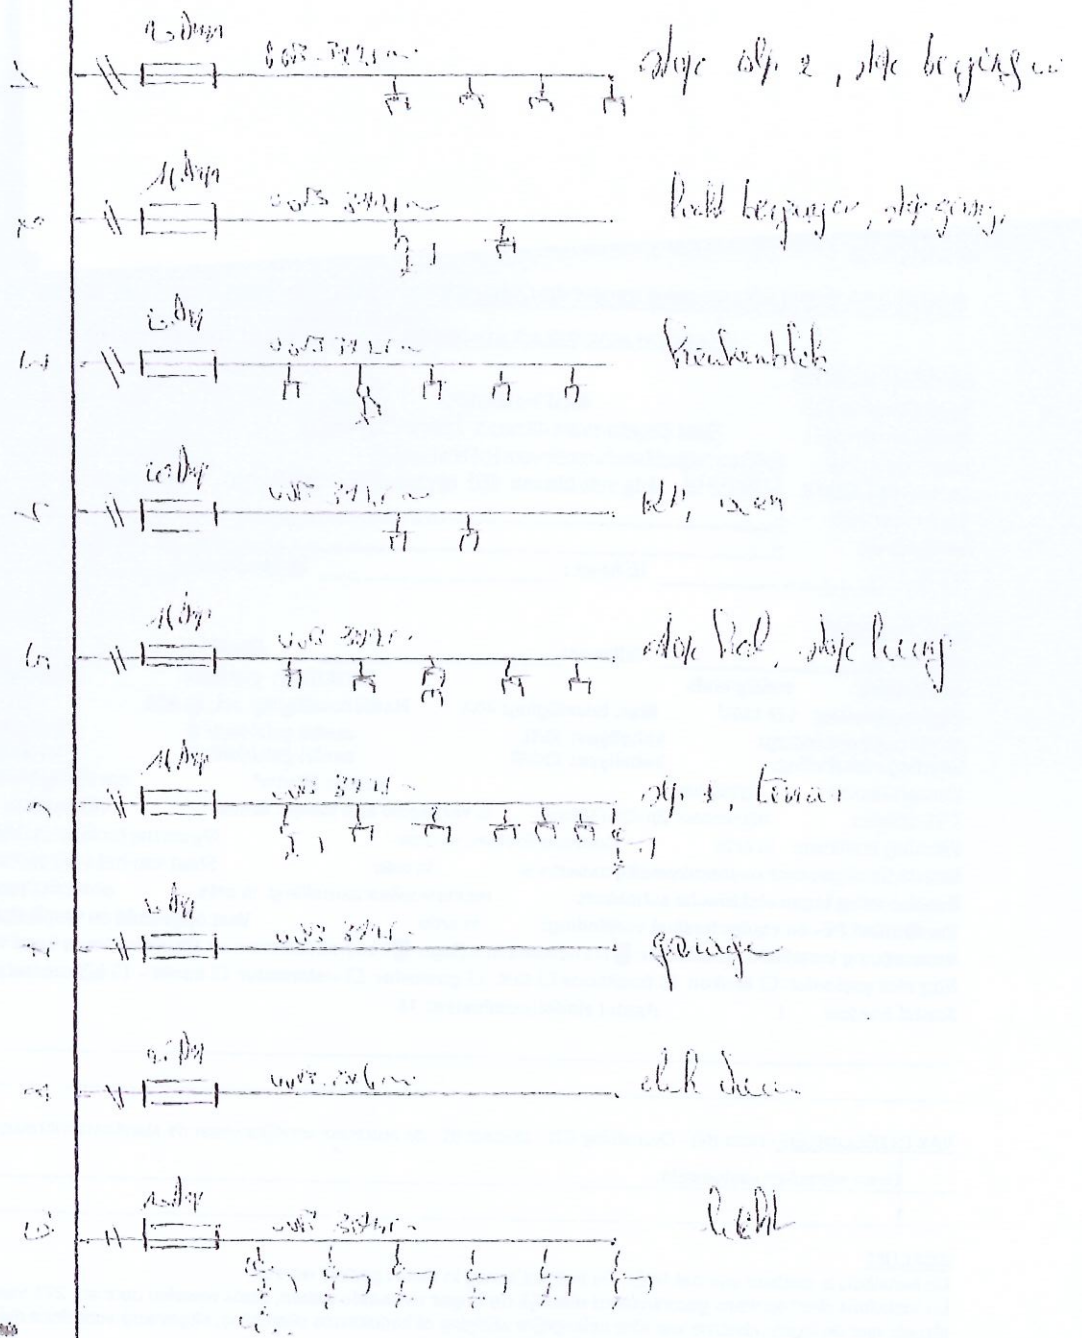

2.10.2000
 4-10-00

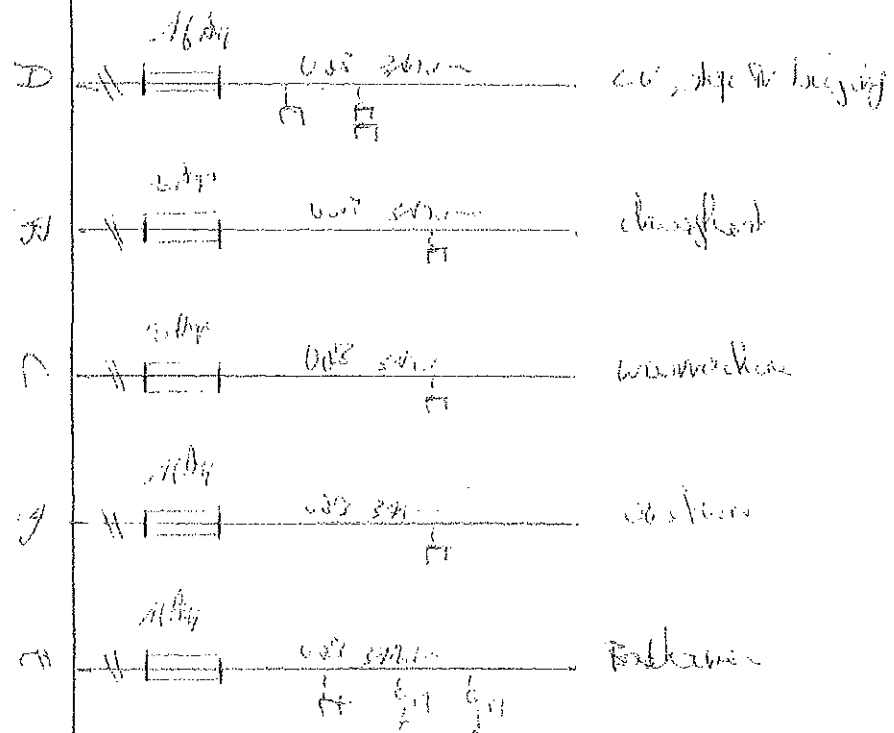

W84 AERIS MIL
 2.10.2000
 4-10-00

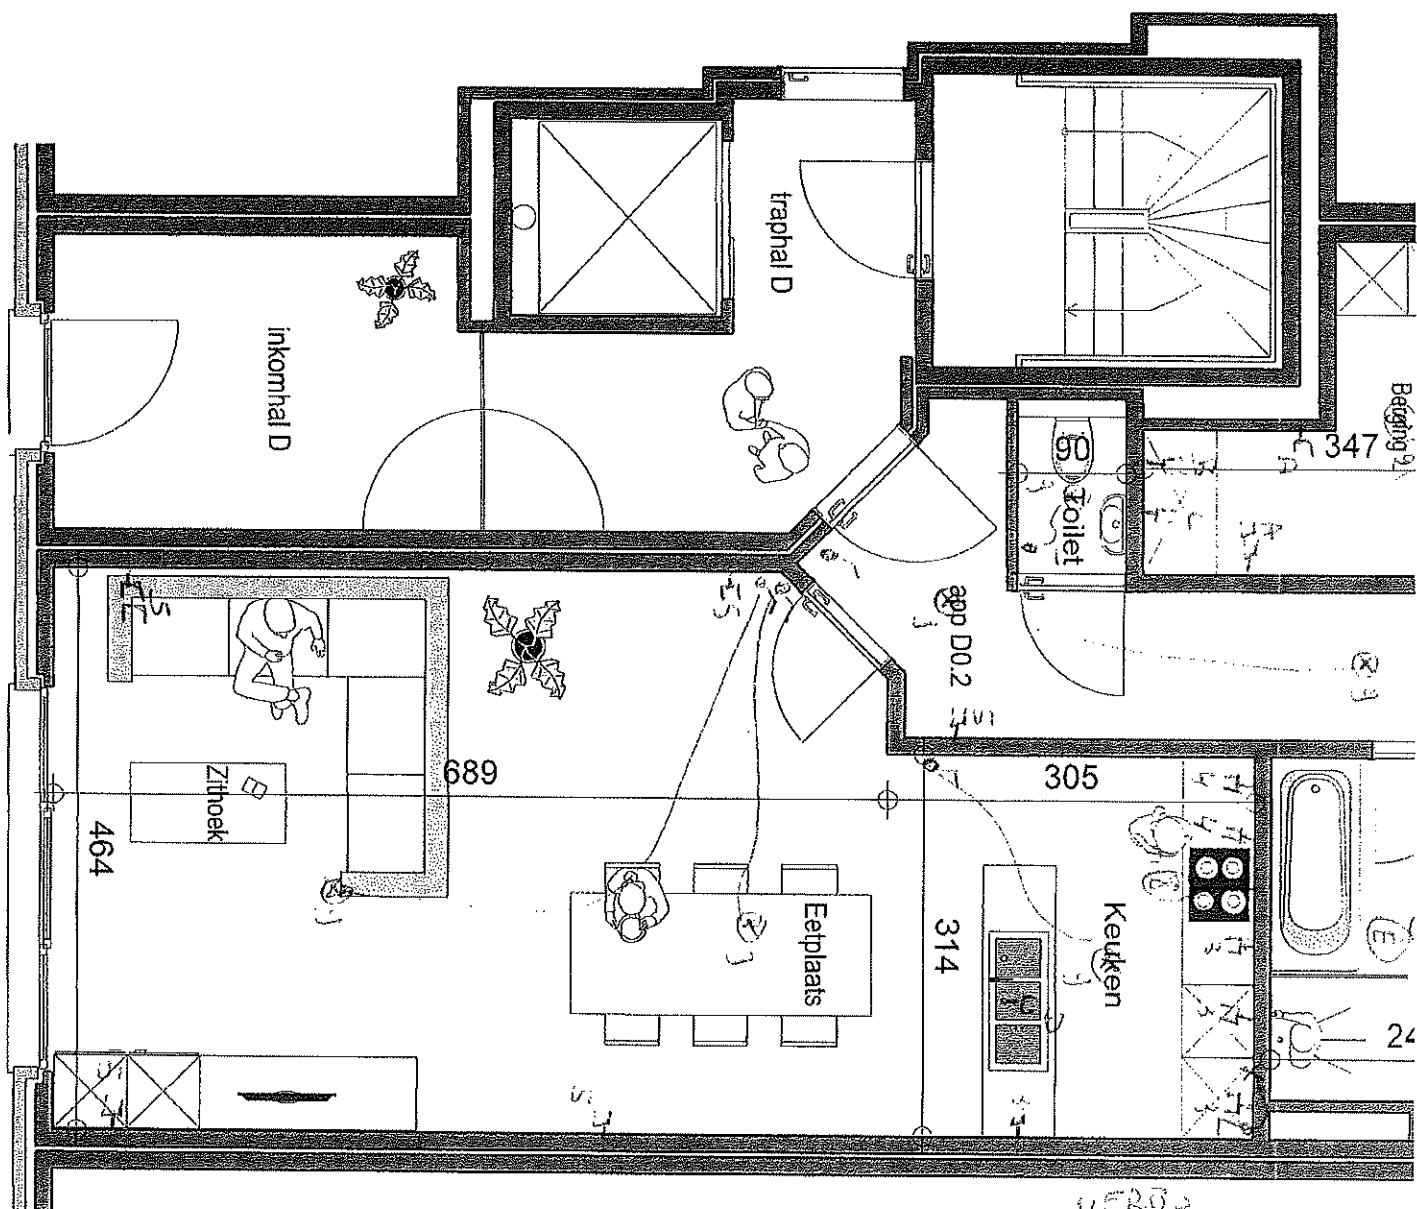

Opp app 105 m²
Terras 14 m²

*VRA AERTS MIL
EYKANTPAD 9
2101 WEELOE TEL: 657888
RTW 422 012 955

VERBOD
Sint Engelenvoet
Tombach

