

Distributionnetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : *ONEE*

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: *107/10408/1*

EAN code:

Aard onderzoek : AREI	95	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	II	IN	II	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐

Plaats van het onderzoek:

Lieu du contrôle:

Ar de la Gare 7

5000 Melle

Eigenaar

Propriétaire: *Pierre Collignon*

Adres

Adresse:

100m

Installateur:

CTEM

Datum van het onderzoek:

Date du contrôle:

11/8/2014

BTW / TVA:

Ik. / C.I.:

Inspecteur: *Bergmans*

Onderzoek / Contrôle: ☐ Woning / maison ☒ Appart. *46*

Spanning:

230V

Meter / bord verbinding

3 x 6

Max. beveiliging:

40A

Aardelektrode:

1.0m

Isolatie

2mm Mohm

Aantal verdeelborden:

Nombre de tableaux:

1

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen:

8

Nombre des circuits terminaux:

Test In

L. In

AREI / RGIE

270 271bis 278

In (A)

Δ In (mA)

type

40

300

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

40

30

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Visueel nazicht: algemeen:

☒ OK

☐ NOK

directe aanraking:

☒ OK

☐ NOK

Indirecte aanraking:

☒ OK

☐ NOK

Contrôle visuel: générale:

☒ OK

☐ NOK

contact direct:

☒ OK

☐ NOK

Contact indirect:

☒ OK

☐ NOK

Aansluitingen:

☒ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

Potentiaalvereffeningen:

☒ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

Raccordements:

☒ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

Liaisons equipotentielles:

☒ OK

☐ NOK

☐ OK

☐ NOK

Inbreuken/Infractions: (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques:

VISUM:

Datum/date:

Le tableau et l'équipement interne et SDS ne sont pas installés

Besluit / Conclusion

De installatie is: ☒ conform met het AREI

en mag: ☒ in dienst gesteld worden

L'installation est: ☒ conforme au RGIE

et peut: ☒ être mise en service

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een losje met het teken E.T.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Het einddraad-schema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en

stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont

conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken

te doen verdwijnen, en moeten de werken worden afgewerkt opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen

gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Het onderzoek wordt afgesloten op 11/8/2014.

Conformément à l'article 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être

exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour que, en cas de maintien en service des installations, les infractions ne

constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Le nouveau contrôle au plus tard un an après la date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 11/8/2015.

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 11/8/2015.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	
☐	☐	☐	☐	

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le 11/8/2015.


Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.


La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du RGIE doit avoir lieu en plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE: Het resultaat van de controle wordt vermeld op de verslagpagina's. Het resultaat van de controle wordt vermeld op de verslagpagina's. Het resultaat van de controle wordt vermeld op de verslagpagina's.

Al de la agave
 N.E. of
 MAHUR

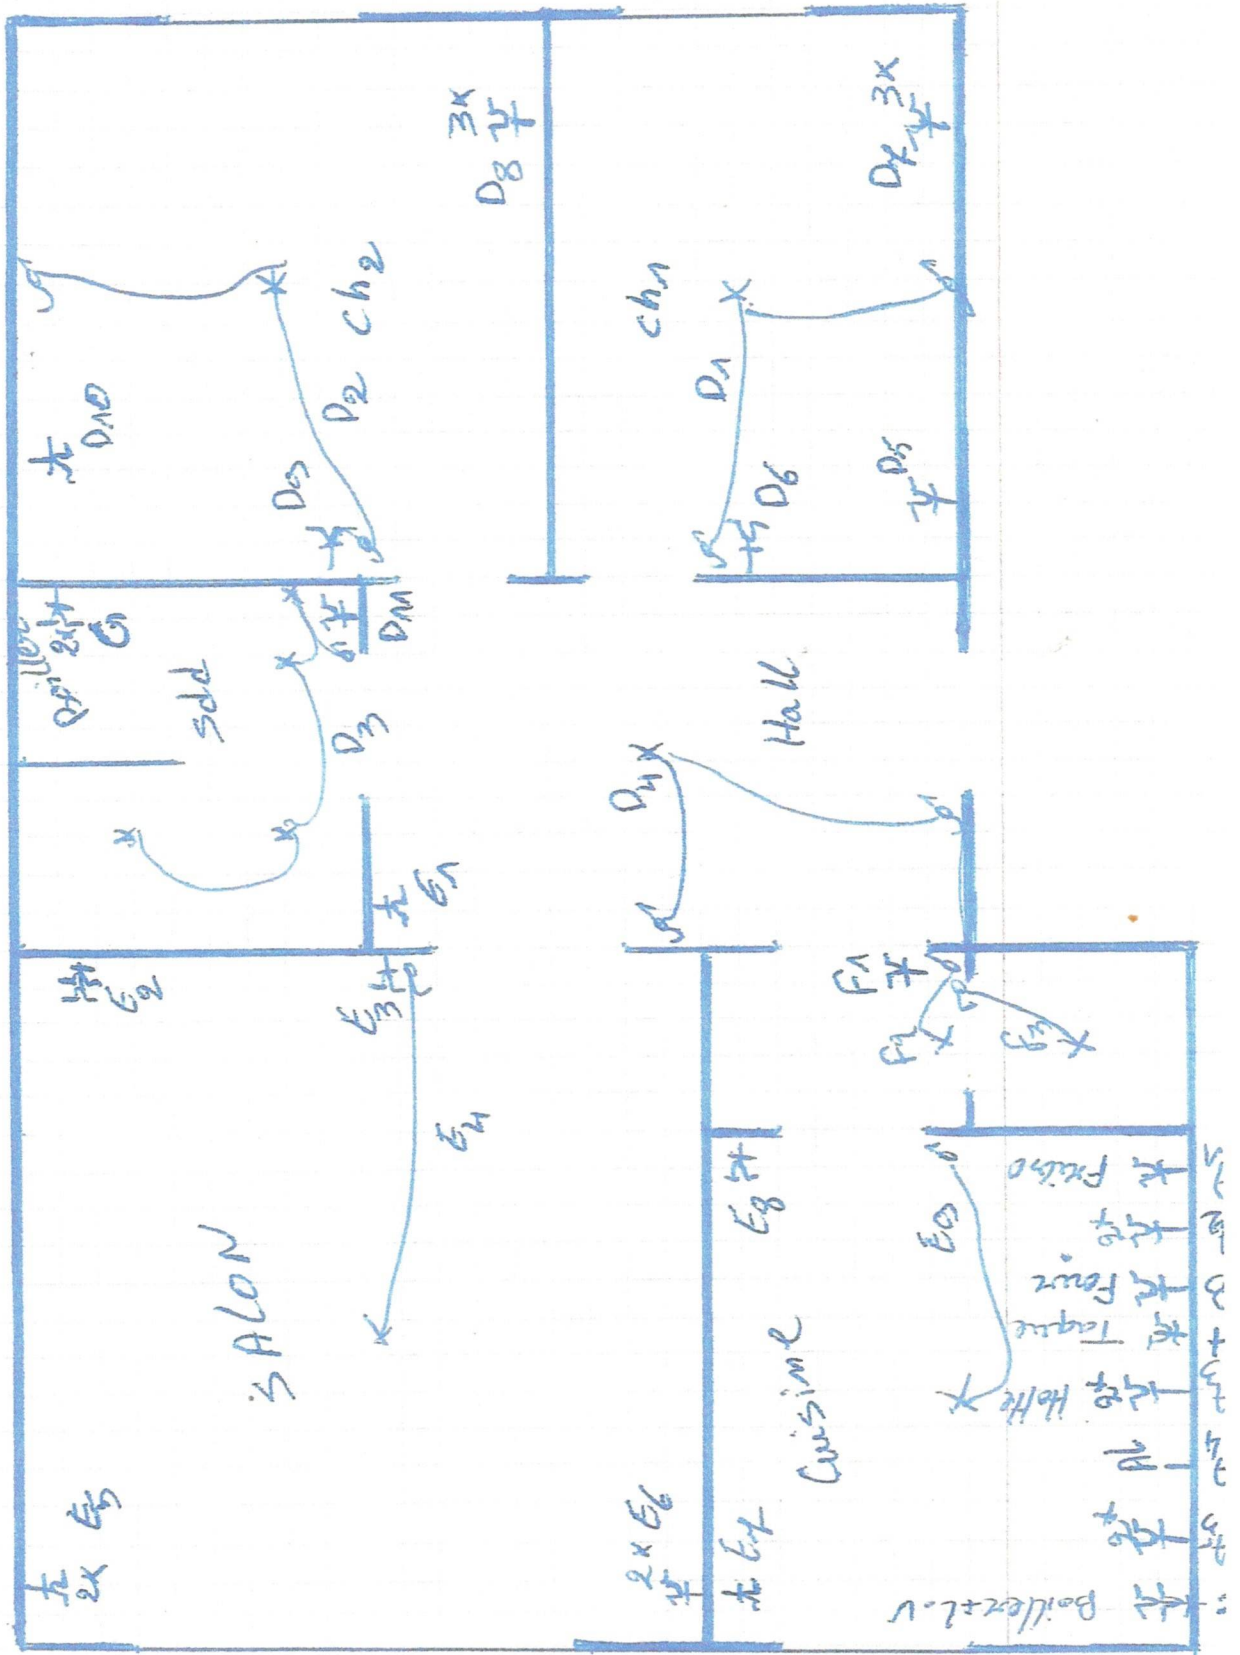

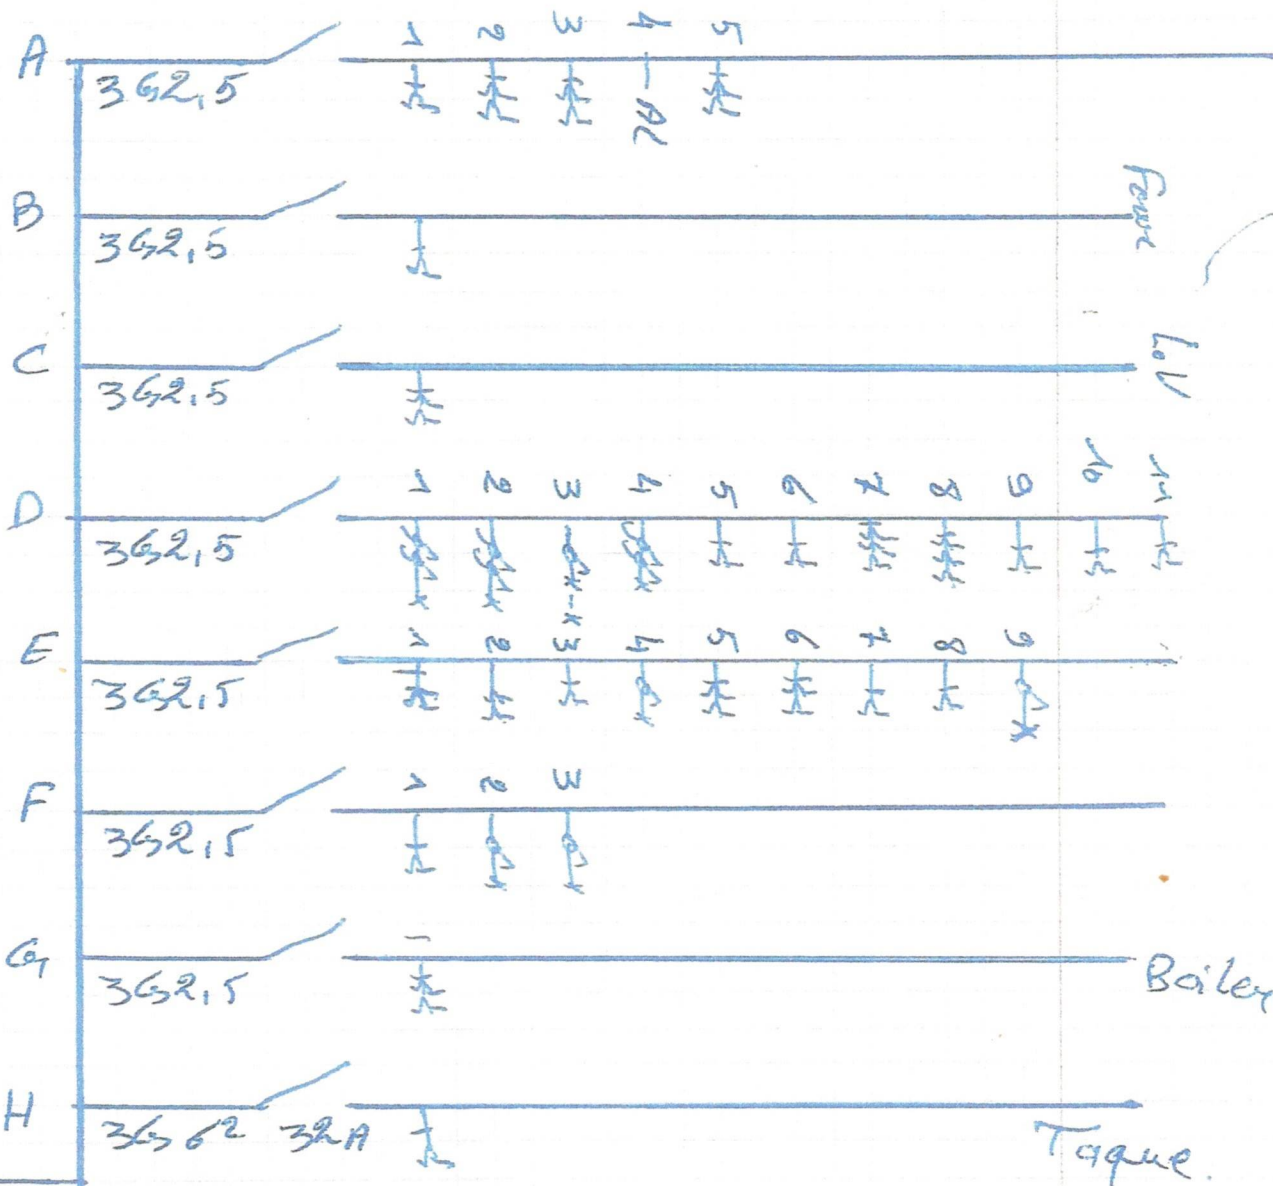

300mm
400mm
300mm
400mm



AV de la page 107
RANUR

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Namur / Luxembourg, Avenue du Sainfoin 25, 5590 CINEY
T: 083 21 35 27, E: btv.namur@btvcontrol.be

Rapport N°: 0438-160825-03 Date du contrôle : 25/08/2016
Extra date du contrôle

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION :

RUE DE LA GARE 7
5000 NAMUR

PROPRIETAIRE:

GAVAGE PATRICK

Adresse :

RUE DE MASBOURG 11
6950 NASSOGNE

DEMANDEUR:

GAVAGE PATRICK

Adresse :

RUE DE MASBOURG 11
6950 NASSOGNE

INSTALLATEUR:


GAVAGE PATRICK

Adresse :

RUE DE MASBOURG 11
6950 NASSOGNE

TVA ou CI :

Visualisation de l'installation

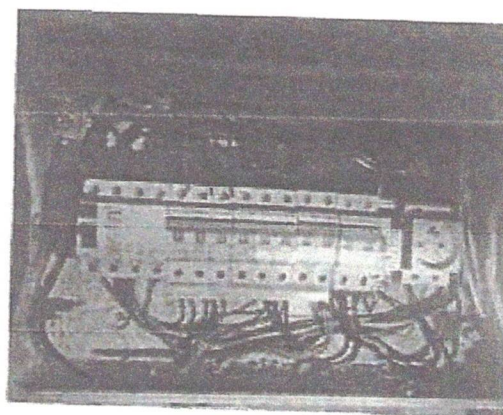

EAN :

Compteur n°

61 846 179

Index :

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Renforcement /	Type des locaux :	commun du bâtiment
Début travaux fondations :	Avant 01/10/81	Installation électrique :	Avant & Après
Raccordement tension :	3x230V	RGIE art. :	B6
Cable aliment. tableau princ. :	4 x 10 mm²	Protection raccordement :	25 A
Type électrode de terre :	Piquets	Inter. gén. : type :	4p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	4
Facteurs d'influences externes :		Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant : RGIE art. 271, Pres. distributeur
Type de contrôle : Visite de contrôle

MESURES:

RA: 12 Ohm RI tot 2 MOhm

DESCRIPTION:

Voir aussi schéma unifilaire et schéma de situation en annexe

INFRACTIONS CONSTATEES

Néant

NOTES

Néant

Conclusion

L'installation est conforme.

Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées.

Les schémas unifilaires et les schéma de situation ont été visés.

L'installation doit être vérifiée avant le 25.08.2041 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

L'agent-visiteur

0438 PASCAL CHENOT

pour le directeur,

CONTROLES EFFECTUES

Lors de visite de contrôle d'installations domestiques selon l'article 271.

- a) Le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
 - b) Le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prise de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition...
 - c) Le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
 - d) Le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
 - e) Le contrôle des boîtes de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
 - f) Le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principale et supplémentaire) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe
 - g) Le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
 - h) Le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Seul infractions, l'adéquation entre dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier d'installation électrique ;
- b) Il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- d) Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité des données d'organisation.

QUELLES MESURES A PRENDRE SI VOTRE INSTALLATION EST CONFORME

ETAPE 1

Lisez soigneusement ce Procès-Verbal et faites attention aux notes éventuelles.

ETAPE 2


Lors d'extensions importantes de l'installation, faites reconstruire de nouveau.

ETAPE 3


Un recontrôle de l'installation est obligatoire avant 25.08.2041.

ETAPE 4

BTV Namur / Luxembourg reste à votre service pour les contrôles nécessaires.

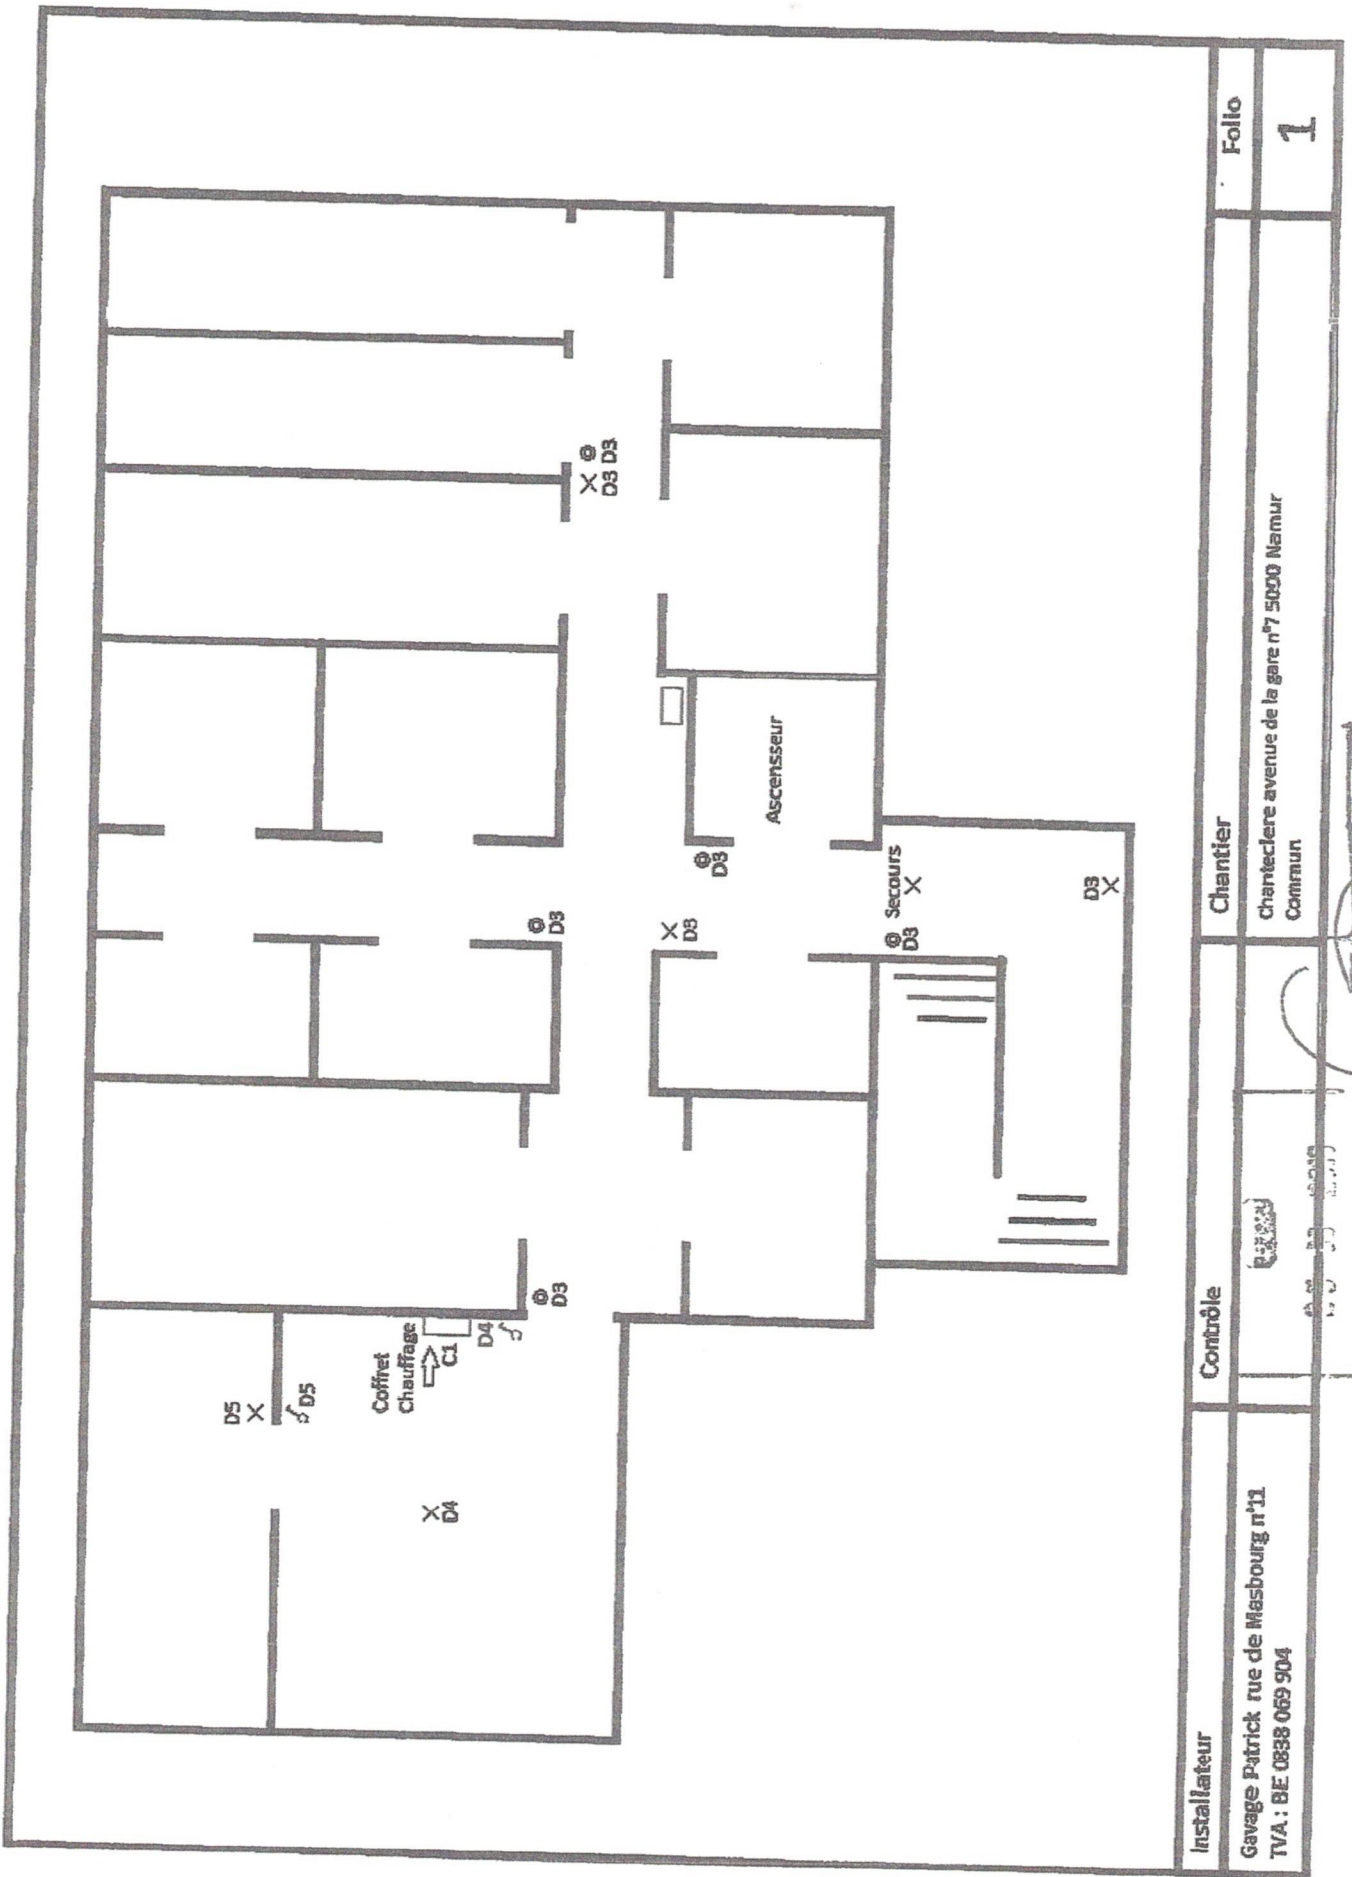


Installateur	Contrôle	Chantier	Folio
Gavage Patrick rue de Masbourg n°11 TVA : BE 0888 069 904	6 9 20.03.2013	Chantier avenue de la gare n°7 5000 Namur commun	2

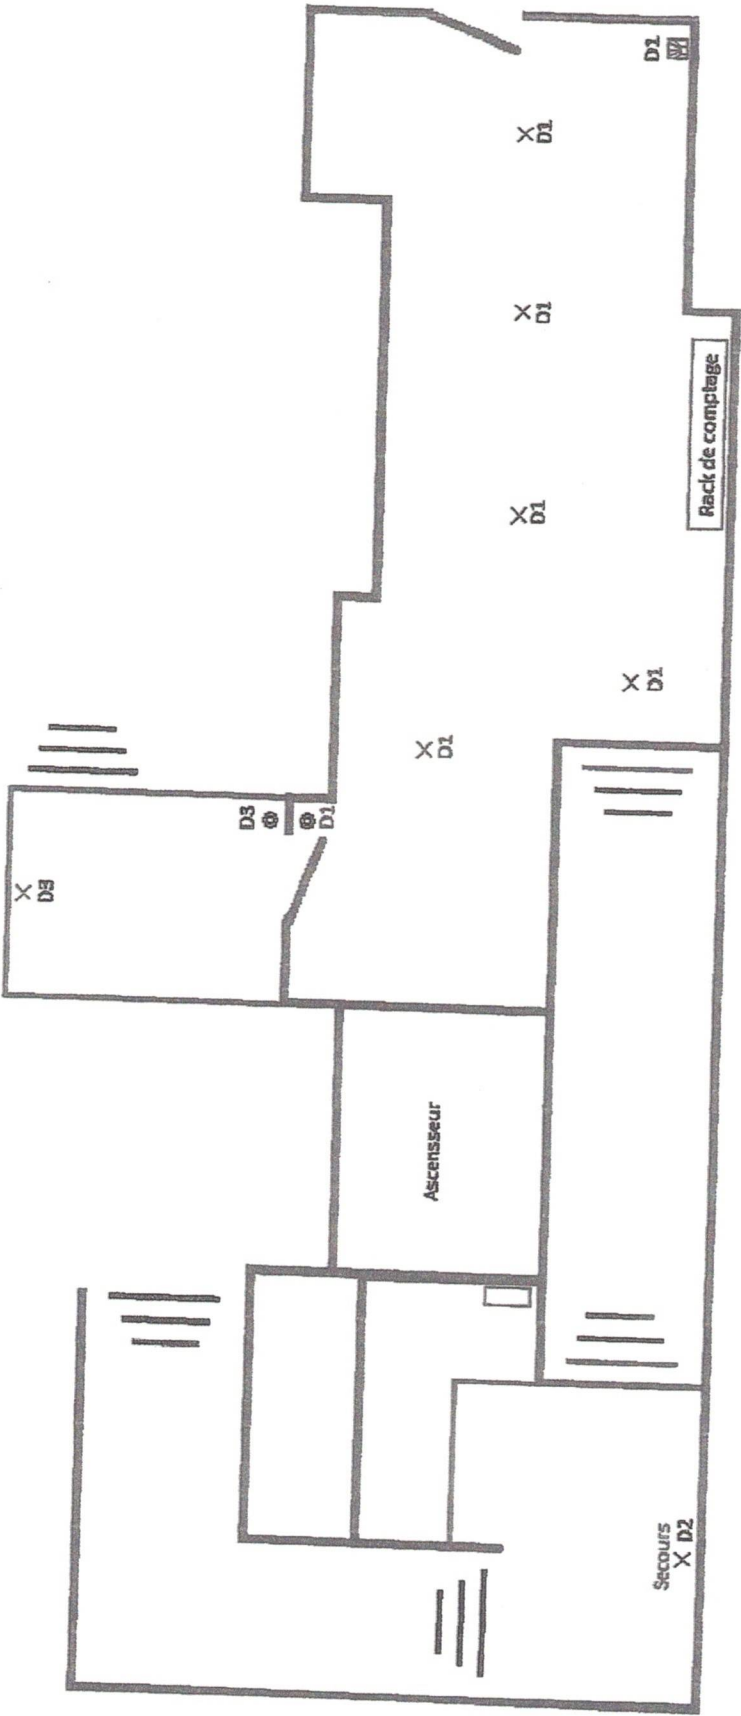

The floor plan shows a building layout with the following components:


- Top Left Room:** Contains a label 'X D9' and a set of three horizontal lines.
- Top Right Room:** Contains a label 'X D1' and a set of three horizontal lines.
- Central Room:** Contains a label 'X D1' and a set of three horizontal lines.
- Bottom Left Room:** Contains a label 'X D1' and a set of three horizontal lines.
- Bottom Center Room:** Labeled 'Ascenseur' (Elevator).
- Bottom Right Room:** Labeled 'Secours X D2' and contains a set of three horizontal lines.
- Far Right Room:** Labeled 'Rack de comptage' (Billing rack) and contains a label 'X D1' and a set of three horizontal lines.
- Entrance/Corridor:** Features a door labeled 'D3' and a door labeled 'D1'.

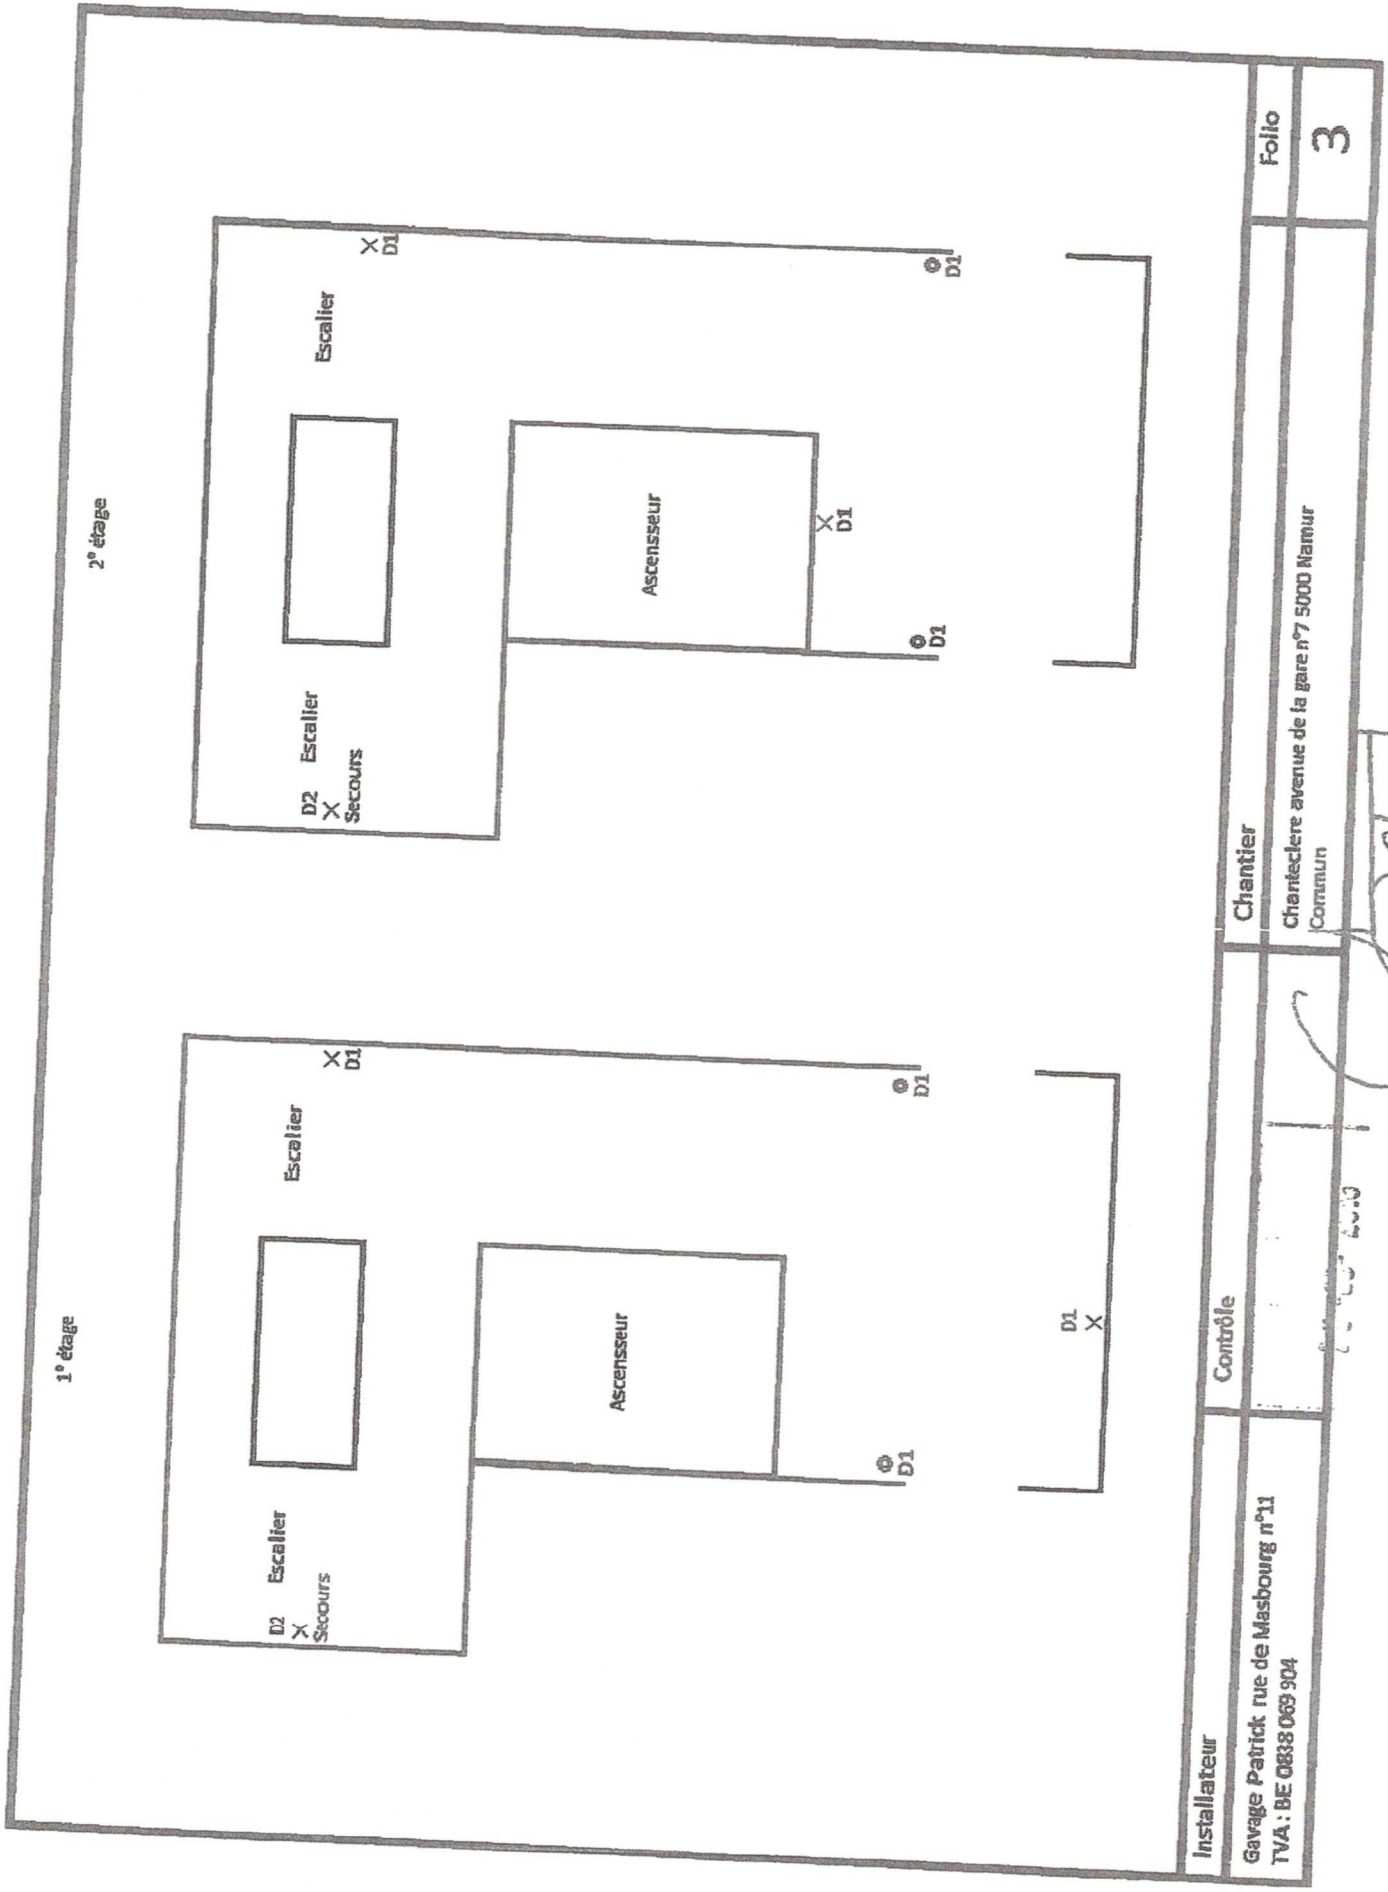

Installateur	Contrôle	Chantier	Folio
Gavage Patrick rue de Masbourg n°11 TVA : BE 0838 069 904		Chanteclere avenue de la gare n°7 5000 Namur Commun	3

2003-2010


[Handwritten signature]

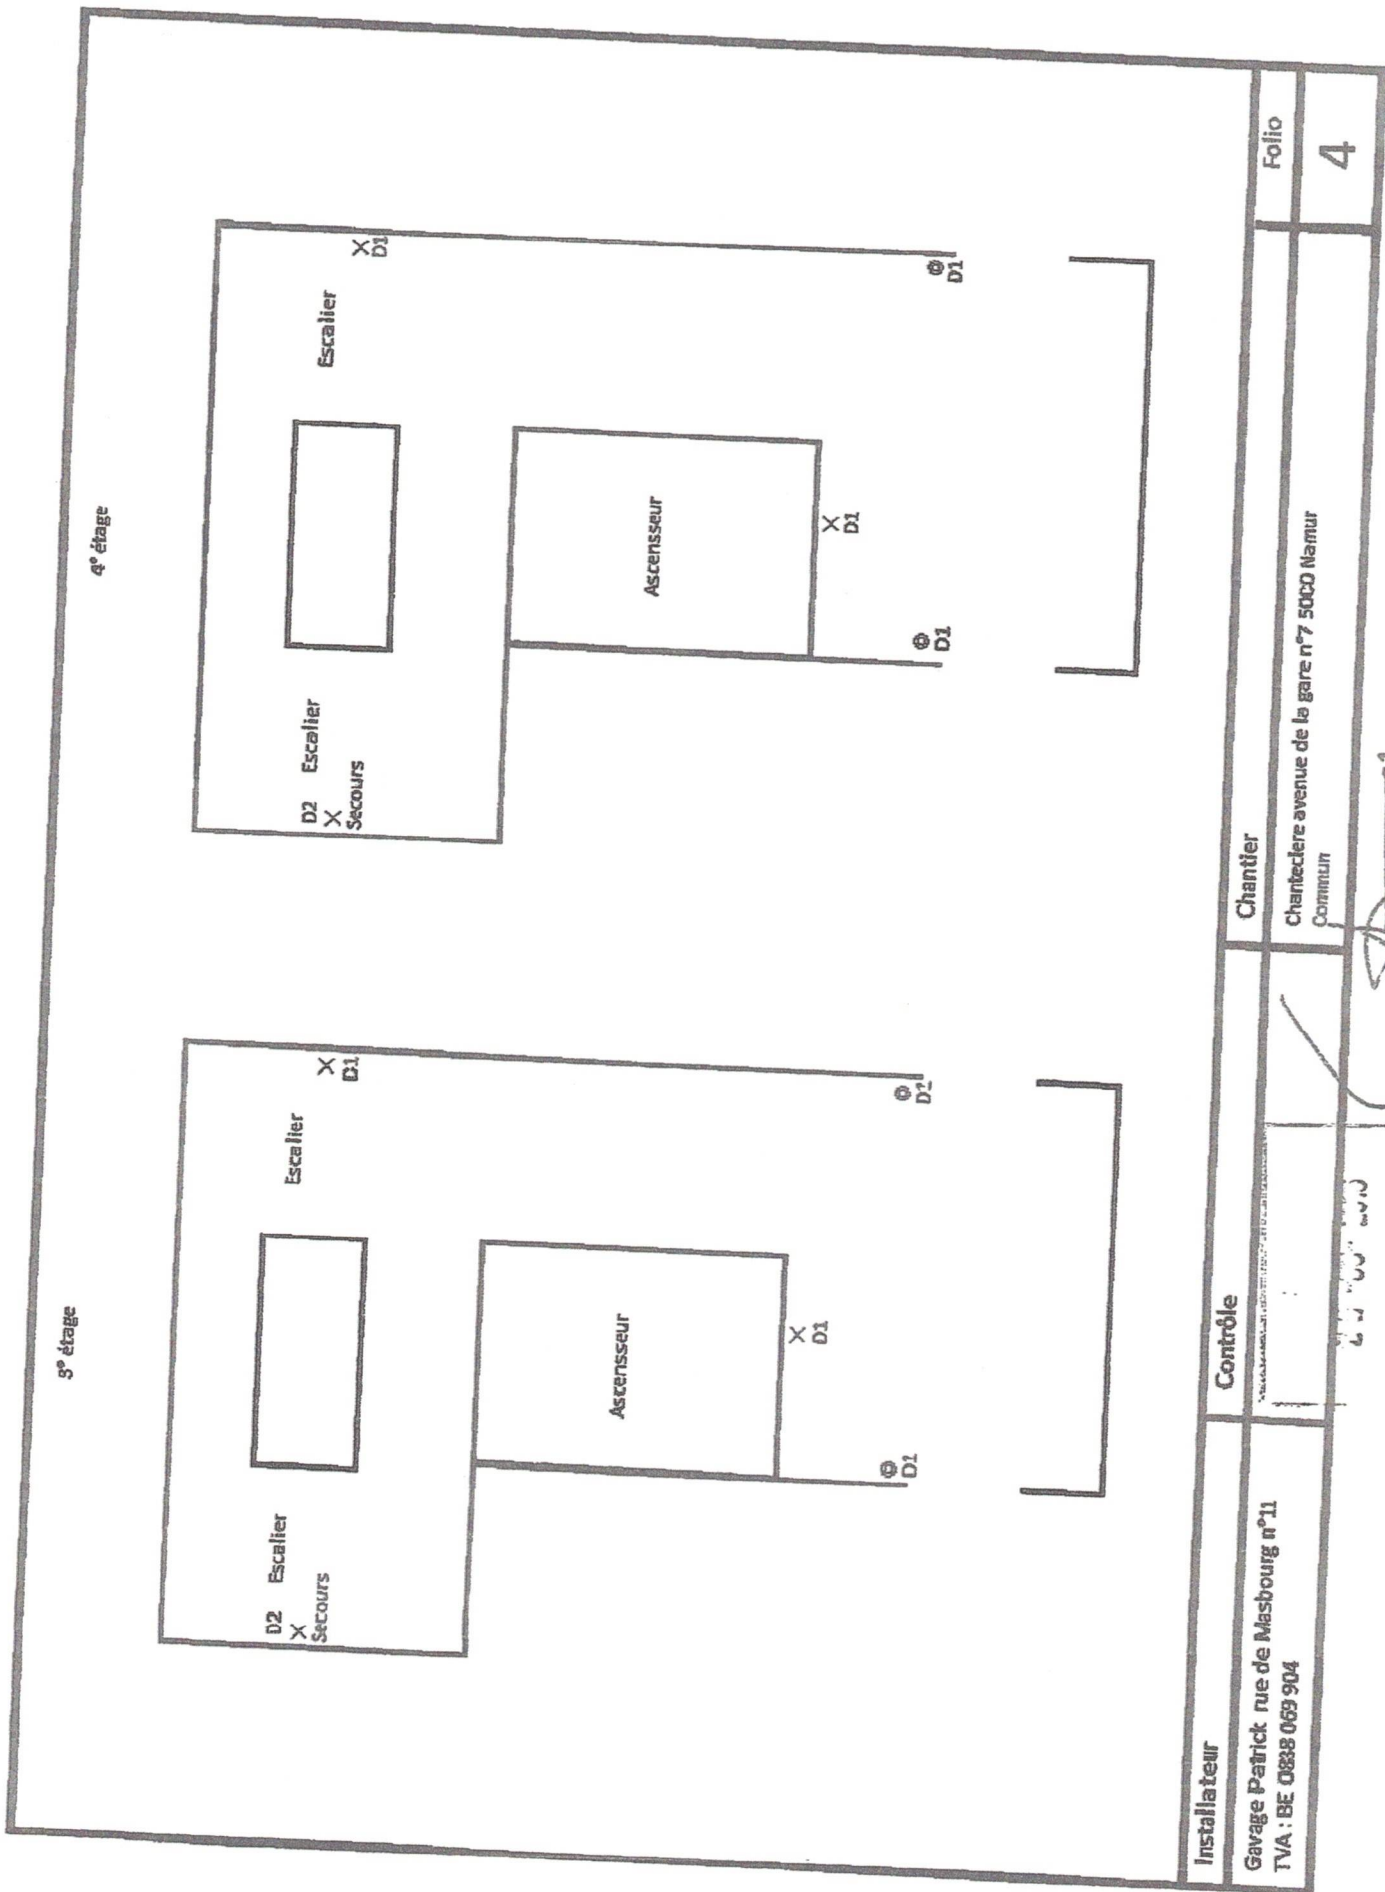


Installateur	Contrôle	Chantier	Folio
Gavage Patrick rue de Masbourg n°11 TVA : BE 0838 069 904		Chantier avenue de la gare n°7 5000 Namur Commun	4

[Handwritten signature]

5^e étage

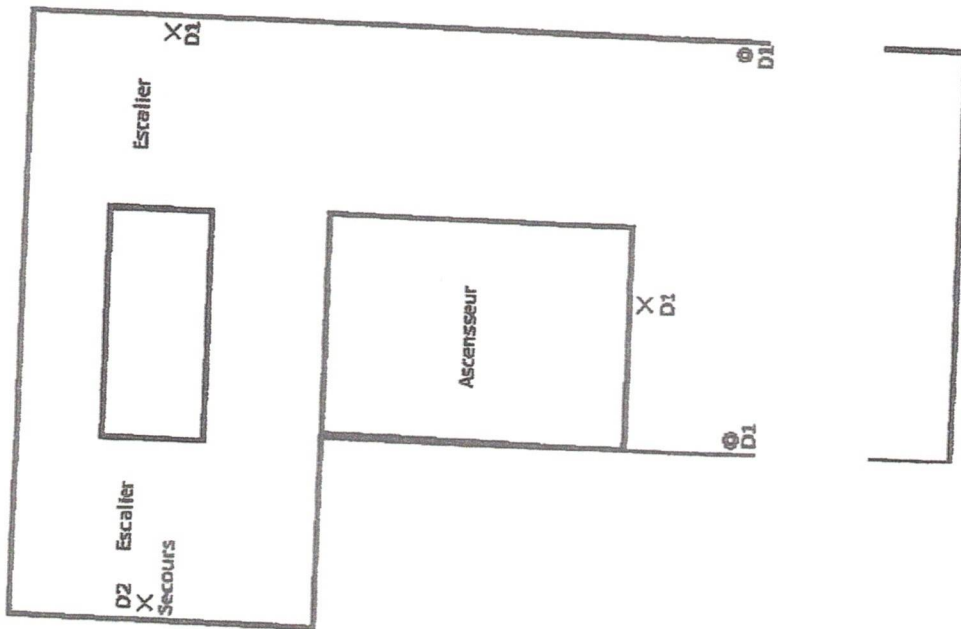

6^e étage

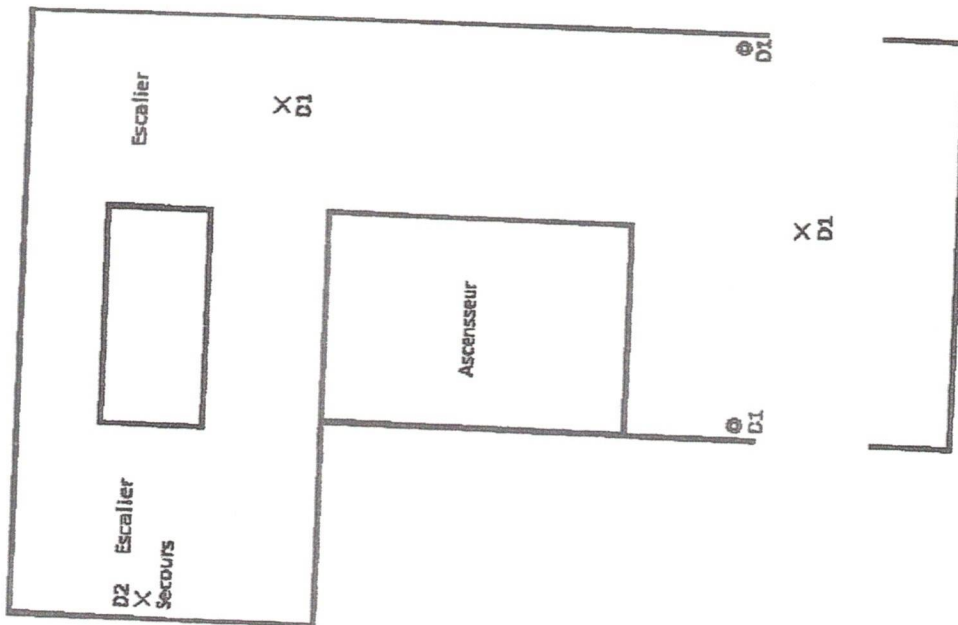

Installateur

Gavage Patrick rue de Masbourg n°11
TVA : BE 0838 069 904


Contrôle

Client

Chantier
Chantier avenue de la gare n°7 5000 Namur
Commun

Folio

5

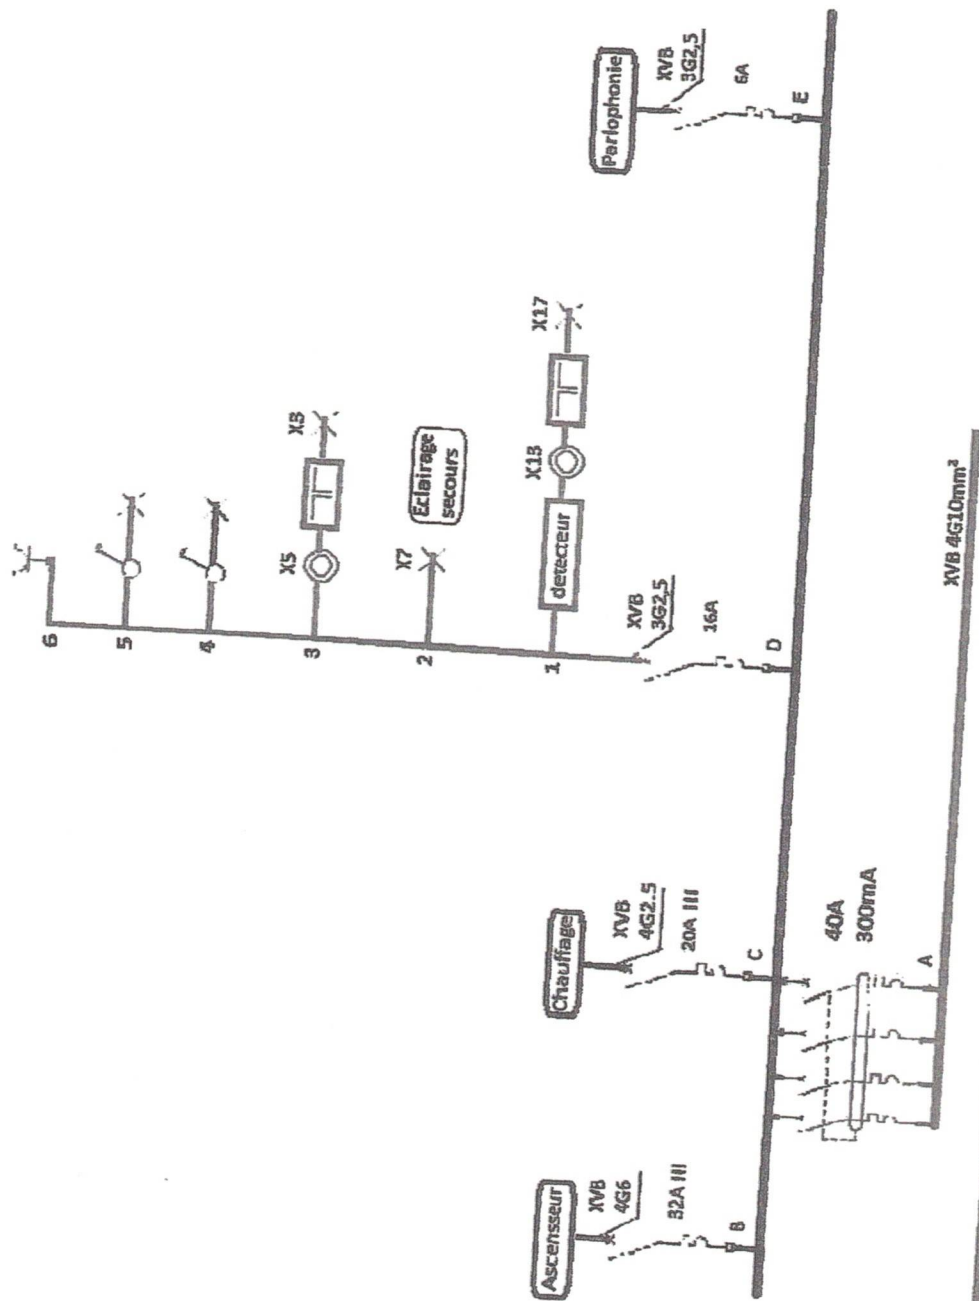

Installateur

Gavage Patrick rue de Masbourg n°11
TVA : BE 0838 069 904

Contrôle

25-08-2016

Chantier

Chantier avenue de la gare n°7 5000 Namur
Commun

Folio

6
