



Erkend door de federale overheid

Keuringsrapport

Elektrische installatie




Rapportnummer: RAP.1002.003.8444815.REV0

Pagina 1 van 1

Adres- en onderzoeksgegevens

Adres installatie Withoeflei 31, 2920 Kalmthout
 Naam eigenaar
 Adres eigenaar
 Type object eengezinswoning
 EAN-code niet beschikbaar
 Aard installatie bestaand
 Doel onderzoek verkoop wooneenheid

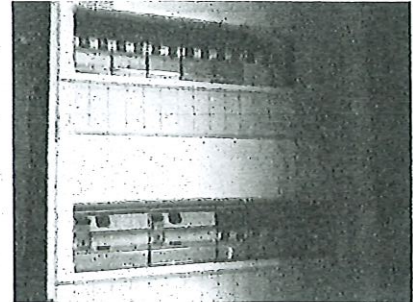

Het onderzoek is verricht op 7/09/2015 volgens artikel 271 en 276bis van het AREI en onze procedure(s) TP1.

Installatiegegevens

Spanning (V)	230 (1f+N)	Gegevens hoofdbeveiliging (A)	40
Type elektrode	pen	Waarde differentiële schakelaar(s) (mA)	300 & 30
Ø voedingsleiding (mm ²)	10	Aantal verdeelborden	1
Waarde hoofdschakelaar (A)	40	Aantal stroombanen per verdeelbord	9

Metingen

RA / ZS (Ω)	niet meetbaar /	ΔI differentiële schakelaar(s) (mA)	goed
Continuïteitsmeting	niet goed	Isolati weerstand van de installatie (MΩ)	>0,5

Inbreuken

1. Het aardingscontact van één of meerdere contactdozen is niet verbonden met de beschermingsleiding (art. 86.3 van het AREI). Oa 2x in de woonkamer en in de slaapkamer
2. In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht of de onderbreker is niet toegankelijk of niet te openen. Hierdoor kan de aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (art. 28, 70.05, 15, 86.01).
3. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).
4. De contactdozen zijn aangebracht op een onvoldoende hoogte (< 25 cm vanaf de grond in natte ruimten en/of < 15 cm vanaf de grond in gewone ruimten) (art. 249.01 van het AREI). Oa 1x stopcontact in de vloer van slaapkamer dient verwijderd te worden
5. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).

ADS: Automatische differentiële schakelaar

Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt. Indien tijdens de keuring de schema's ontbreken, kunnen bij een volgend controlebezoek bijkomende inbreuken worden vastgesteld.

Opmerkingen

(Ver)bouwjaar: na okt 1981

Besluit

De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.

In geval van verkoop van een woonéénheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd, door een erkend controleorganisme naar keuze, uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.

De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.

Voor de directeur, op 7/9/2015

Naam agentonderzoeker: Mohamed Rahmouni

Handtekening:

Raadadviezen

1. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
2. In het dossier dient elke wijziging aan de elektrische installatie vermeld te worden.
3. Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie, te worden gewaarschuwd.
4. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

2016

18 januari 2016
