

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 24/11/2020 Inspecteur: Michael Schnurrer Mentor: Installateur: Elektriciteitswerken Noppe BVBA

ID-label: woning

B.T.W. nr.: BE 887 577 021

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 Serie Nr.: 18460193

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 441761

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Lage Kaart
Huisnummer 71
Busnummer
Postcode 2930
Gemeente Brasschaat
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Lage Kaart
Huisnummer 71
Busnummer
Postcode 2930
Gemeente Brasschaat
Land België

Naam contactpersoon Elektriciteitswerken Noppe BVBA
Telefoon 03 685 22 85
Gsm nr. (SMS)

Installateur

Naam Elektriciteitswerken Noppe BVBA
BTW nr. BE 887 577 021
Telefoonnummer 03 685 22 85
E-mail alexander@ewn.be

Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: 6839770

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS Spanning: 3N400V Meter / bord verbinding: 10 mm² Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 3 Aantal kringen: 29+18+15 Isolatie: 1,232 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders RE: 5,745 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{st}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	55	OK	OK
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	6	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	15	OK	OK
100	80		22,5kA2s (3000A)	A	7	-	-

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie bijlage	-	-	-	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	☒ OK ☐ NOK	Directe aanraking	☒ OK ☐ NOK	Indirecte aanraking	☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen	☒ OK ☐ NOK	Correcte schema's	☒ OK ☐ NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	☐
Equipotentiale verbindingen	☒ OK ☐ NOK	niet van toepassing	☐ in afwachting		
Continuïteit	☒ OK ☐ NOK	Verlichting / toestellen	☒ OK ☐ NOK ☐ NVT		



OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O12 De elektrische installatie staat niet onder spanning. De goede werking van de differentieels kon niet getest worden. BORD NACHT

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

KWh-teller nacht: 56202544

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 24/11/2045

- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:
- ☐ **De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1.** Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 17

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Michael Schnurrer

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90



BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:


Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 24/11/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

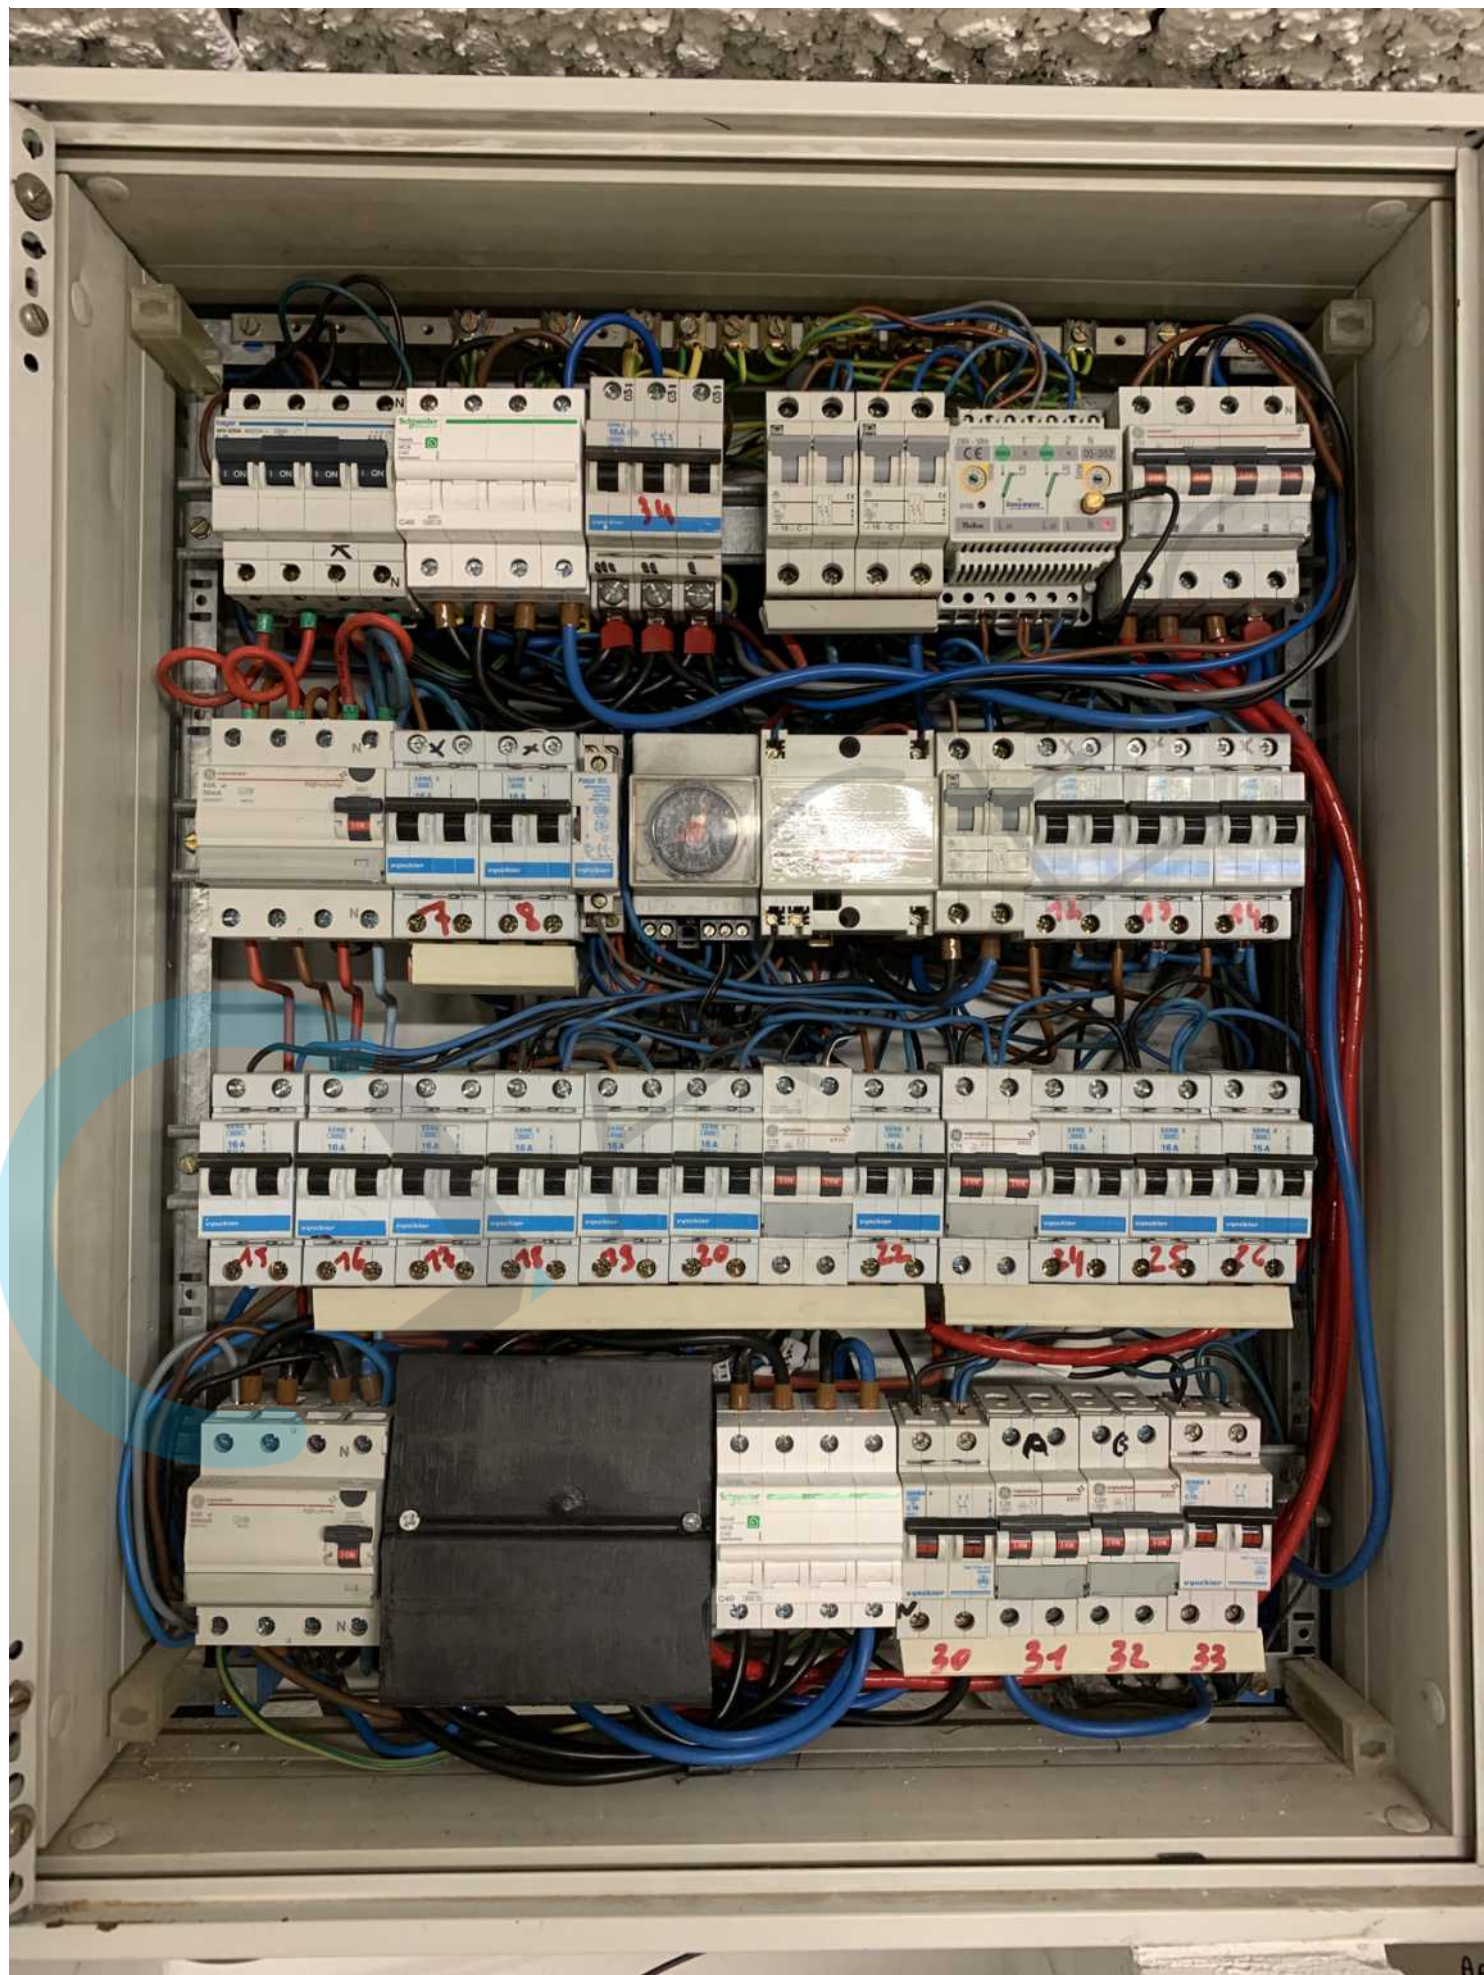


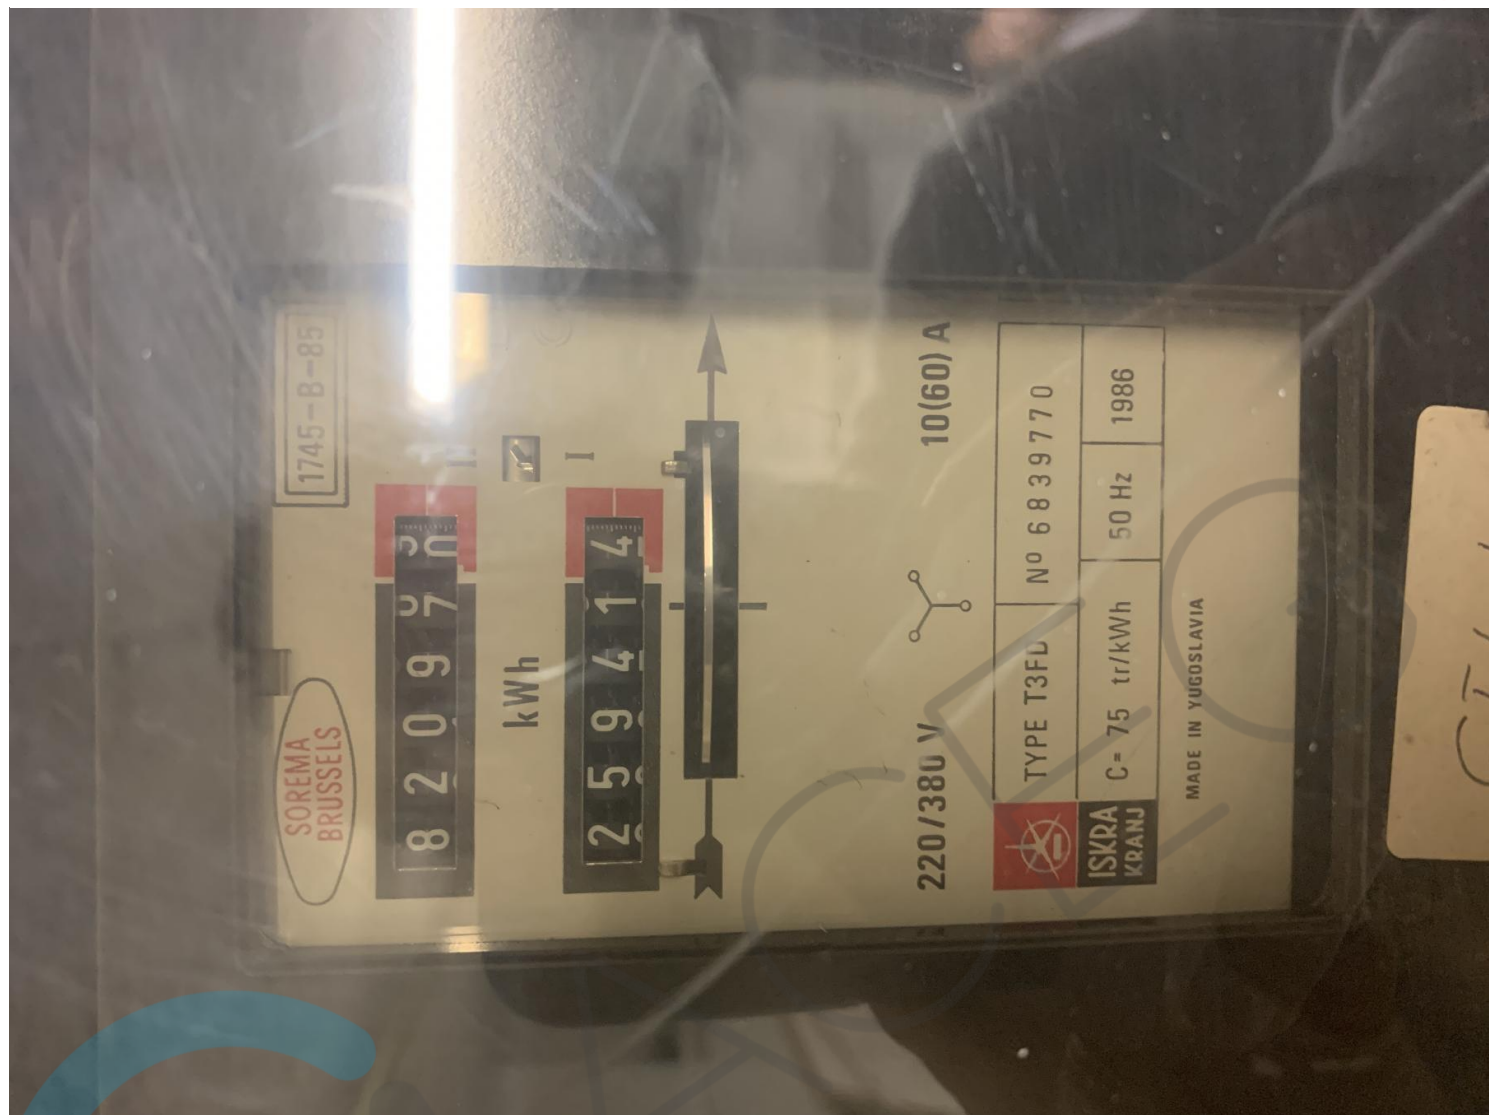


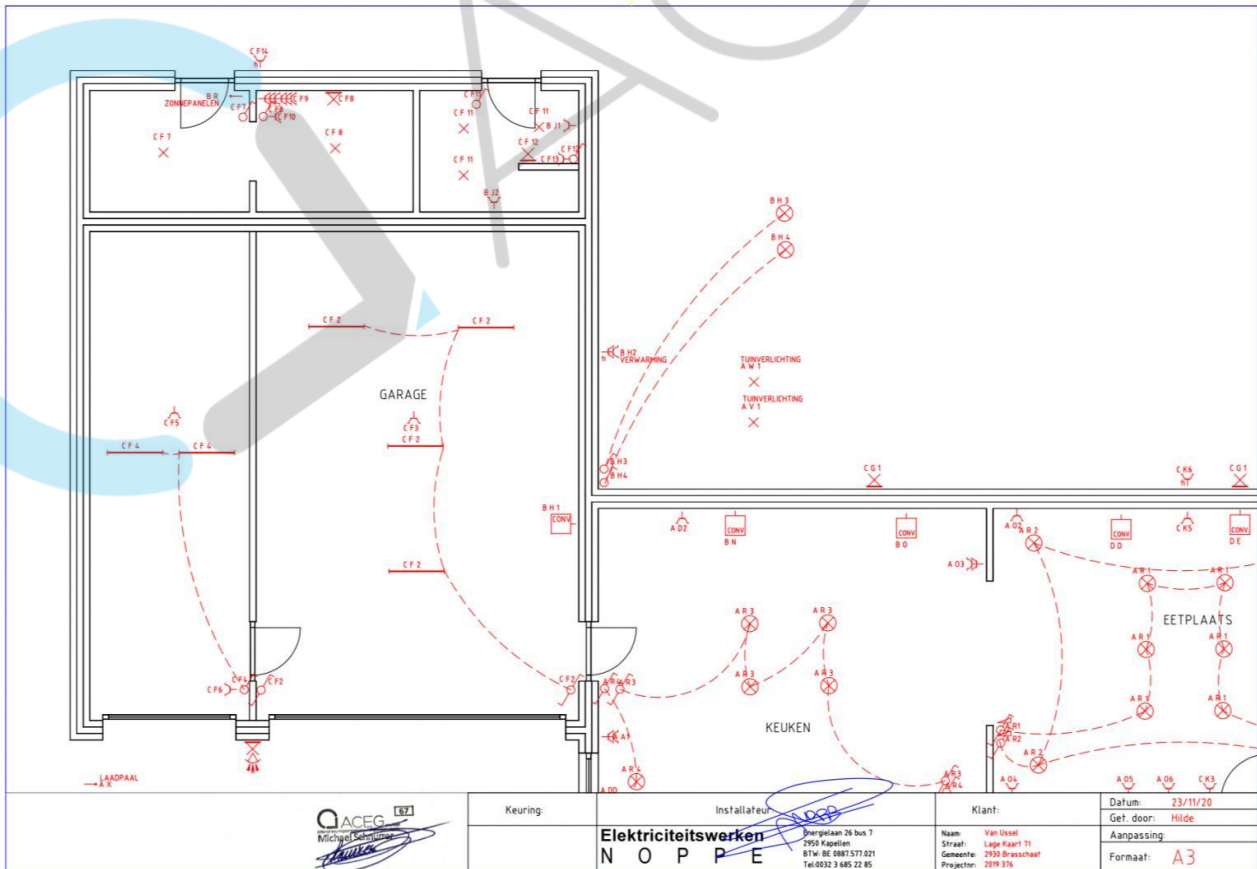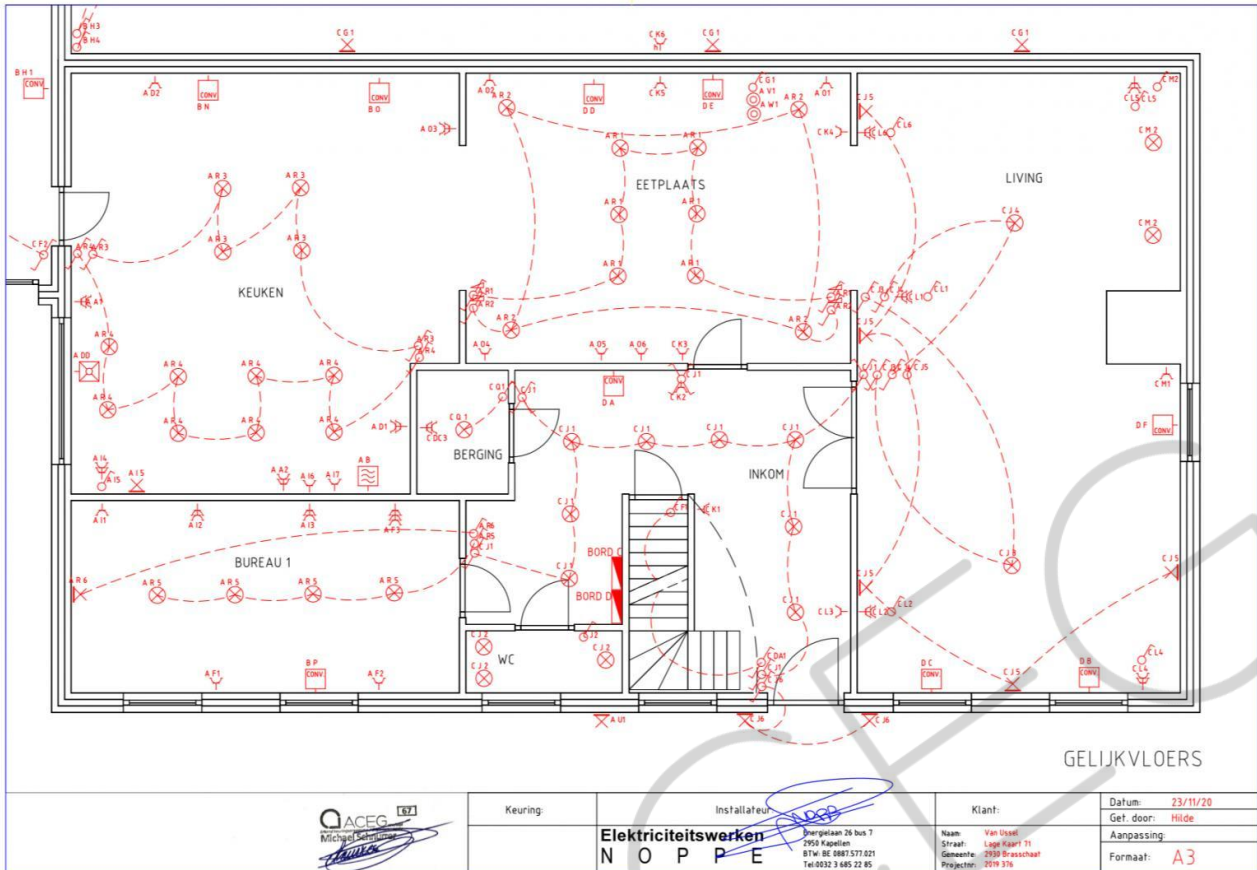


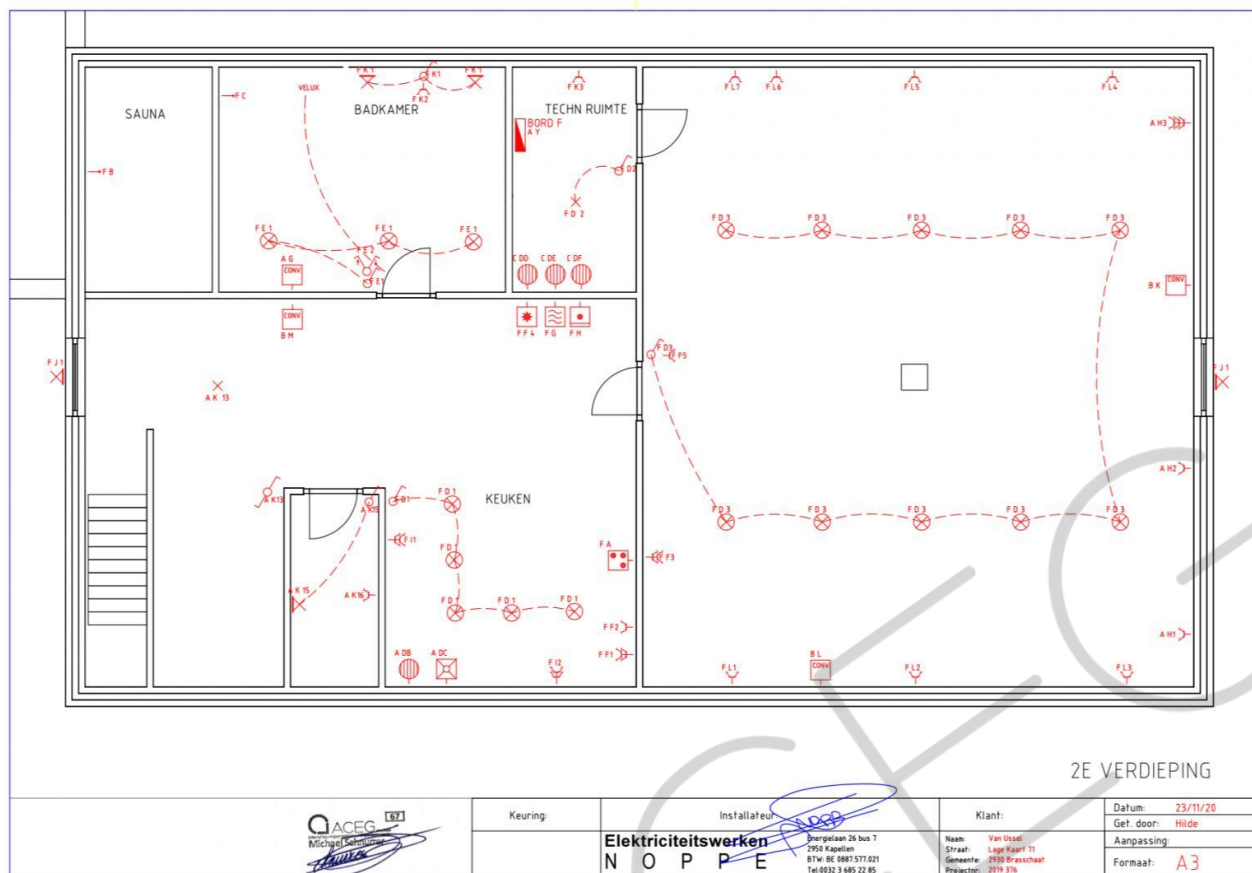

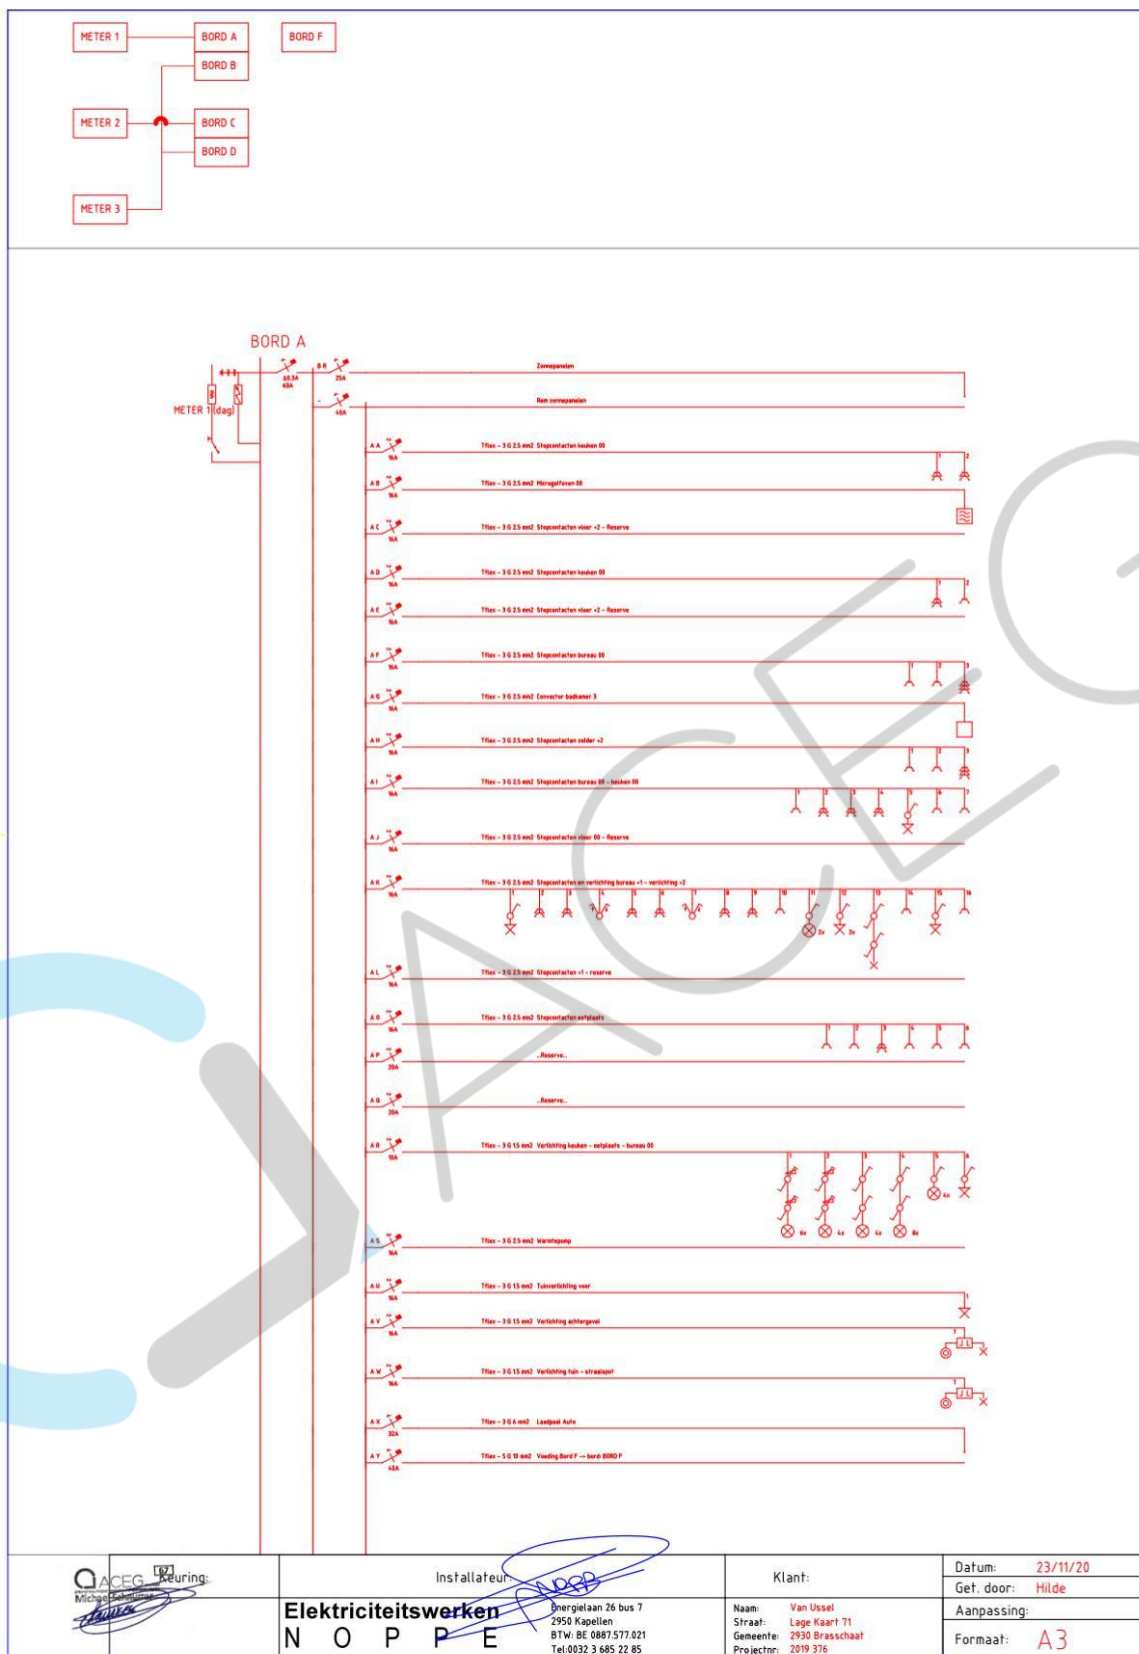

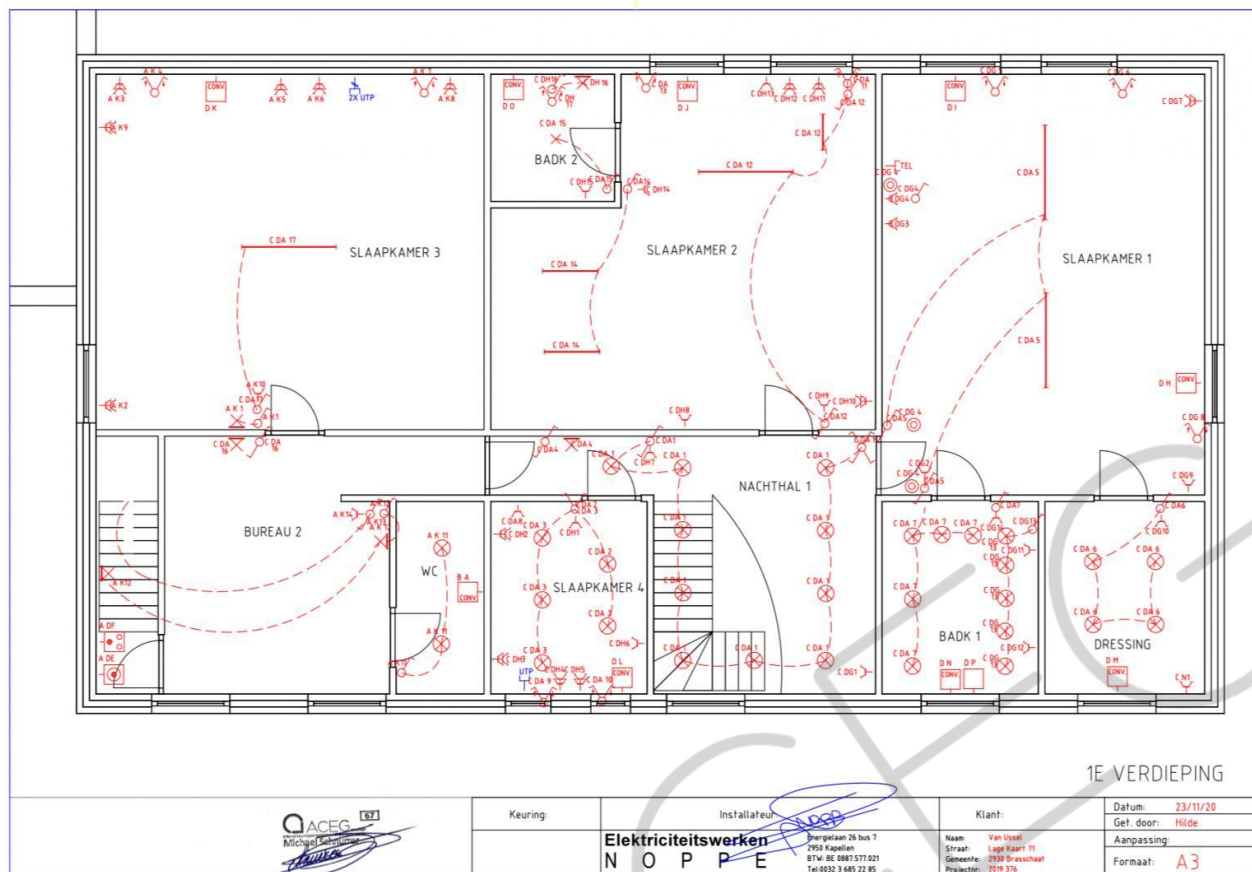

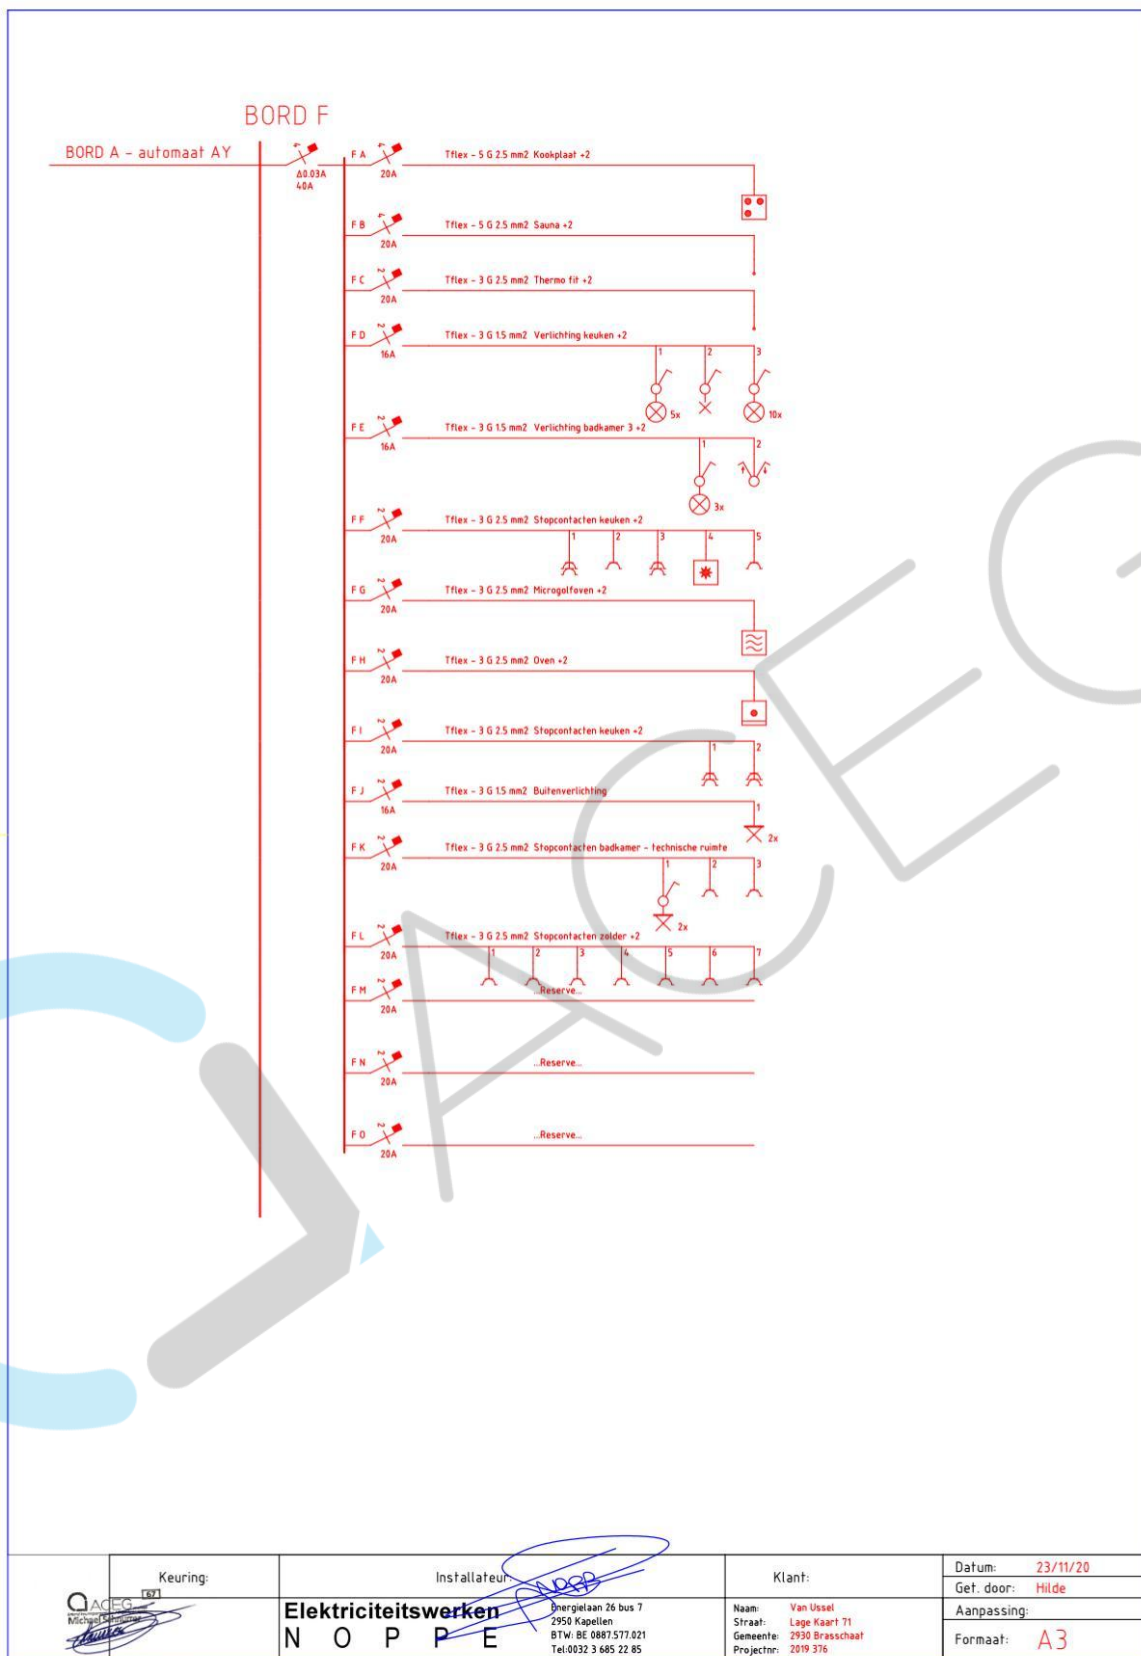

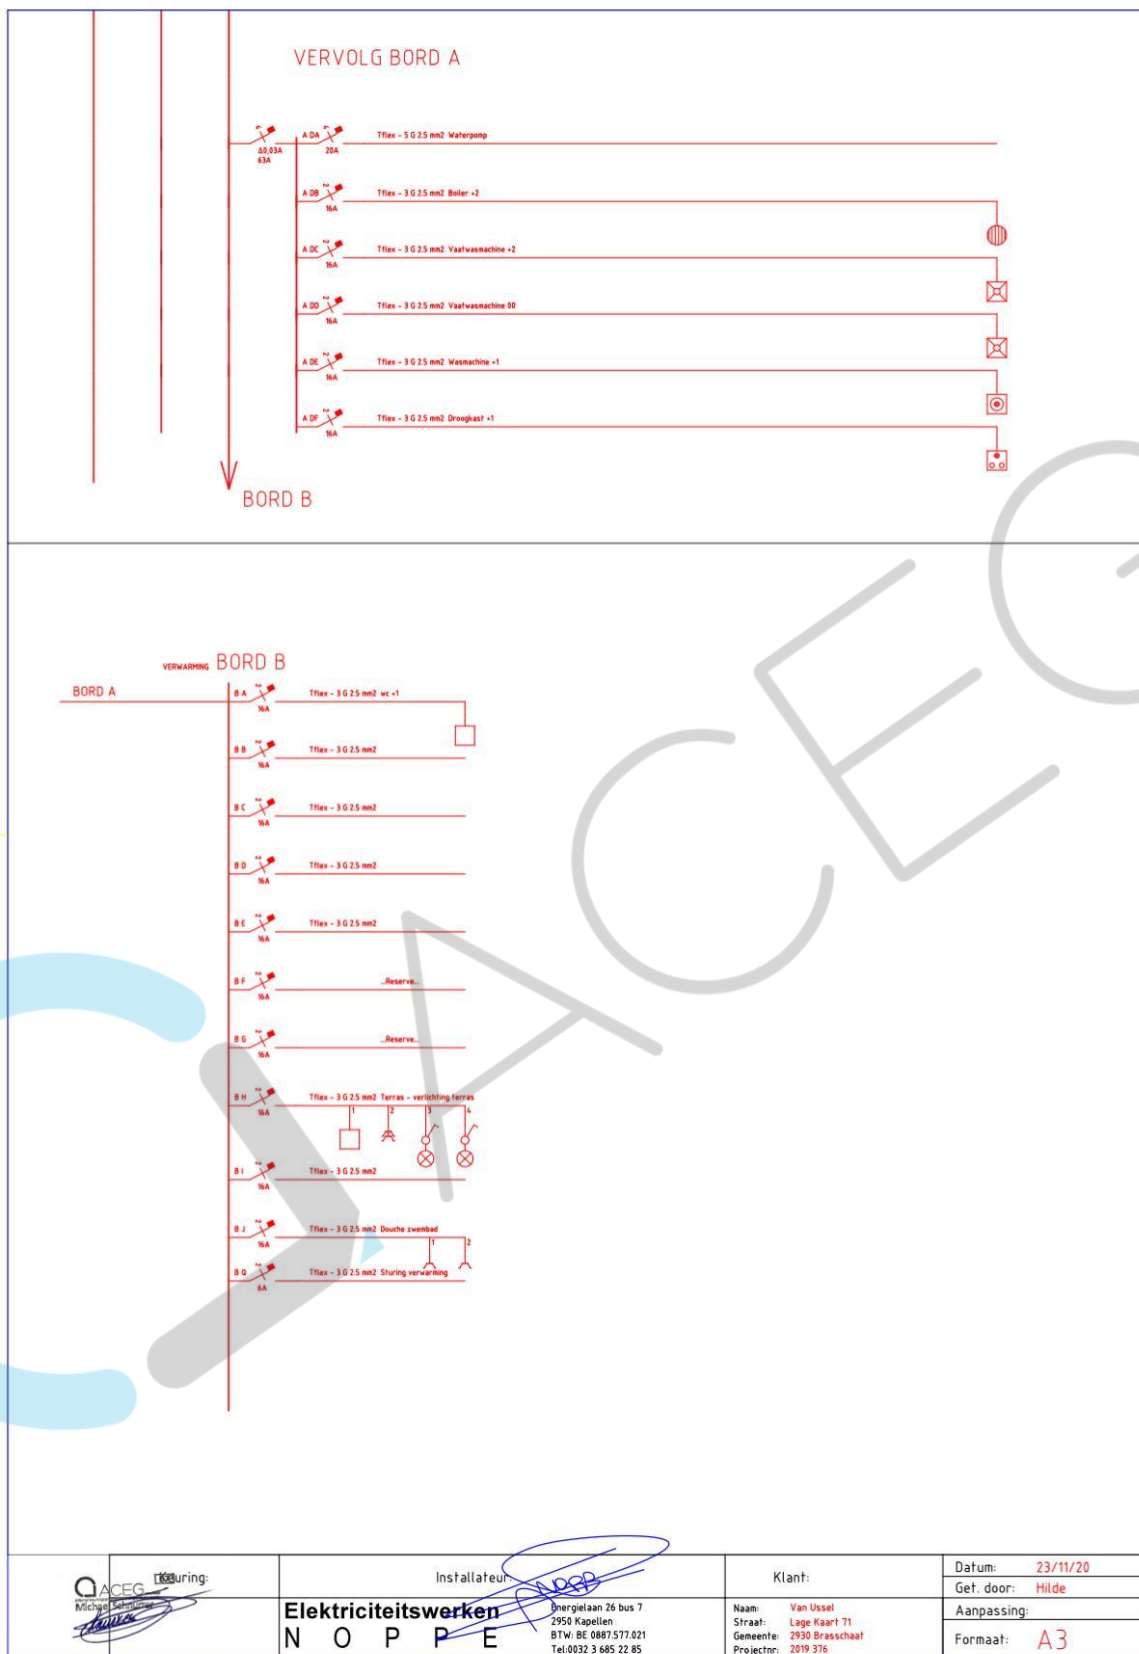

	Keuring:	Installateur:	Klant:	Datum: 23/11/20
	Elektriciteitswerken N O P P E		Naam: Van Iersel Straat: Laga Kaart 71 Gemeente: 3900 Brunschoten Projectnr: 2019 316	Get. door: Hilde Aanpassing: Formaat: A3



