

☒ Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
☐ Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
☐ Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
☐ Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11
Tel: +32 2 674 57 11
Tel: +32 3 221 86 11
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be
brussels@vincotte.be
antwerpen@vincotte.be
gembloux@vincotte.be

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE
Verantwoordelijke uitvoering van het werk :
Installatie :
Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam : <u>Kris Baelinck</u>	Naam, voornaam :
Ident. Kaart nr. :	Adres :
BTW nr.: BE <u>0491233420</u>	Post nr. + Stad :
	Tel. : / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")

0

☒ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)	☒ Wooneenheid	☐ Vóór 1/10/1981
☐ Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)	☐ Werkeenheid	☐ Tussen 1/10/1981 & 1/06/2020
☐ Controlebezoek (6.5.)	☐ Werfinstallatie	☒ Vanaf 1/06/2020
☐ Controlebezoek verzwaring aansluiting oude installatie (8.4.1.)	☐ Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel	
☐ Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)	☐ Technische lokalen van een residentieel geheel	
☐ Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)	☐ Gedecentraliseerde productie-installatie	
Afwijkingen Deel 8:	☐ Toegepast ☒ Niet toegepast	
	☐ Andere installatie:	

Algemene gegevens elektrische installatie :
☐ Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. Datum

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld ☒ kWh meter niet geplaatst
Naam verd.:	kWh meter nr.: meterstand dag : nacht :	☐ kWh excl. nacht meter :
	Bescherming aansluiting (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	nr.: meterstand :
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ mono 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode: ☐
	Maximale nominale stroom (A): ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord: <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type: <u>1xVB</u>	Aardverbindingssyst.: ☒ TT ☐
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u> Aantal eindstroombanen: <u>12</u>
☒ Zie bijlage(n)		

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Verplaatsb. materieel	☐ Vast materieel	☒ >/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand: <u>7,20</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau: <u>1,47</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Continuïteit (equipot., PE)	☒ Test diff.		
Alg. diff.: ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden				Schema's en plannen getekend: ☒ Ja ☐ Nee		

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken	
Nieuwe installatie	
☒ Nihil	
Vastgestelde inbreuken	
Bestaande installatie	
☒ Nihil	
Opmerkingen	<u>Reken, bodem en veiligheid nog af te werken</u>
☐ Nihil	

Besluit :
☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).
☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór
17/02/2021
☒ door hetzelfde erkend organisme (*).

Agent bezoeker :

Naam : Selby Agent nr.: 5439 Datum: 17/02/2022

Bijlage(n): ☐ Situatieplan(nen): 2 ☐ Eëndraadsschema('s): 1
Voor de directeur generaal : Handtekening


- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.
(*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

darmen

Tamborenstraat 34, 9290 Berlare



Oplouw verdeelbord + coderingen

2P	2P	2P	2P	2P	2P	5	5	5	5	5	RES.
20A	20A	16A	16A	16A	 BEL TRANS. O	1	2	3	4	5	
J	K	L	M	N	O	1P	1P	1P	1P	1P	

2P diff 40A 300mA	2P diff 40A 30mA	2P 25A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A	2P 20A
A	B	C	D	E	F	G	H	I

A Differentieel 40A 300mA 2P

B Differentieel 40A 30mA 2P

C Fuis / vuur voeding.

D Stopc. keuken

E Stopc. keuken

F Stopc. wasplaats + CV + stopc. keuken

G Stopc. wasplaats

H Stopc. hring + berging + wasplaats.

I Stopc. berging, hall, eetruimte + hring.

J Stopc. boven slaapkamers.

K Stopc. boven slaapkamers gang.

L Verlichting slaapkamers, WC boven en badkamer boven.

M Verlichting van impulsrelais 1 t.e.m. 5. + voeding beltransfo O.

N Buitenverlichting, verlichting wasplaats, WC en berging.

O Beltransfo.


1 Impulsrelais hall bereiden.

2 Impulsrelais hall boven.


3 Impulsrelais lamp keuken.

4 Impulsrelais lamp hring.

5 Impulsrelais lampen hring + tuin.

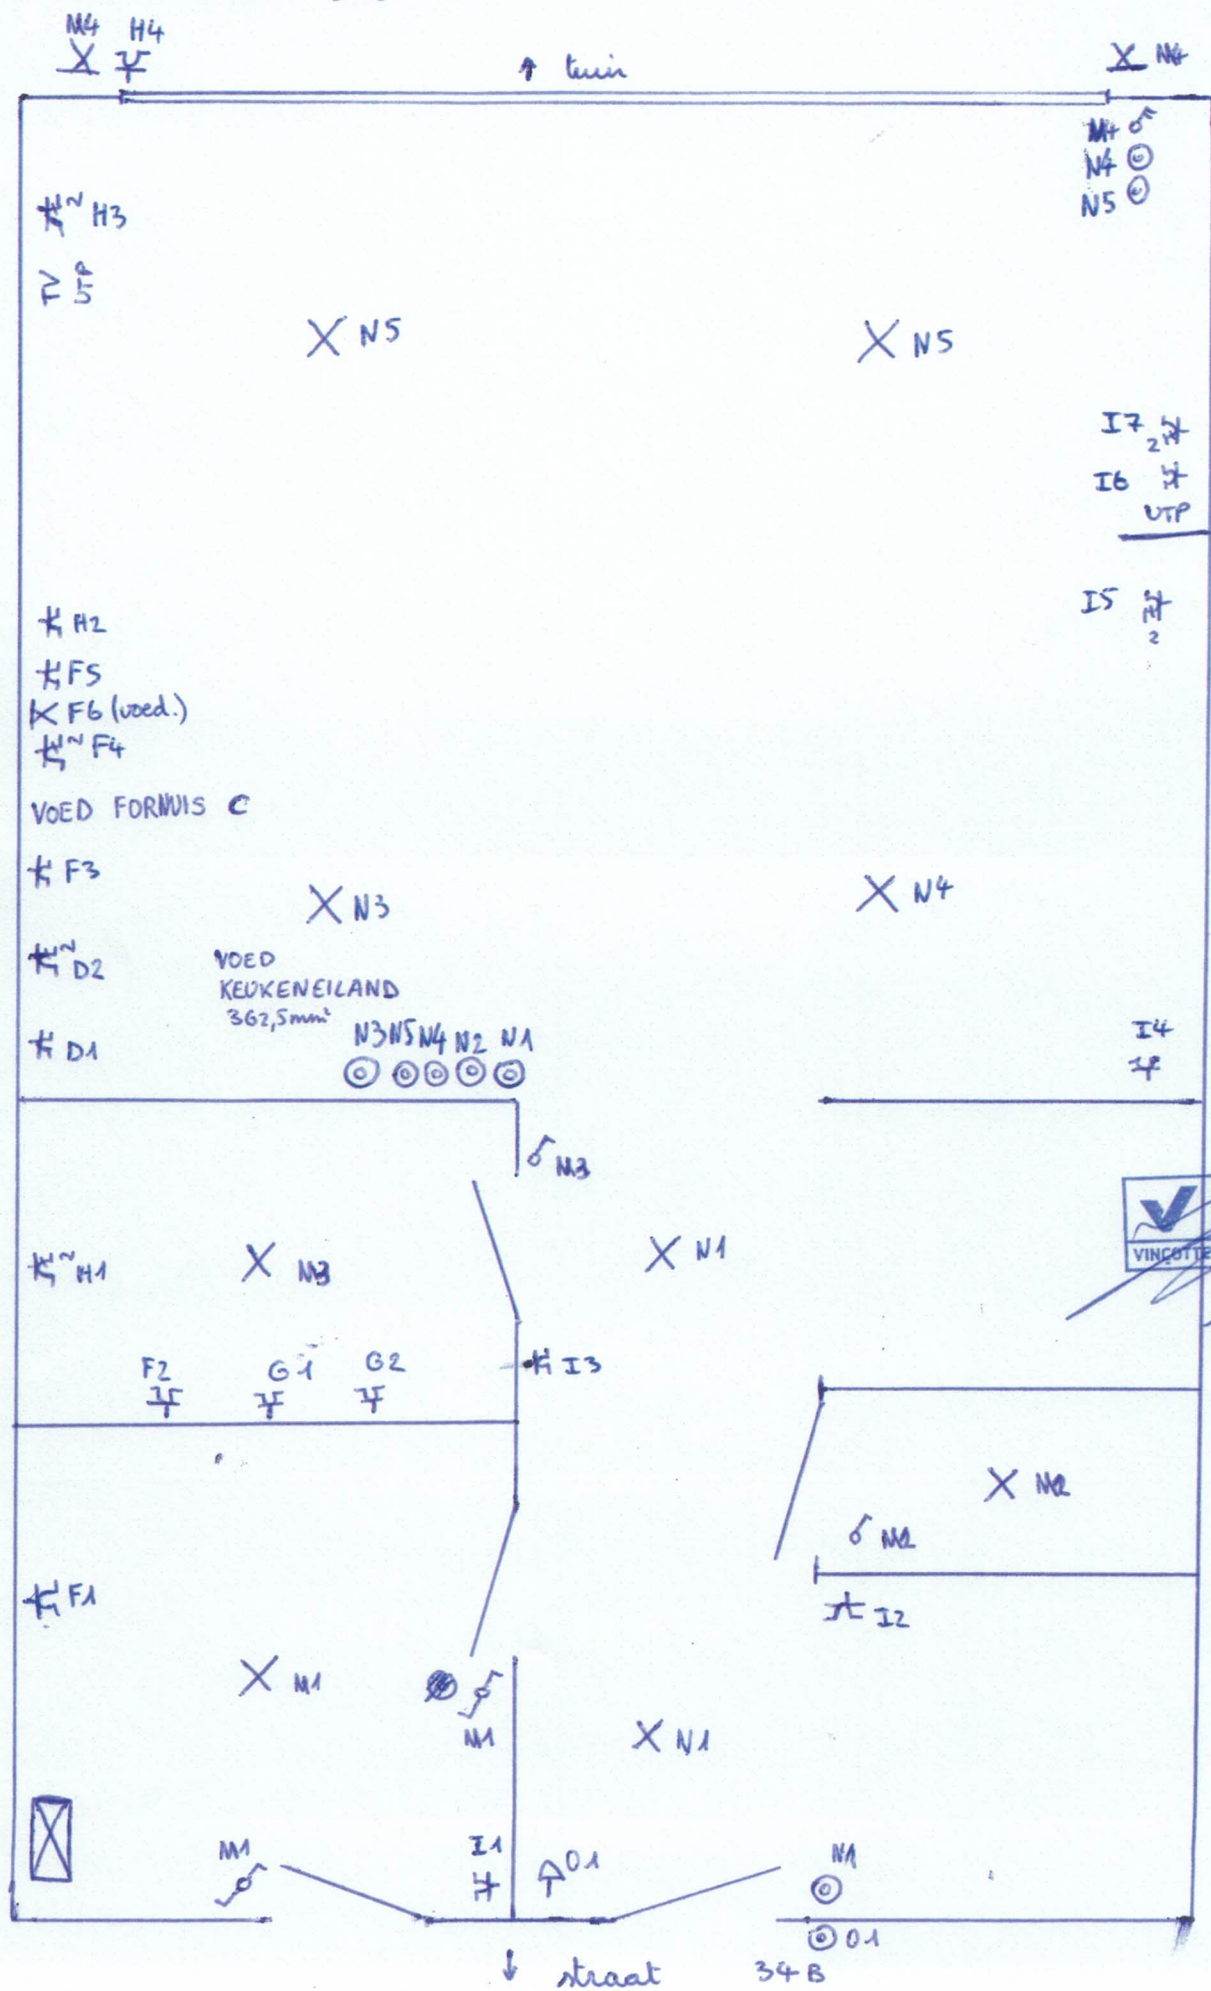


Tamboerkenstraat 34, 9290 Berlare
Situatieschema 1^{ste} verdiep + kabel naar zolder



(1 lamp) L7

↑ tuin

1 verdieping 362,5 mm² voor zolder.

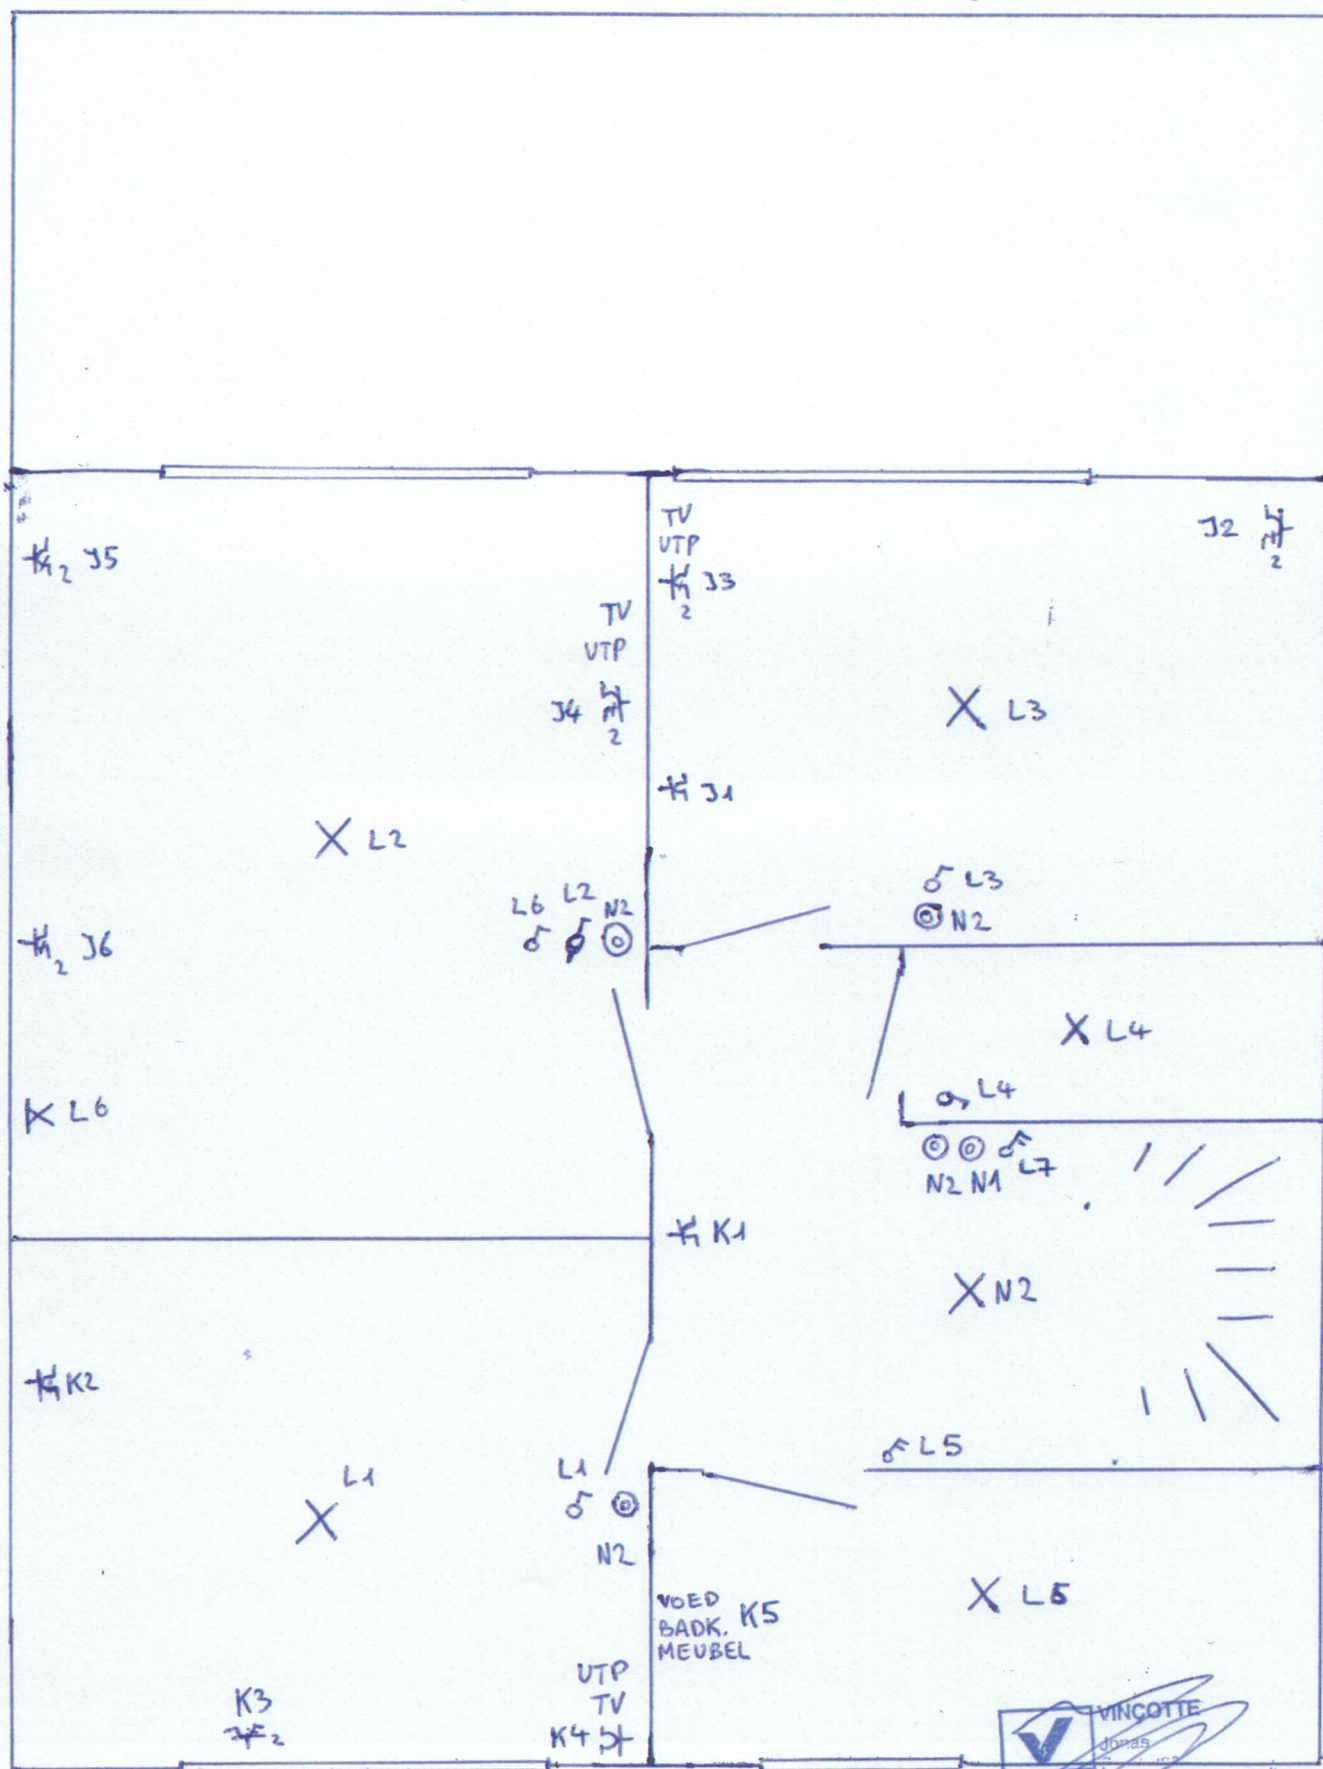

↓ straat 34B



VINCOTTE
dinas

Electriciteit

9290 Berlare

