

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweeptstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

O. ref.:

U. ref.:

VERSLAG NR. 195/100113/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2800 Meechelen

Vaartdijk 62 / 1st verdiep

EIGENAAR:

Kestens

Adres:

OPDRACHTGEVER: Ena Pieters & Verbeke

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW of IK:

EAN:

Ref.:

Teller nr.

Index:

Datum van het onderzoek: 13/02/10 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI-art. 270) (AREI-art. 271) (AREI-art. 276) (AREI-art. 276bis) (ARAB-art. 262) (K.B. 26/2008) (T.P.-art. 224) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortepig - Versuiging - Verkoop - wachtheid - Type der lokalen: appartement

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1995 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting autumy 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar: type

Type van de aardelektrode: 16-baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanden: 3

RA: 18 Ohm; RI tot 10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

bord teller: 1 string 2P140A 2x40² 2el
2 string 2P140A 2x4,5² / 1,5² 1eant.
1 string 2P140A 2x4,5² "
1 string 2P140A 2x4,5² 2el
bord verdiep: 1 string 2P140A 2x4,5² / 1,5² 1eant.
2 string 2P140A 2x4,5² "

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF VASTGESTELDE INBREUKEN: 1) één draadschema + situatieschema is te voorzien

2) hoofd differentieel van min 40A/300mA te voorzien op hoof r/d installatie

3) aardingsverbod op te plaatsen (aan de ingang)

4) volledige differentieel voorzien voor vochtige ruimten (ADS 40A/300mA)

5) hoofd aarding voorzien in beheersbord verdiep

6) zorgen dat schakelborden IP-XKB niet veilig zijn

7) kalibratieelementen zijn te voorzien in beheersbord teller

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelor

naam:

Nota: 4 stopcontacten zijn van aardpen te voorzien, daarvoor te stellen met stekker blase 2 worden aangesloten

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de één draads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden op (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op datum 18/03/10 + 18 maanden

DE AGENT-ONDERZOEKER: 195 Van Rensst R.

FORM. 382-06/2009

De directeur,



115-INSP

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



E.D.T.O.
an controleorganisme

www.btvcontrol.be

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 80
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

REGIONAAL KANTOOR

Opdrachtgever:

Eva Peeters & Verboven

Datum van verslag:

13/12/10

Datum van onderzoek:

Plaats van het onderzoek:

2600 Mechelen

U. ref.:

Vaartdijk 62 2^e verdiep

O. ref.:

TITEL:

VERSLAGNUMMER: 195/nr 13/02


1. Algemene beschrijving

2. Onderzoek

3. Resultaten meting

4. Vaststellingen/Nota's

5. Besluit

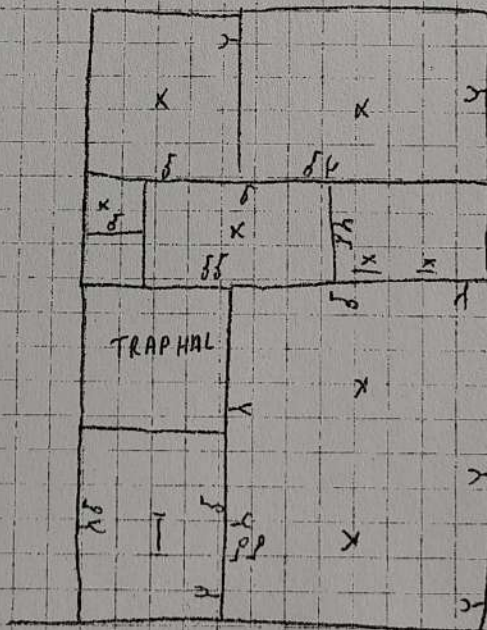

garage

