


Kring	Verbruiker(s)
A	verlichting inkom, keuken, leefruimte, eetplaats
B	verlichting berging, slaapkamer, wc + ventilatie
C	stopcontact oven
D	voeding kookplaat
F	stopcontact wasmachine
G	stopcontact droogkast
H	stopcontact vaatwasmachine
I	verlichting + stopcontacten terras, badkamer
M	stopcontact boiler + sturing verwarming
N	stopcontacten slaapkamer, eetplaats
J	stopcontacten koelkast, dampkap, berging
K	stopcontacten werkblad keuken
L	stopcontacten berging, leefruimte, tv
T	voeding Fifthplay (energiemanagement)

Van teller technisch lokaal 2P40A

CONTROLPROGRAMME
HILFEN
2500 BONDEN
DING SCHIEDEN
AQUARIUM
AQUARIUM

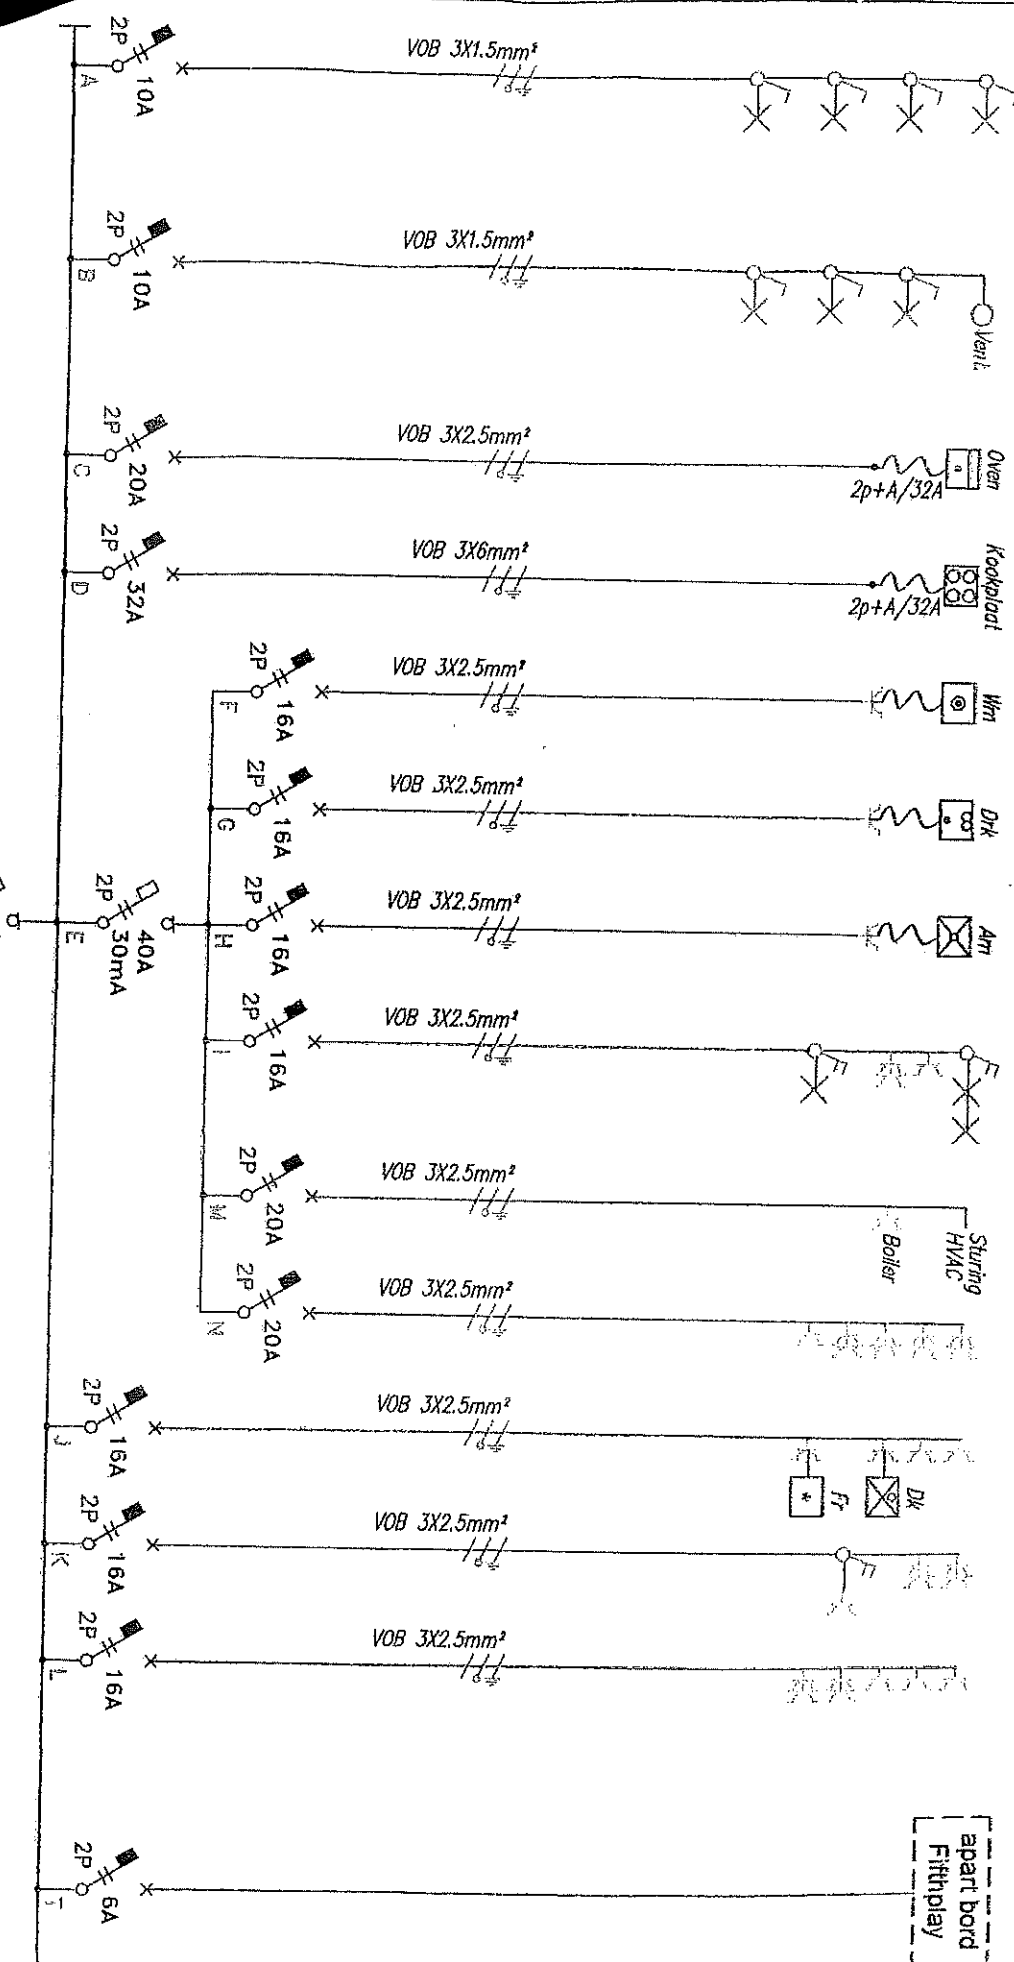

ATK	Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.		VERSLAG NR. <u>DS 015 232 NO</u>
	Erkend Organisme		ADRES INSTALLATIE: <u>2050 Antwerpen</u> <u>E. Dancoloon 14 (GVL) 0.5</u>
Mechelsesteenweg 247 Telefoon 015/55 51 51		2820 BONHEIDEN Fax 015/55 06 30	EIGENAAR: <u>De Maetedeire</u>
DISTRIBUTIEBEHEERDER:		Adres:	OPDRACHTGEVER: <u>Merelbeken</u>
Meter nr.:		Adres: <u>WZ 6155</u>	INSTALLATEUR: <u>WZ 6155</u>
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh		BTW of IK :	

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 23/6/2015; Aanvulling van verslag nr.; Type der lokalen: Appartement 0.5

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring - Renovatie

Begin werken: Fundering voor (na) 10.81; Installatie voor (na) 10.81; Met - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86/87 -

Aansluiting: Spanning 160/230 V; Bescherming v/d aansluiting: MAX 40 A; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/300mA

Netaftakkabel (type & sectie): EXUB 5x25 mm²; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XUB 4x10 mm²

Type aardelektrode: bus - baren - penen - horizontale geleider - diepteaarding; Aardverbindingssysteem: TT - TN - IT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 10; Spreidingsweerstand: 1 Ohm; Alg. Isolatie-niveau: > 5 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

ADS 40A/300mA → Spingen A - D + J + K + L + T

DS 40A/300mA → Spingen F + G + H + I + M + N

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens: AREI art. 270 - en de technische procedure(s) TPR-E12 -

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen: ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Waken + Boekamer nog te plaatsen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was - werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 23/6/2015 (AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK
2820 BONHEIDEN
Dany Siebens
015 55 51 51
