

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.:
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: mertens.koen11@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5075673
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/10/2018

Klant / Opdrachtgever:
Mertens Koen
Klarewal 17
8690 ALVERINGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: MERTENS KOEN VEURNESTRAAT 155 DE PANNE 8660
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 86/271bis/278
Datum onderzoek: 15/10/2018 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/10/2043 Onderzoeker: DEMURIE KRIS
Eigendom van: -
Installateur: -
B.T.W.: - ID-kaart: - Uitgereikt te: - Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: 5681689 Stand I: 85182 Stand II: -
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt
Dienstspanning: 1 N 400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Schak.: aut.maatsch.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen sectie: 10 mm² spreidingswaarde: 10.86 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatiweerstand: 11.99 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage één draadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 6
1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken



Geen inbreuken.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,


De Agent-onderzoeker

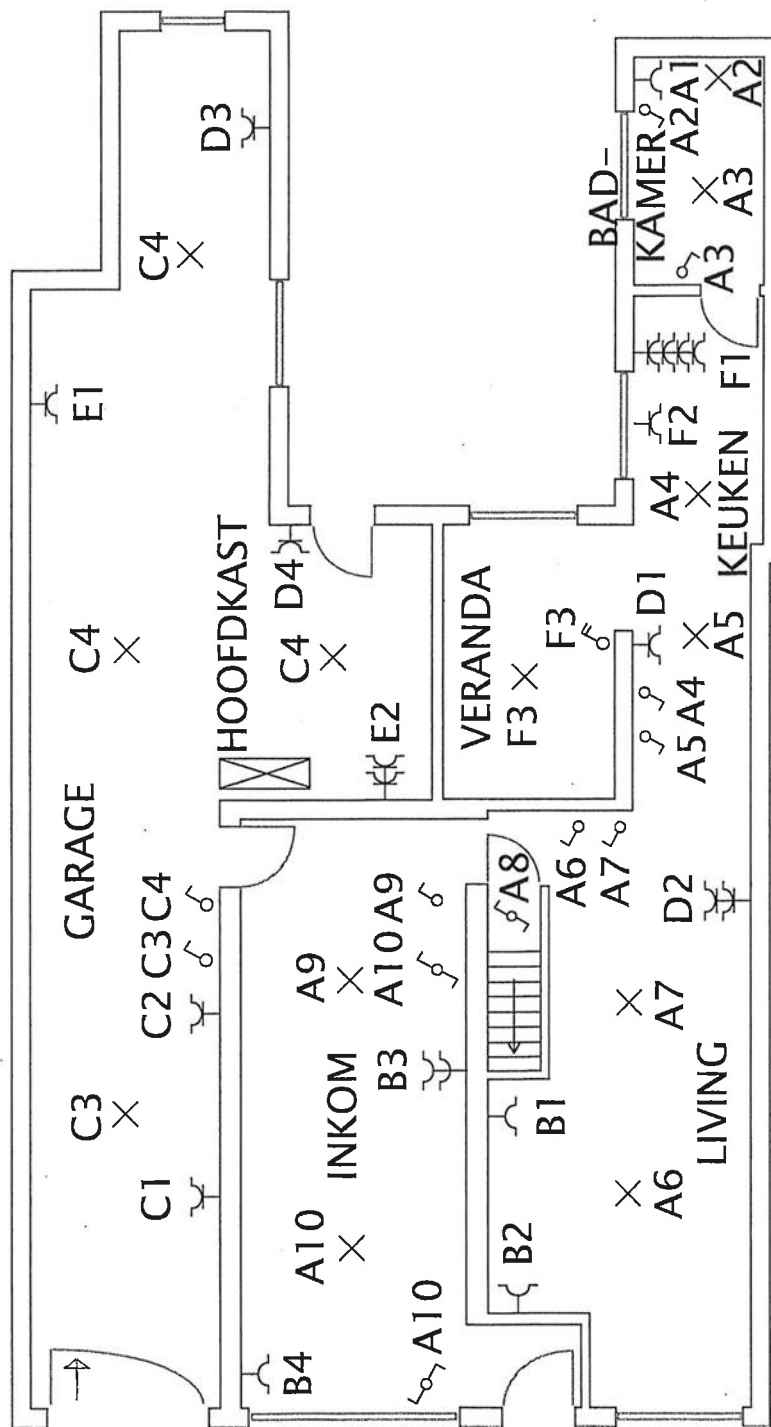

15/12/2018

PLAATS : VEURNestraat 155
8660 DEpanne

SITUATIESchema
P. 1/2
05-08-2018

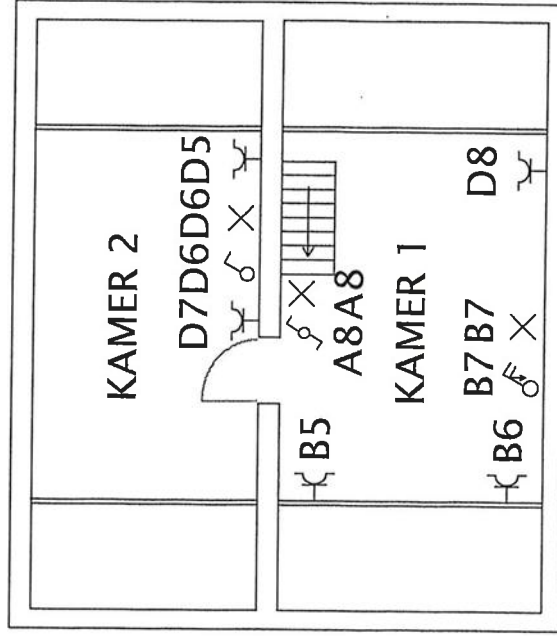

15/12/2017

PLAATS : VEURNestraat 155
8660 DEpanne

SITUATIESchema
P. 2/2

05-08-2018

INKOM:
LIVING
KEUKEN
BADKAMER
KAMER 1


INKOM
LIVING
KAMER 1

GARAGE

GARAGE
LIVING
KEUKEN
KAMER 1
KAMER 2

GARAGE

VERANDA
KEUKEN

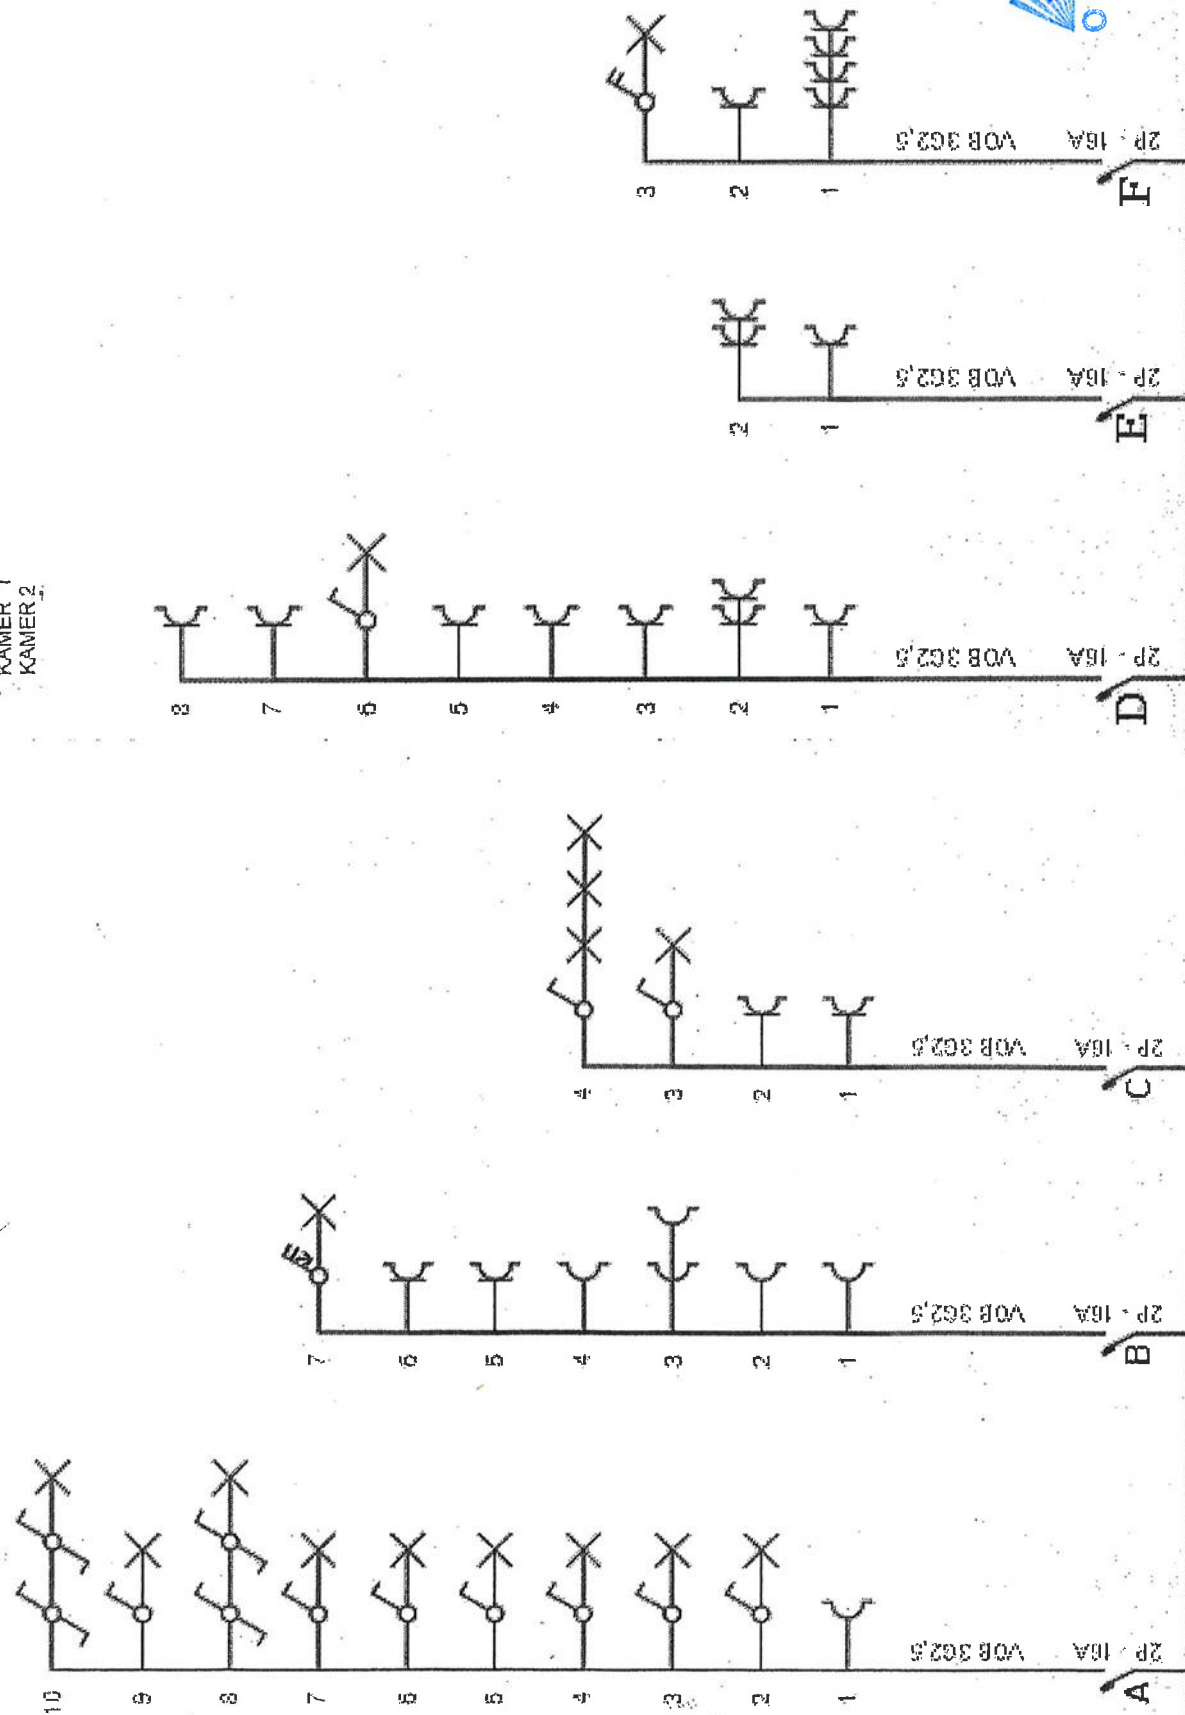

DEMURIE KRIS
GSM 093/246 152
www.demuriekris.be

15/10/2018

HOOFDDIFFERENTIEEL

AA BB

Δ300mA Δ30mA
2P - 40A 2P - 40A

PLAATS : VEURNestraat 155
8660 DEPANNE

EENDRAADSCHEMA

P. 1/1

05-08-2018

AA: HOOFDDIFFERENTIEEL 300 mA

BB: HOOFDDIFFERENTIEEL 30 mA

A: INKOM , LIVING , KEUKEN , BADKAMER , KAMER 1

B: INKOM , LIVING , KAMER 1

C: GARAGE

D: GARAGE , LIVING , KEUKEN , KAMER 1 , KAMER 2

E: GARAGE

F: VERANDA , KEUKEN

 DEMURIE KRIS
GSM 0493 846 152
kris.demurie@ocb.be
www.ocb.be

15/10/2018.
