

BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :

Houwaert

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : 369/120821/08

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : Avenue Albert 1^{er}
1339 GENVAL

PROPRIETAIRE : Evénement et construction

Adresse : 91/1 Rue du Peuple 1180 Bxl

DEMANDEUR : F. P. B. B. C.

Adresse : 998, Rue Renoir Astid

INSTALLATEUR : 7110 Marnage

Adresse : _____

TVA ou CI : 0443 501618

EAN : _____

Ref.: _____ Compteur n°: _____

Index : _____

Date du contrôle : 21/08/2012 Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation ; Type locaux : appartenance Bot

Début travaux : Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension 2x290 V Protection raccordement MAX 40 A

Câble aliment, tableau, princ. : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type 40A-0,3A

électrode de terre boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 19 ; RA : 5 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes : _____

DESCRIPTION : _____

voir schémas unifilaire et de situation.

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu :

le responsable de l'installation

nom :

signature :

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 21/08/2012 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. L'installation n'est pas conforme.
3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.
L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____


L'AGENT VISITEUR :
n° + nom + signature

369 Decol

Le directeur,

Coffret Electrique - Appartement B.O.


ECLAIRAGES REZ+ ESCALIER 3G1.5
 PRISES BUANDERIE +HALL+ CUISINE 3G2.5
 PRISES LIVING+ SALON+ EXTERIEUR 3G2.5
 TAQUE 3G6
 FOUR 3G2.5
 MICRO-ONDE 3G2.5
 ECLAIRAGES ETAGE 3G1.5
 PRISES ETAGE 3G2.5
 PRISE CAVE 3G2.5
 PRISES MONTE-CHARGE +EXTERIEUR 3G2.5
 PRISES BUANDERIE 3G2.5
 ALIMENT. ALARME 3G2.5

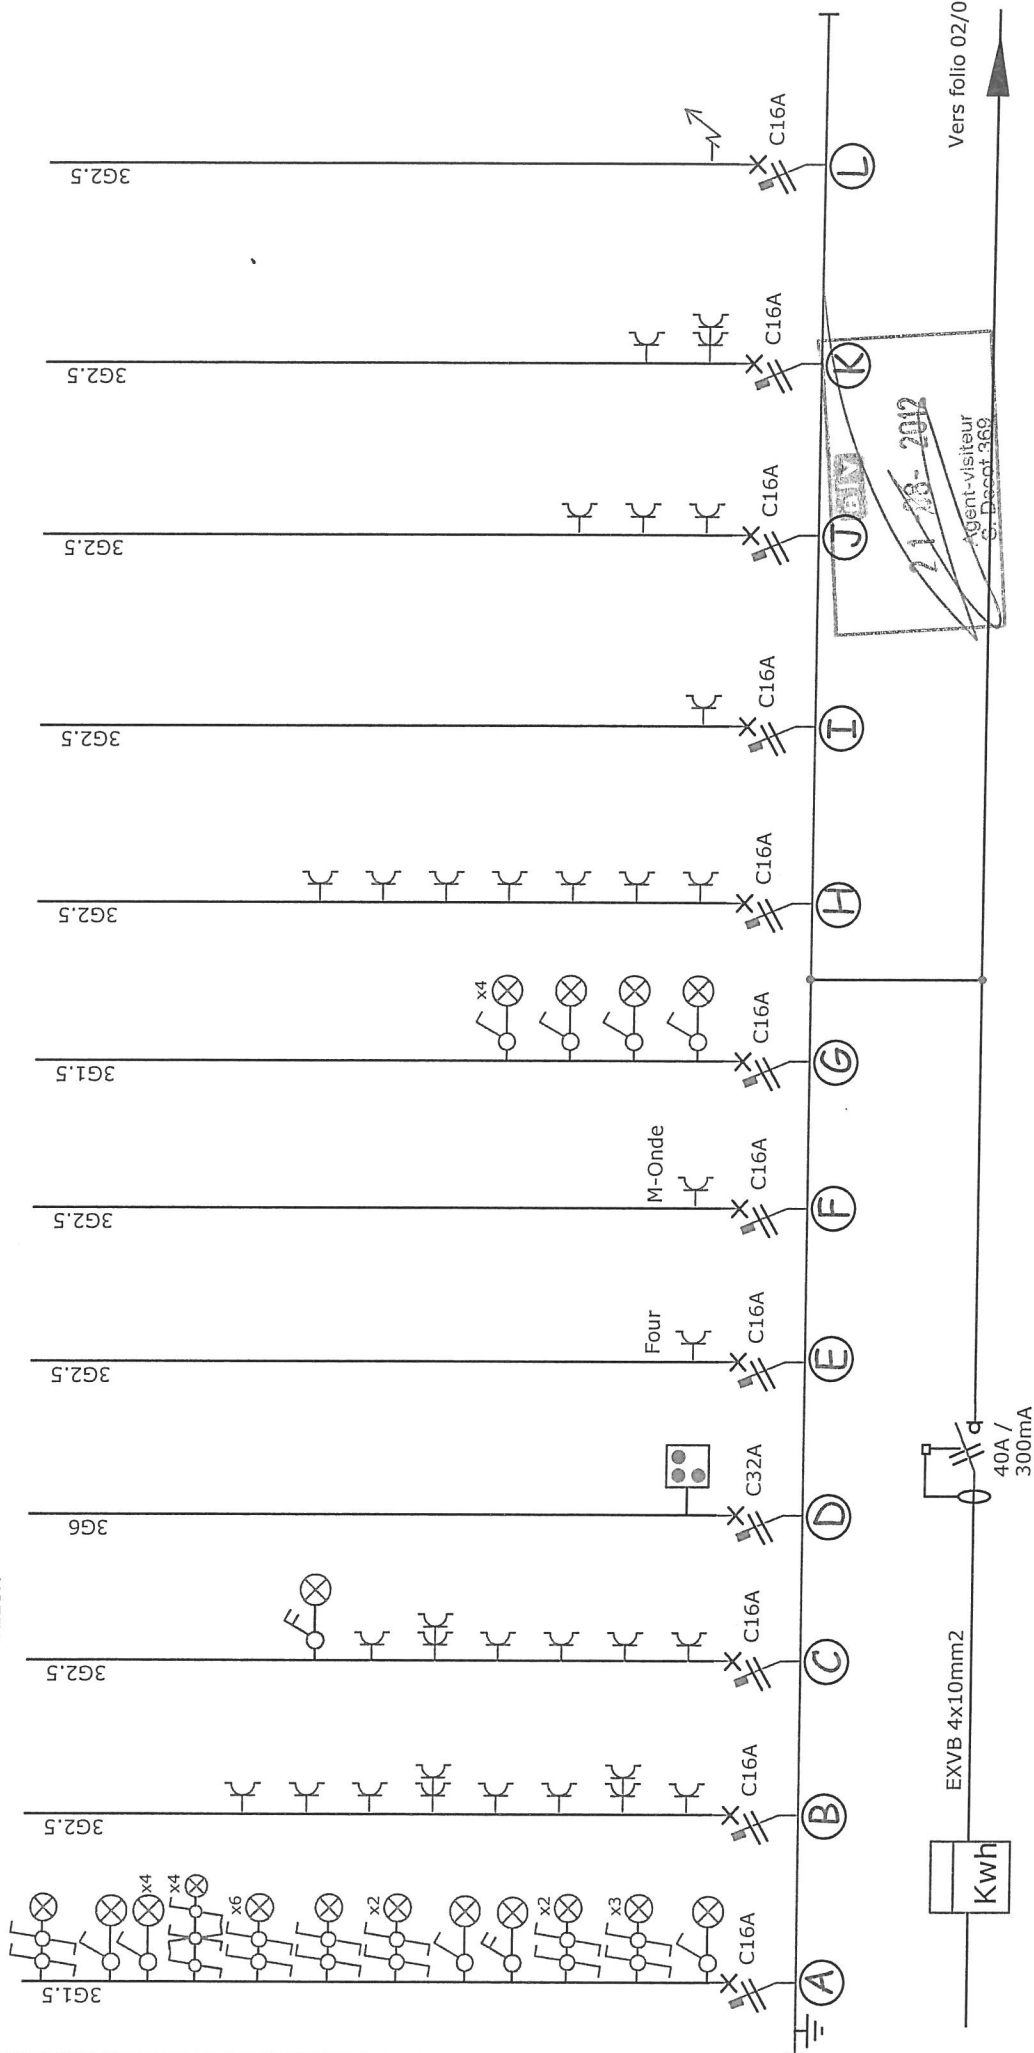

CONCERNE: Immeuble à Appartements Les Portes de Jusenne-Avenue Albert 1er à 1332 Genval Installation Electrique		TENSION: 2 x 230 V + T		AS-BUILT	
MAITRE DE L'OUVRAGE: Création & Construction Rue de Repos 21 bte 1 à 1180 Bruxelles (Uccle)		DESSIN: Lattuca S.		DATE: 27/01/12	
		N° PLAN: 3885/Uni00			
		FOLIO: 01/02		INDICE: 27/01/12 A	
				13/08/12 B	

EF **LABELEC S.A.**
 ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
 Rue Reine Astrid 228-7110 MAURAGE
 Tel: 064/67.69.89 - Fax: 064/67.69.90
 T.V.A.BE: 443.501.618-MTP CAT.P1 CL.3

Coffret électrique - Appartement B0.

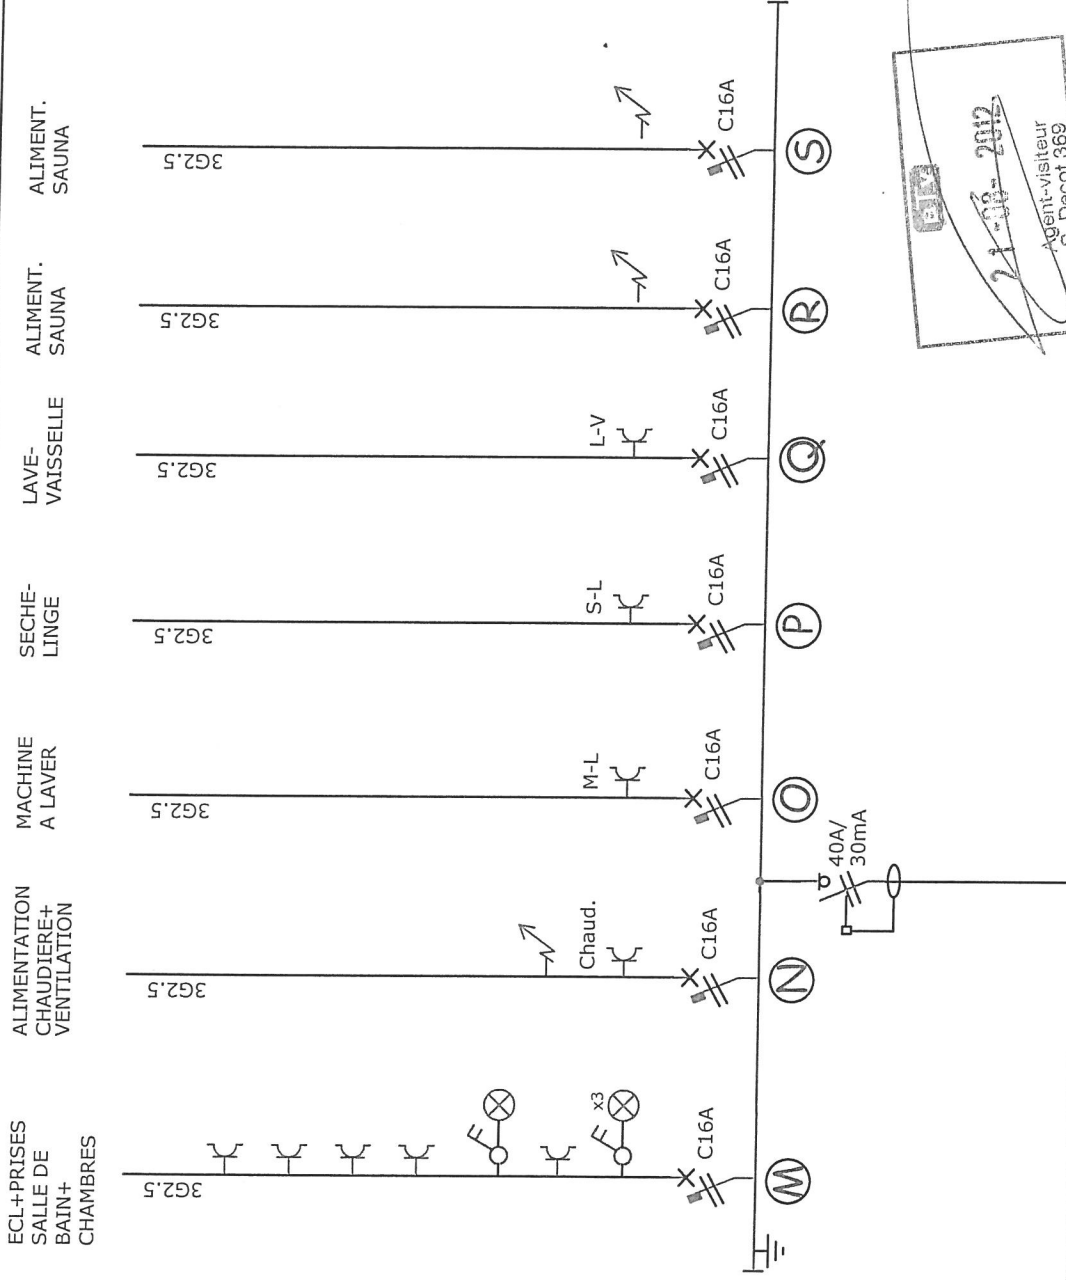

Venant folio 01/02

CONCERNE: Immeuble à Appartements Les Portes de Jusenne-Avenue Albert 1er à 1332 Genval Installation Electrique		TENSION: 2 x 230 V + T		AS-BUILT	
MAITRE DE L'OUVRAGE: Création & Construction Rue de Repos 21 bte 1 à 1180 Bruxelles (Uccle)		DESSIN: Lattuca S.	DATE: 27/01/12	N° PLAN: 3885/Uni00	
		FOLIO: 02/02	INDICE: 27/01/12 A	13/08/12 B	

RF **LABELEC S.A.**
ENTREPRISE GENERALE D'ELECTRICITE
Rue Reine Astrid 228-7110 MAIRAGE
Tél: 064/67.69.89 - Fax: 064/67.69.90
T.V.A. BE: 443.501.618-MTP CAT. P1 CL.3

