

Num. rapport: **20230008570-V.1**

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE**GENERALITE**

Type d'installation: Extension/Modification

Lieu d'inspection: Rue Cyrille Dewael 19, 1350 Orp-le-Grand

Référence: Livre I Chapitre 6.4., Livre I Section 8.2.2., Livre 1 Section 8.2.1

Date d'inspection: 19/05/2023

Inspecteur: Joshua STROOBANTS

Propriete de: Sabine Vanpaesschen

Pers.Cont.:

Nature de l'extension/modification:

Type de locaux: Maison

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Reglements:

Prochain contrôle au plus tard le: **19/05/2048** ou dans un délai de: 299 mois

Installateur: Gabriel Mengal

T.V.A.: BE0646870531

tel.:

Documents de référence:

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: ORES

Numero EAN: Non disponible

Compteur: 34088533

Marque: PAFAL

Index I: 168.2

Index II: 140.1

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 2x230V

I max. instal.: 40A

Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A

Liaison comptage-coffre de repart.

Type de cable: EXVB

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe☒ schema unifilaire et plan de position ont ete signes pour approbation

Installation executee conformement aux schemas: en ordre

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Inventaire des influences externes present et signe: en ordre

Protection contre les chocs electriques:

Contact direct: en ordre

Contact indirect: en ordre

Différentiels essaie par bouton test: en

Contrôle des boucles de défaut: en ordre

Resist. d'isolement general: 0.98 Mohm

ordre

Electrode de terre:

type: piquets

Section: 16 mm²

Resistance de dispersion: 15.79 Ohm

Continuite PE et liaison equipotentielle: en ordre

Matériel et influences externes: en ordre

Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA

Scellé par plombage: p.a

Diff. supplém.: 2p 40A/30mA

Pas encore places: cuisine, salle de bains, Installation encore en travaux lors de notre passage, Maison en travaux lors de la visite, Eclairages,

Nombre de tableaux: 1

Nombre de circuits terminaux: 18

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Contrôle visuel du matériel fixe ou à poste fixe dangereux: En ordre

Contrôle visuel du matériel mobile à poste fixe dangereux: Pas d'application

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

CONCLUSION**L'INSTALLATION EST CONFORME**

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,

L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 () - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection..

N12 () - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 () - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

L'inspecteur certifie avoir suivi toutes les étapes de la check-list: OUI

Num. rapport: **20230008570-V.1**

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CONSEILS/REMARQUES:**Suivant la sous-section 6.4.6.4.b.7. du Livre 1, il est obligatoire de rappeler :**


- a) l'obligation de conserver le rapport dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) l'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.

Livre 1: RGIE approuvé (ou introduit) par l'arrêté royal du 08/09/2019.

REZ

Rue Cyrille Dewael, 19
1367 Orp Jauche

Stroobants

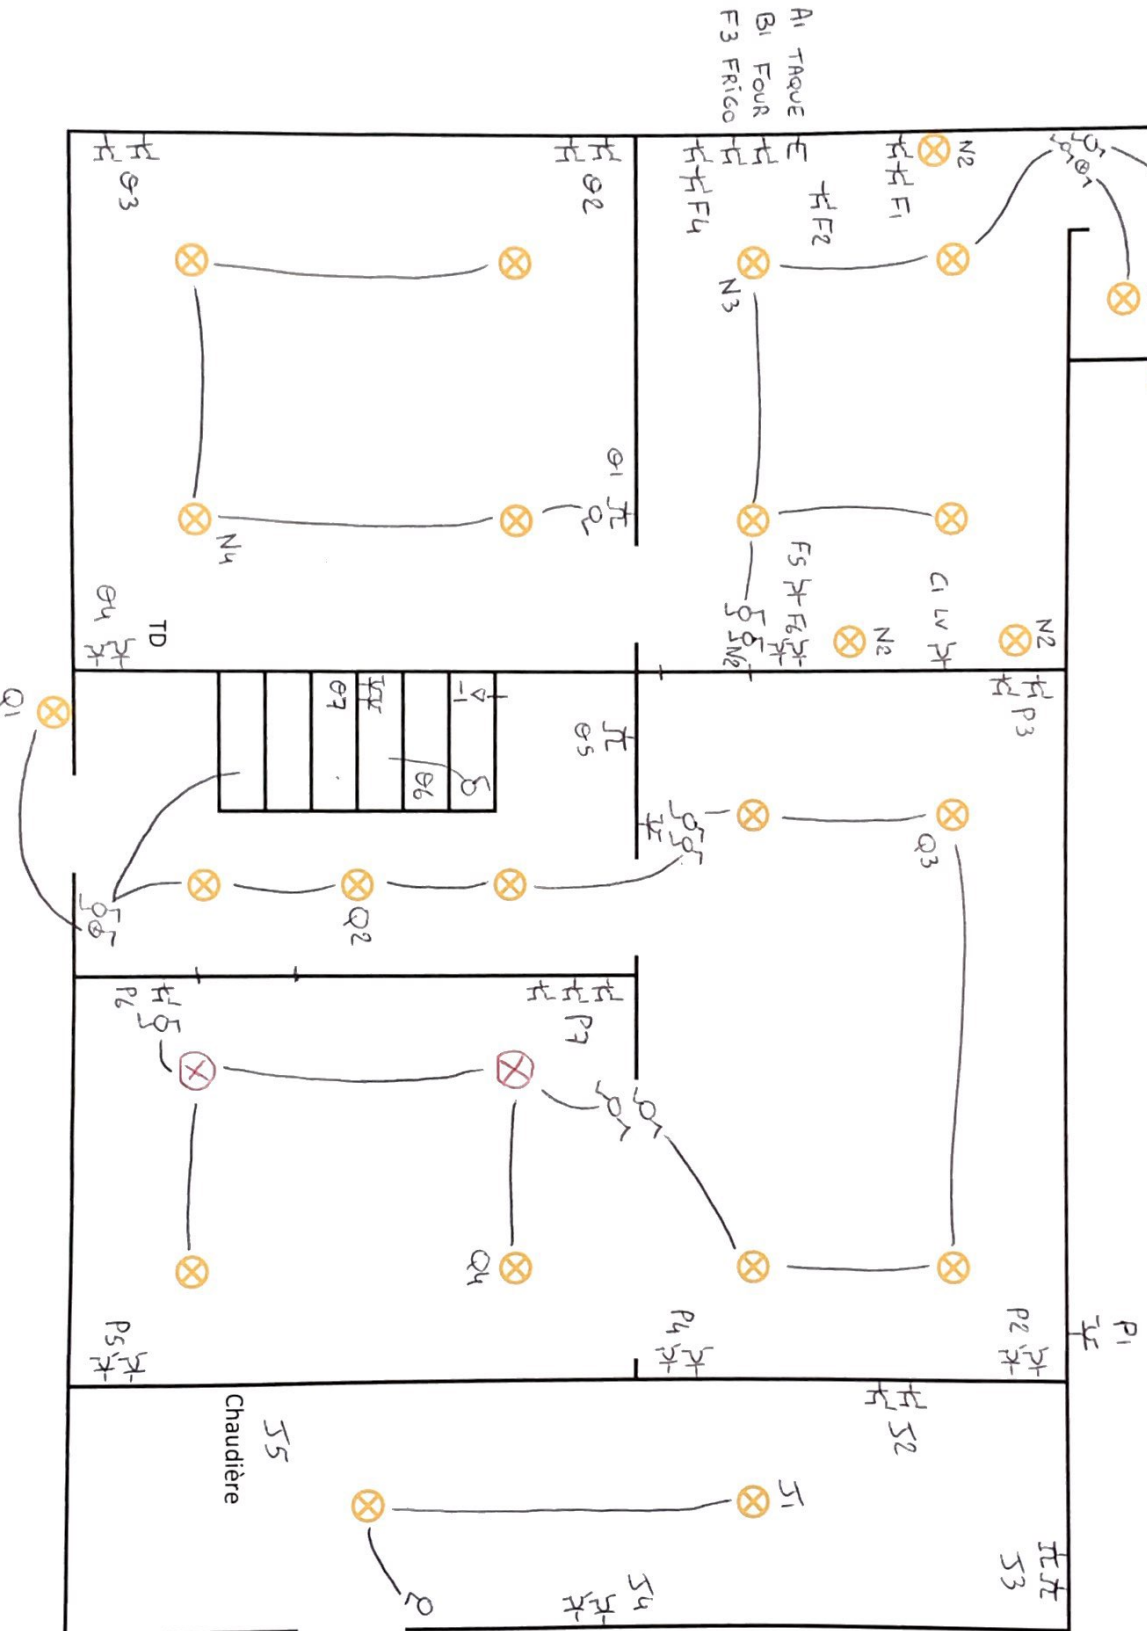

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door :
Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre
010/280 577
015/660 460



Inspecteur: STROOBANTS Joshua


Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

Stroobants

Rue Cyrille Dewael, 19
1367 Orp Jauche

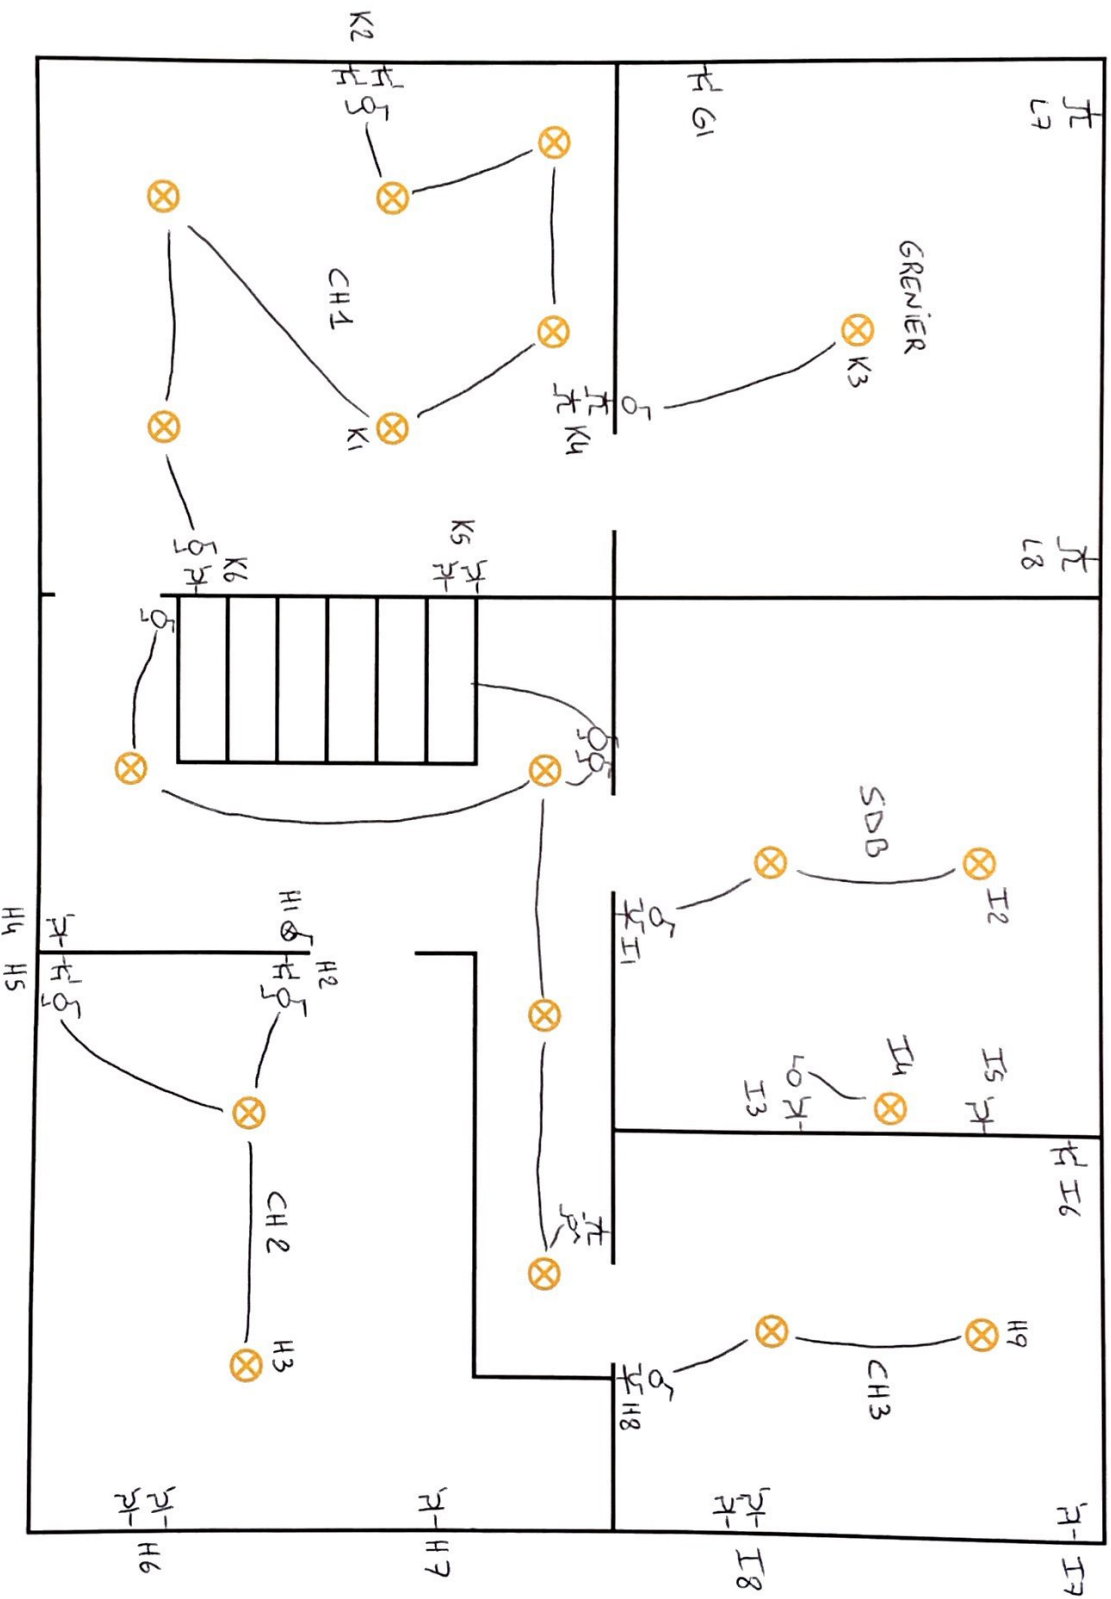

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door :
Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre
010/280 577
015/860 460




Inspecteur: STROOBANTS Joshua

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

+2

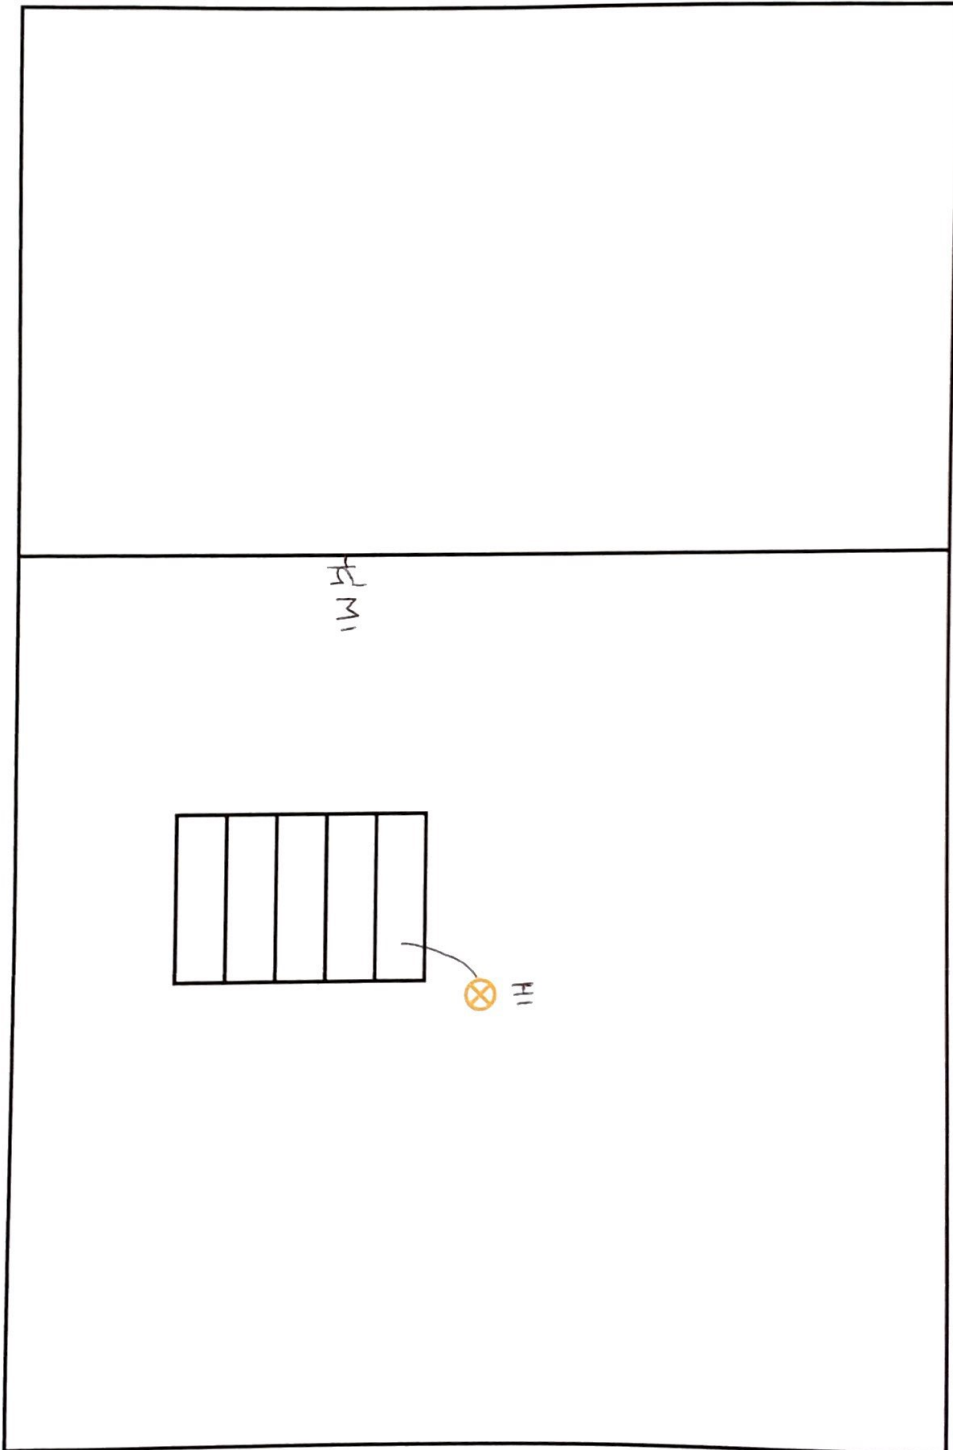

Rue Cyrille Dewael, 19
1367 Orp Jauche

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door :
Avenue Eiffel 8 - 1300 Wavre
010/280 577
015/660 460




Inspecteur: STROOBANTS Joshua

Date / Datum :

PV n° :

Signature / Handtekening :

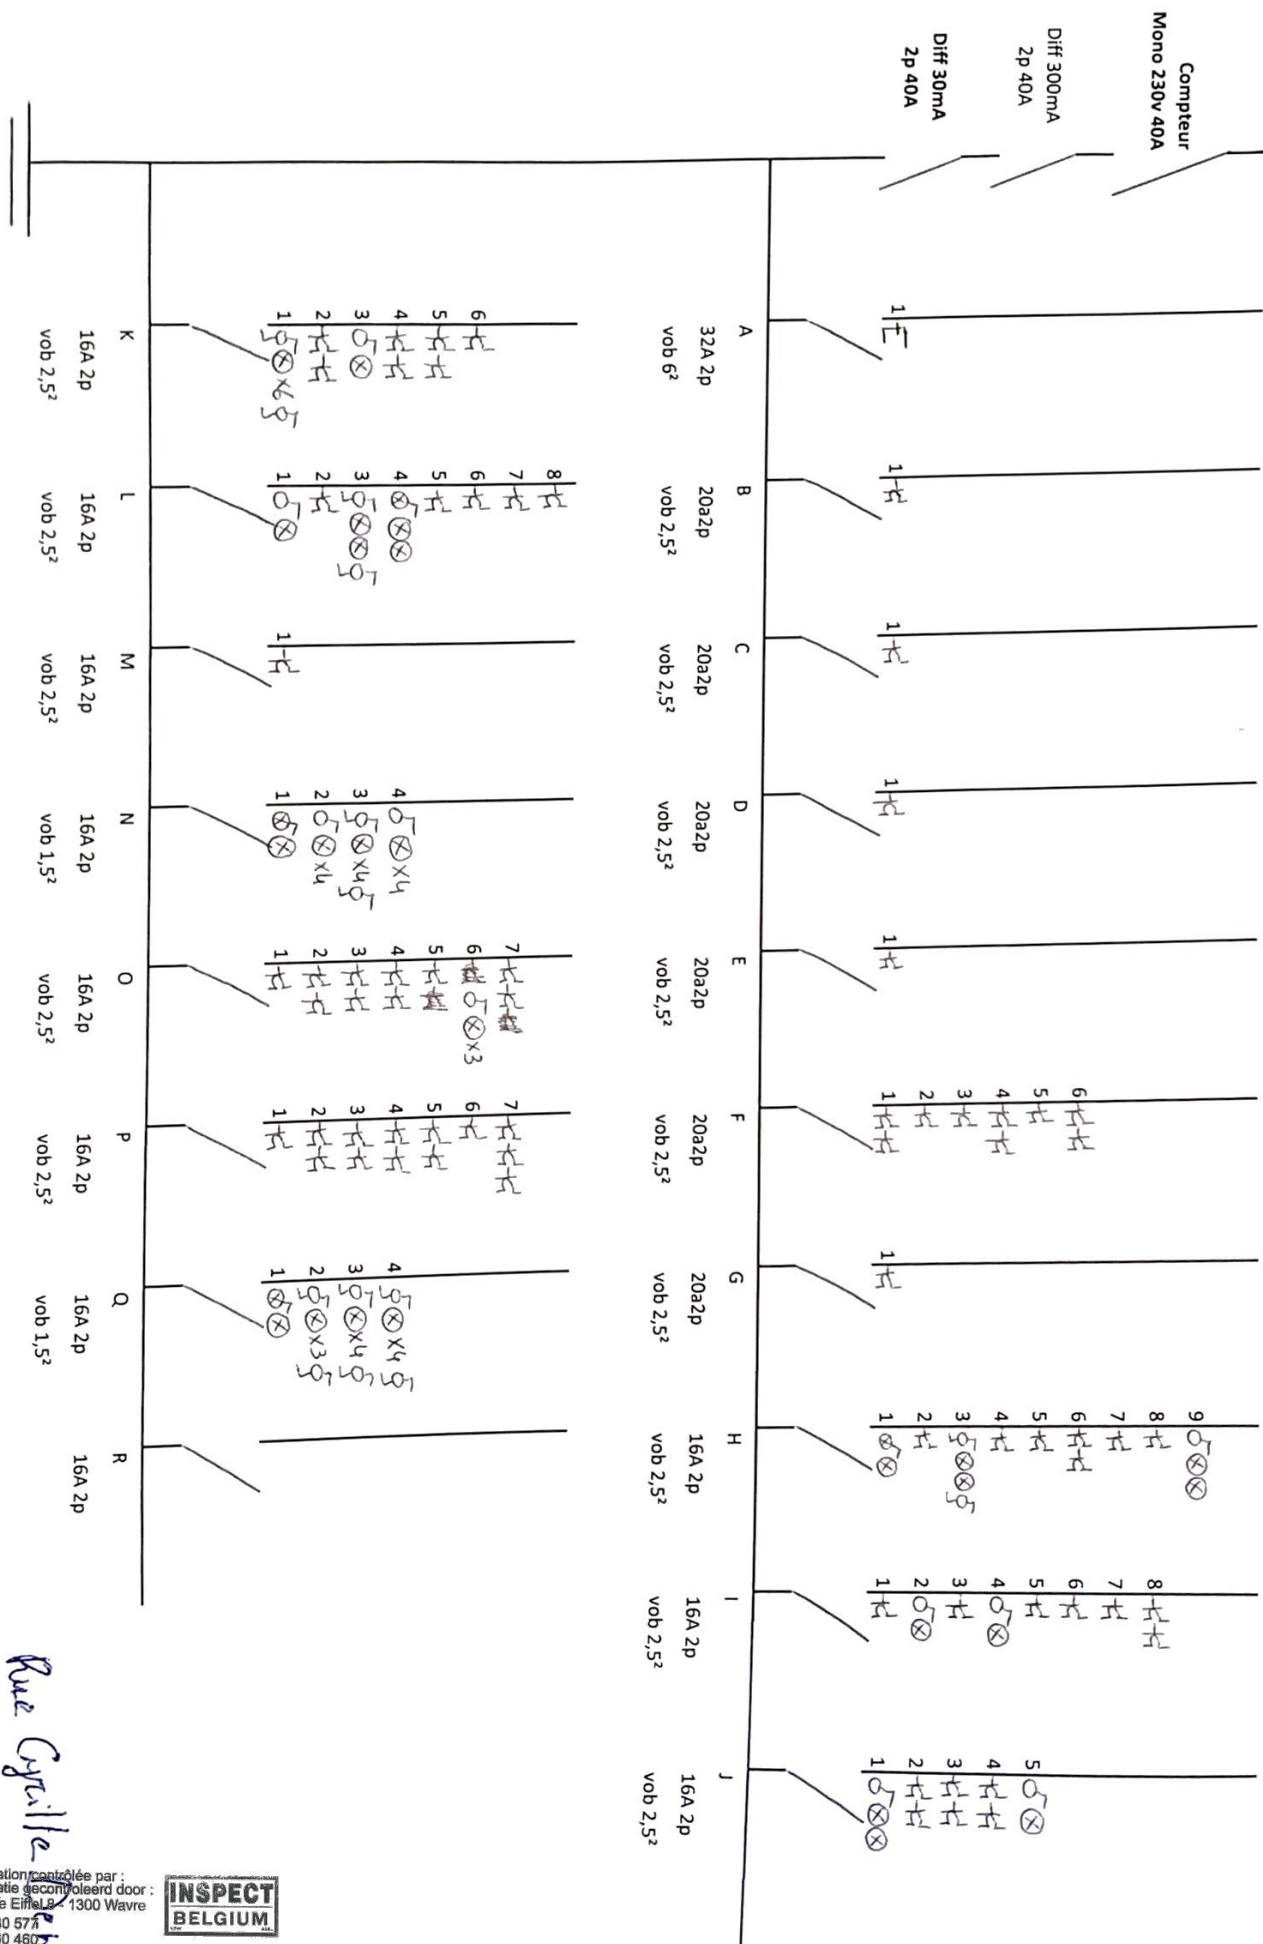

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door :
Avenue Eiffel 9 - 1300 Wavre
070/280 575
015/860 460



Inspecteur: STROOBANTS Joshua

Date / Datum:

N° n°:

Signature / Handtekening:

Rue Cyrille

1367 Oap
