

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



O.C.B.
Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF-OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276 /
Aanvulling verslag nr.
Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Overdracht eigendom
Type der lokalen : Appartement
Plaats van onderzoek : St. Willebrordusstraat 45/1 - 2400 Mol (gelijkvloers links)
Eigendom van : Borgers - Looyend 34A - 3470 Retie
Opdrachtgever : Elektro K&R - Hodonk 25 - 2470 Retie
Installateur : Datum :
BTW : 0839.173.229 ID-kaart : Uitgereikt te : Datum van onderzoek : 12-10-2011
Onderzoeker : Nevelsteen Jef

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V ± N Max. Beveiliging : 40 A Omschakelaar : stand :
Hoofdbeveiliging : Zek. : aut. magisch Schak. :
Meter-bordverbinding : kabeltype : XVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 10 mm²
Voedingsbekabeling : kabeltype : EXVB aantal geleiders : 4 doorsnede : 16 mm²
Beveiligende net ondergrond op bovengronds net / ondergrond net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
Aardelektrode : Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders Sectie : 35 mm² Spreidingswaarde : 2 Ω
Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 10 Algemene isolatieweerstand : 50 MΩ
Diff. schak. : algemene : 2P 40 A / 300 mA bijkomende : 2P 40 A / 30 mA
werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen
Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde
Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde
Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.
N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12/10/2011, zoals voorzien door art. 271 van het AREI,
alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde
inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel : in elke provincie

maatschappelijke zetel :
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be


NW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

INSTALLATIEGECONTROLEERD
DOOR QCB NEVELSTEEN JEF
DATUM 12/10/2011
PV, NR. 1066-12102011-02/B

[Handwritten signature]

VAN BAELE RIK
HODONK 25
2470 RETIE
Tel. 014/37 84 62
Fax. 014/37 50 14
PARTNER-ID: 1500008293

Electra

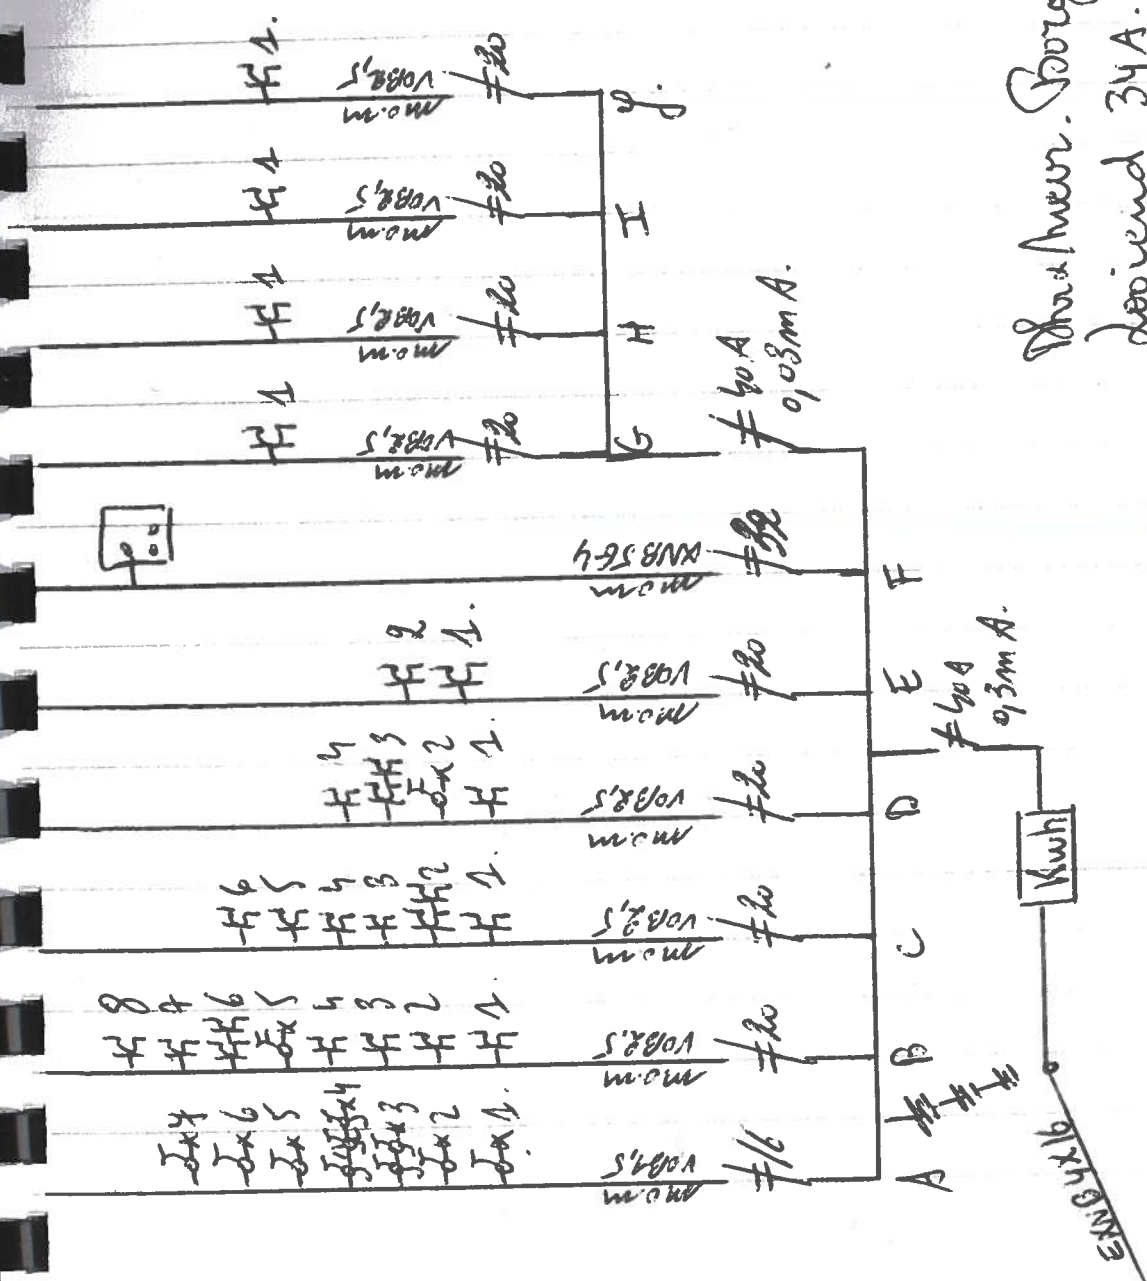

De heer. Borgers (Opdrachtgever)

doorend 34A.
2470 Retie.

Gelijkvloers lintas $\Rightarrow$ St.-Willebroedswaak 48
2400 Ind.
