



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 28/07/2023

Inspecteur: Sabri Cingoz

Mentor: -

Installateur: Noduss

ID-label: 55

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serienummer: 19481236

Datum verslag: 28/07/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Kerkmansstraat
55
3530
HOUTHALEN-HELCHTEREN
België

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Kepler Development
Kerkmansstraat
55
3530
HOUTHALEN-HELCHTEREN
België

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Noduss
BE 0743 636 741
+32 15 65 46 75
Kim@noduss.com


Type : woning

EAN : 54

☒ Niet meegegeeld

Teller Nr.: : Nog te plaatsen

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

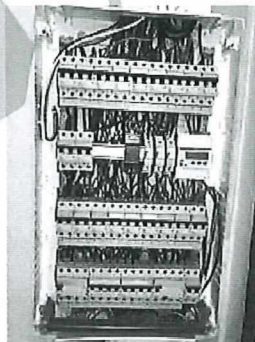

Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS
Aantal borden: 1
Aardelektrode: Aardingslus

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4. en 4.2.4.3.


Spanning: 3N400V
Aantal kringen: 23

Meter / bord verbinding: 10 mm:

Max beveiliging: A

Ri algemeen 5,52 MΩ RE 10,39 Ω

OK OK

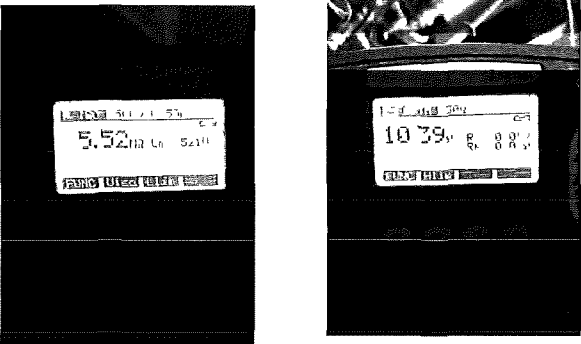

DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	Ist	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	NVT	NVT
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	10	NVT	NVT

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
5	C	16		2	1,5
16	C	20		2	2,5
2	C	20		4	4

Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning De goede werking van de differentieels kon niet getest worden
- nota/note 17 De hoofdequipotentiaalverbindingen zijn nog aan te sluiten na plaatsing van de nutsleidingen
- nota/note 22 Keuken nog niet volledig geplaatst Keukentoestellen en/of -meubels nog te voorzien
- nota/note 27 Het EAN-nummer kon ons niet meegedeeld worden tijdens onze rondgang
- nota/note 5 De verlichting is nog niet definitief geplaatst

nota/note 12 De elektrische installatie staat niet onder spanning De goede werking van de differentieels kon niet getest worden

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 28/7/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend
- De installatie is aangevat voor 01/06/2023, hierdoor is rekening gehouden met de afwijkende beschikkingen vermeld in 6.5.8 van Boek I
- Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid

Aantal bijlage(n) 14
VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Sabri Cingoz

[Handwritten signature]

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2

Het verslag dient te worden bevestigd in het dossier van de elektrische installatie

- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk medegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be





BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839 866 481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 28/7/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen


apportnummer 1208775

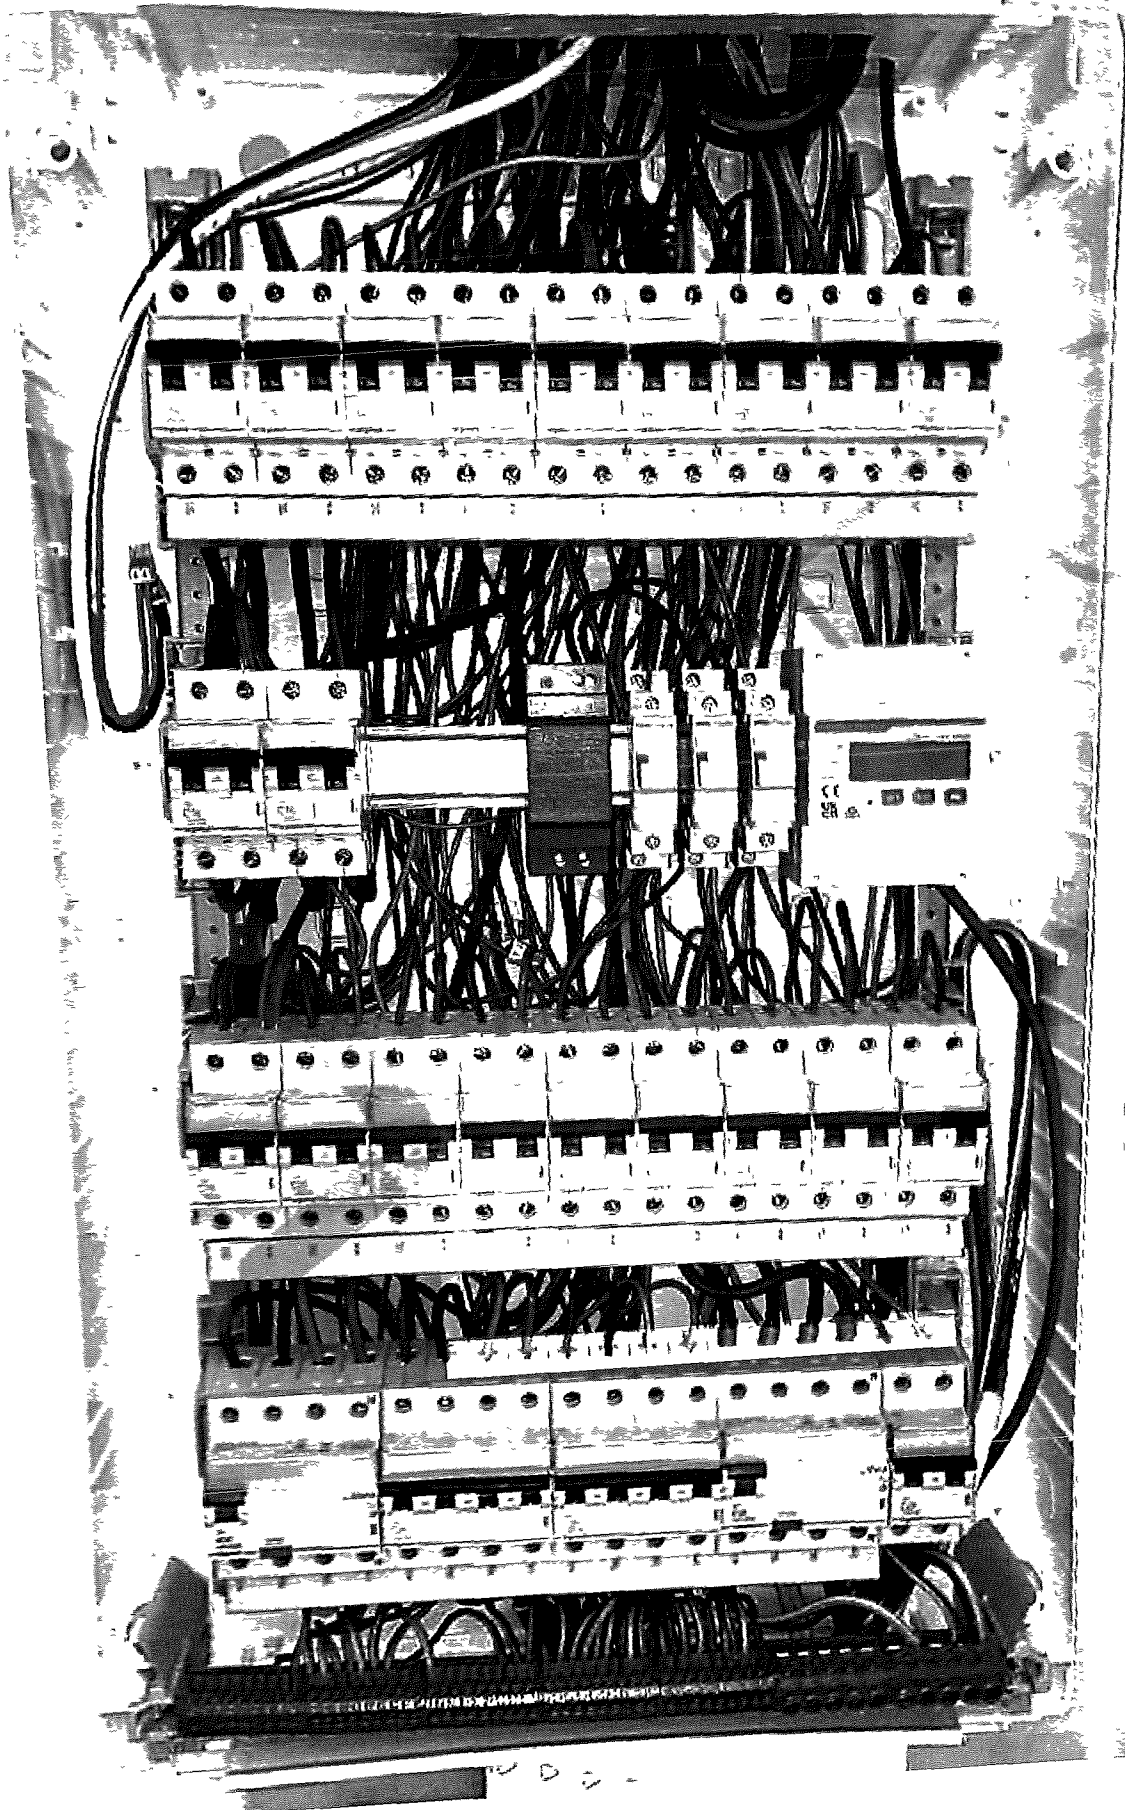




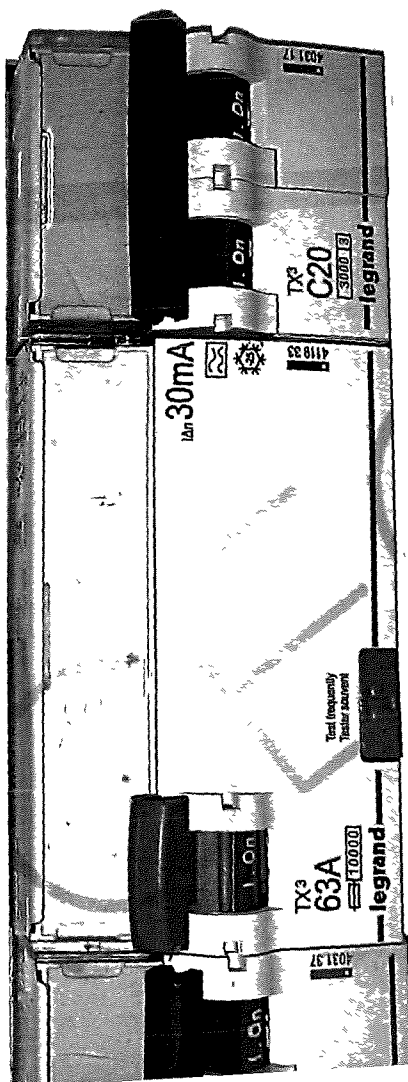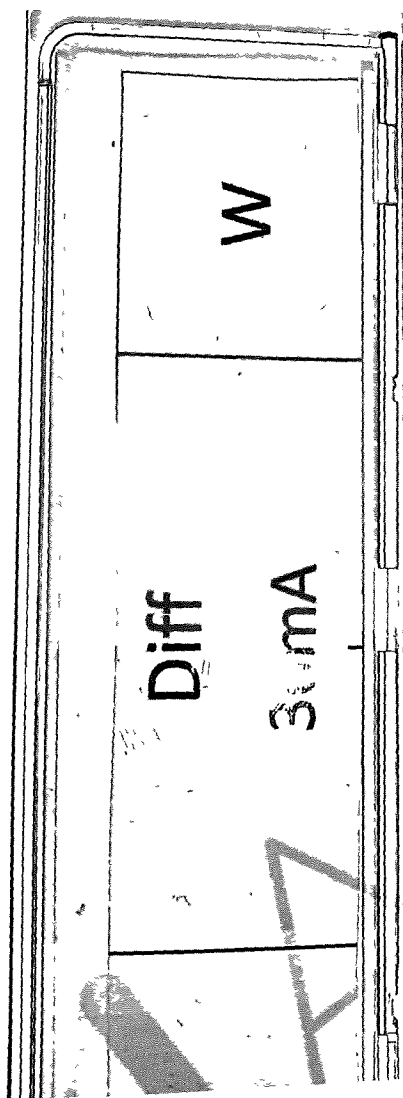


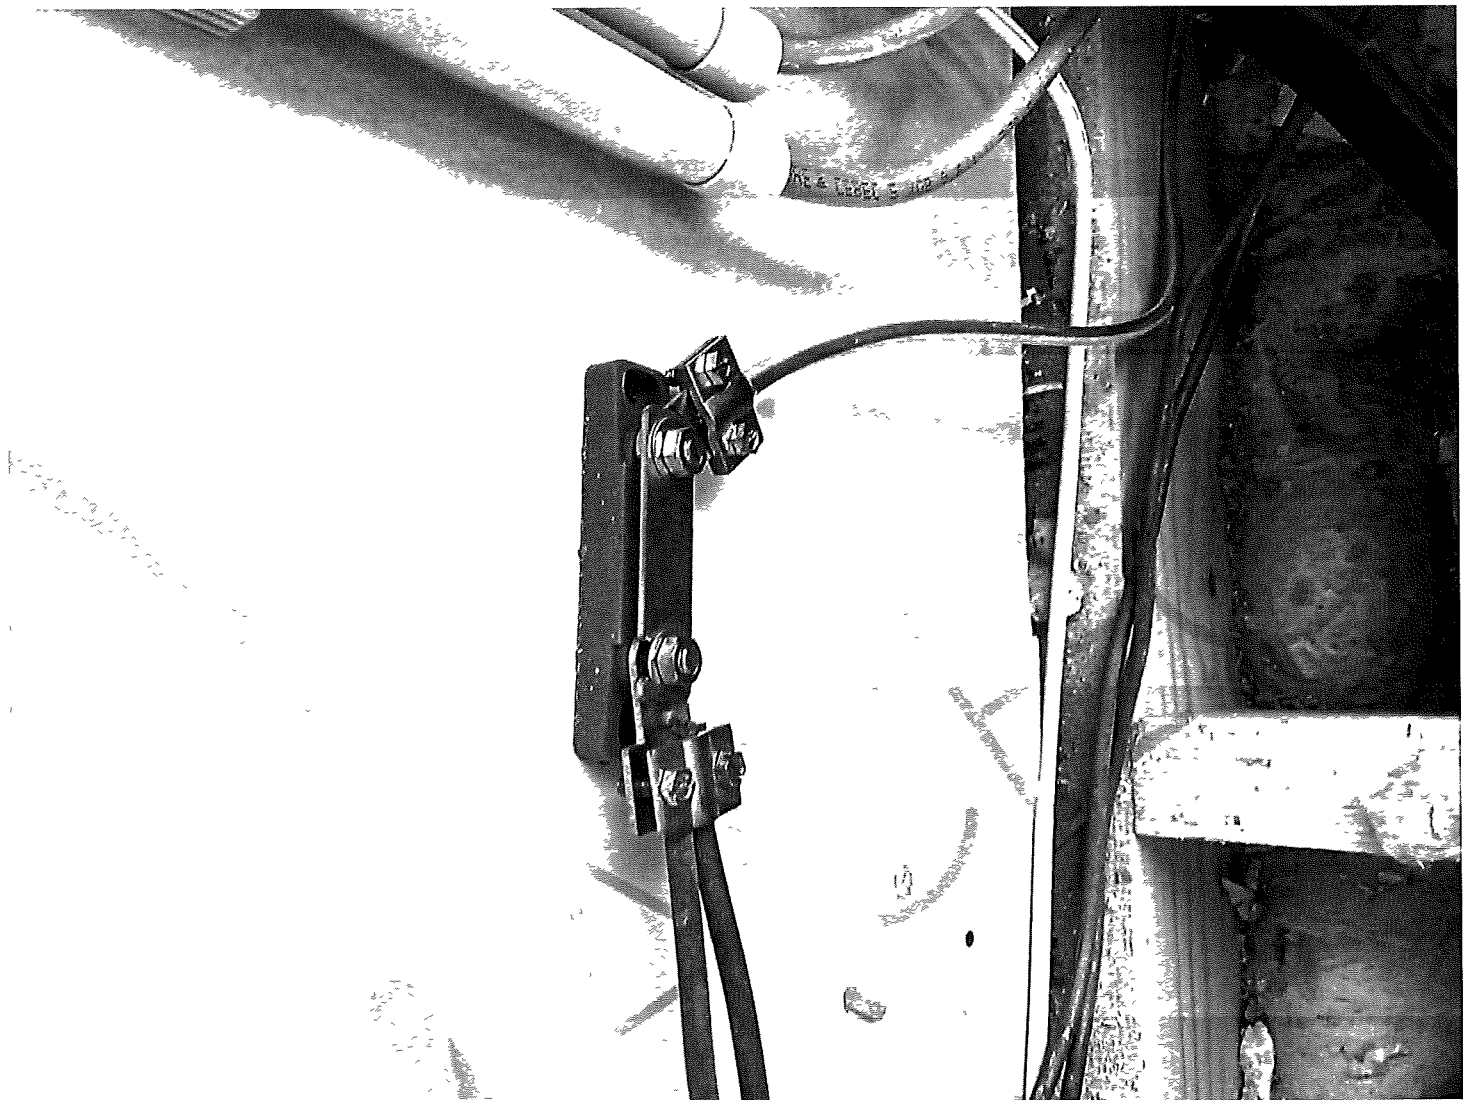

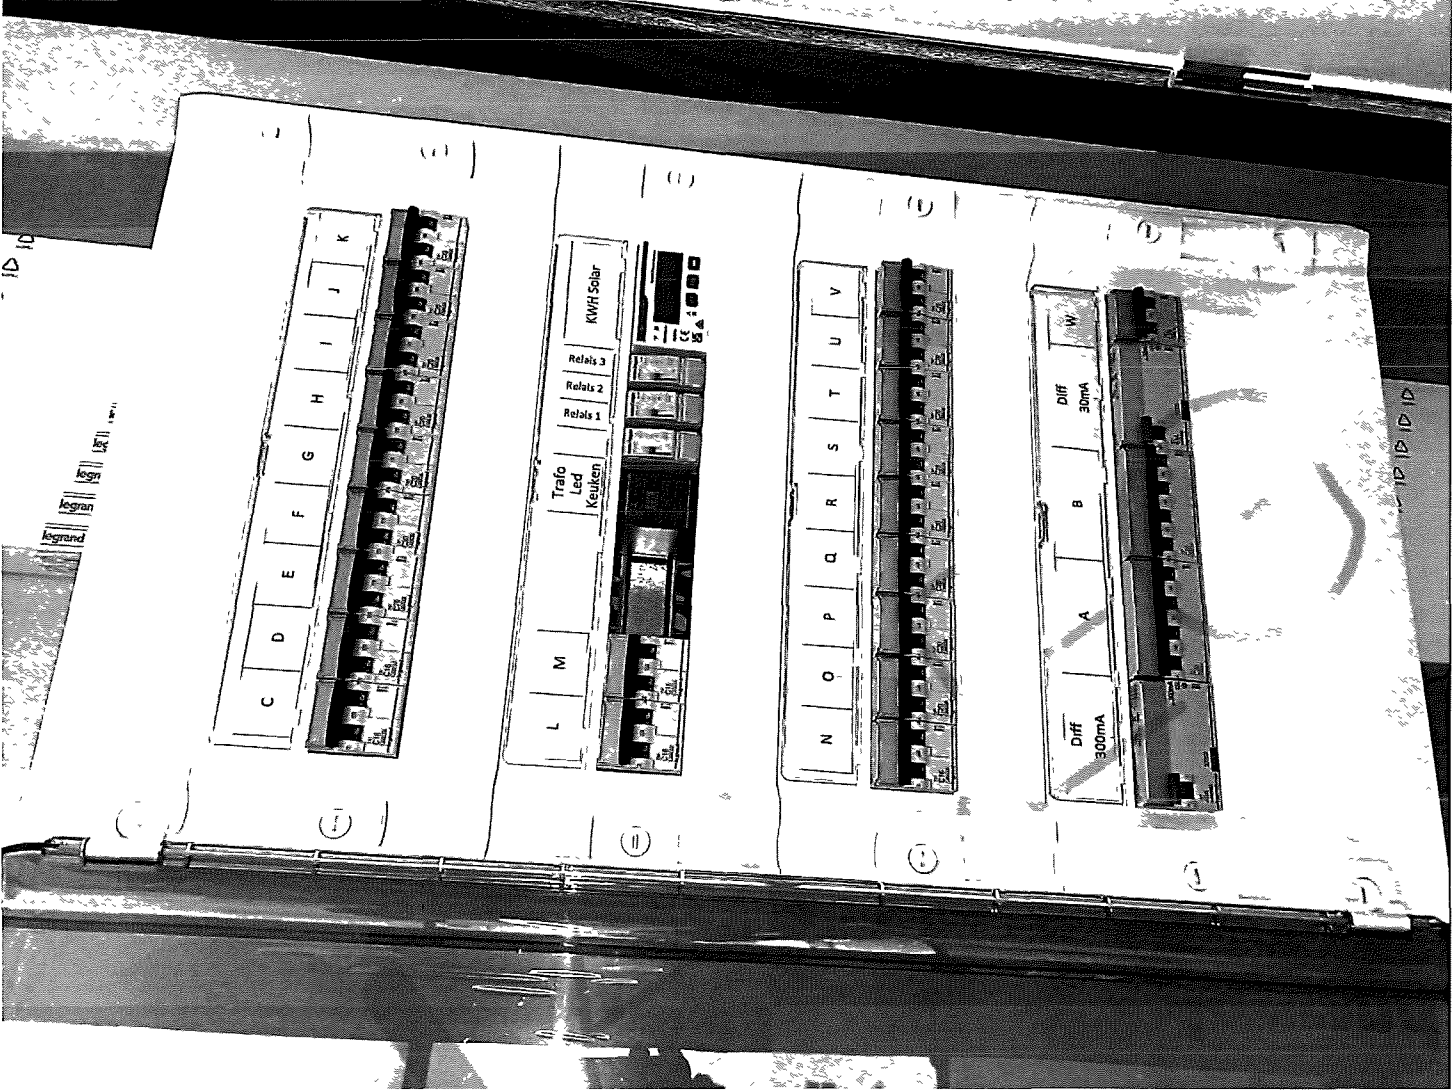


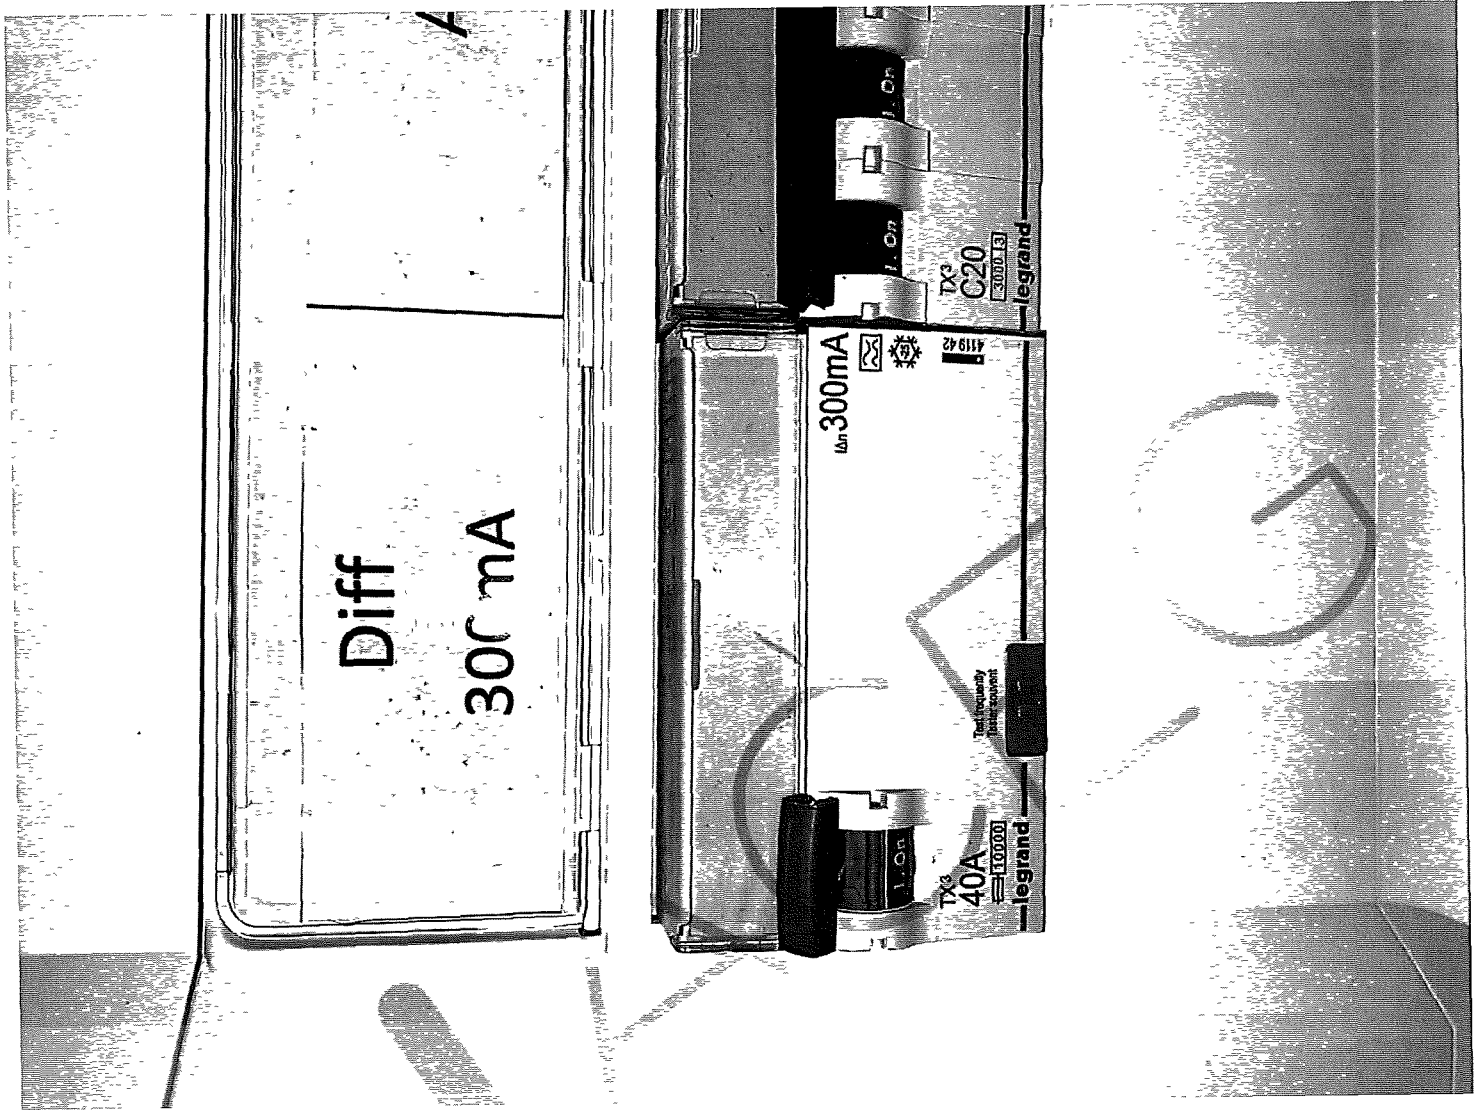

Rapportnummer 1208775

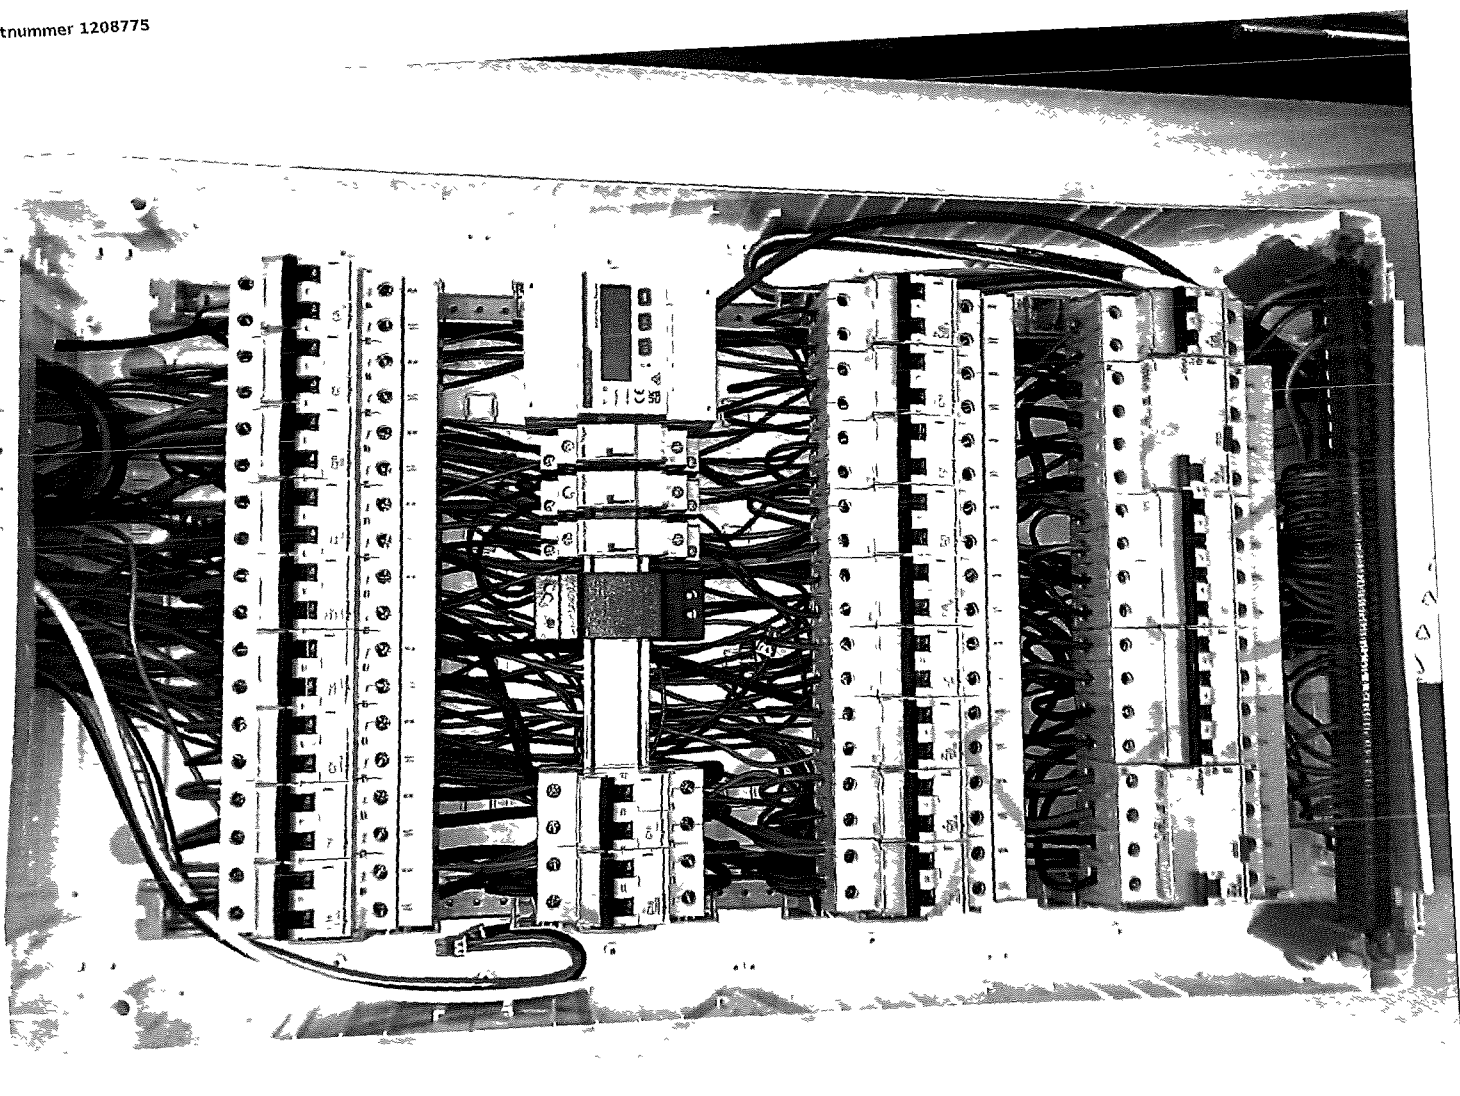



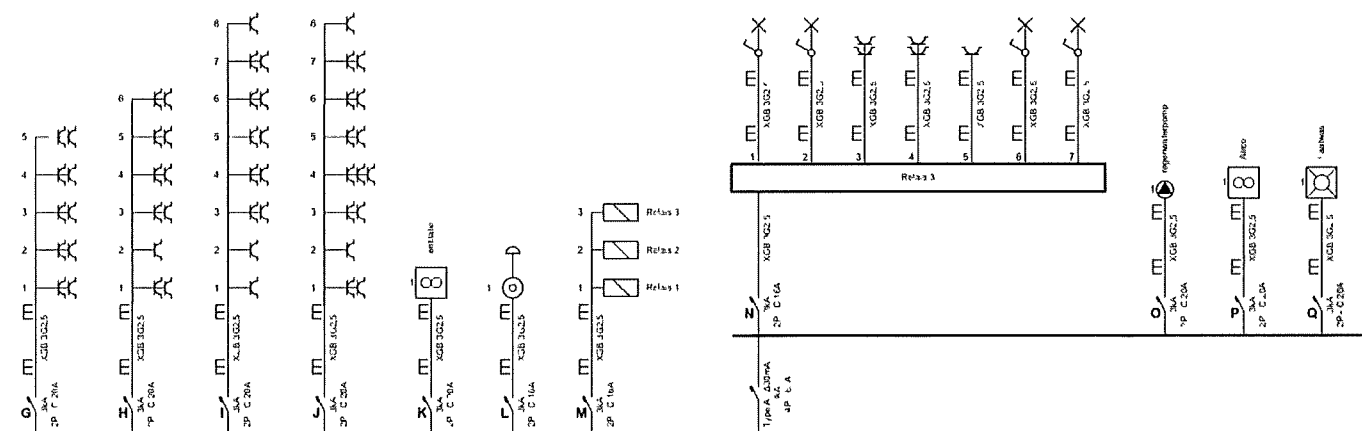




QACFG 176
 Sabri Cingöz
 28/07/2023


Plaats van de elektrische installatie
Kopert 55
Kerkmansstraat Links
1633 Houtveen


**Instalataur
Pinduss**
Eskandreef 14
3570A Ben
Tel 015 25 46 75 GSM 0
e-mail kun@pinduss.com
BTW BE 0743 636 741

p. 29
Eन्द्रादसर्चना

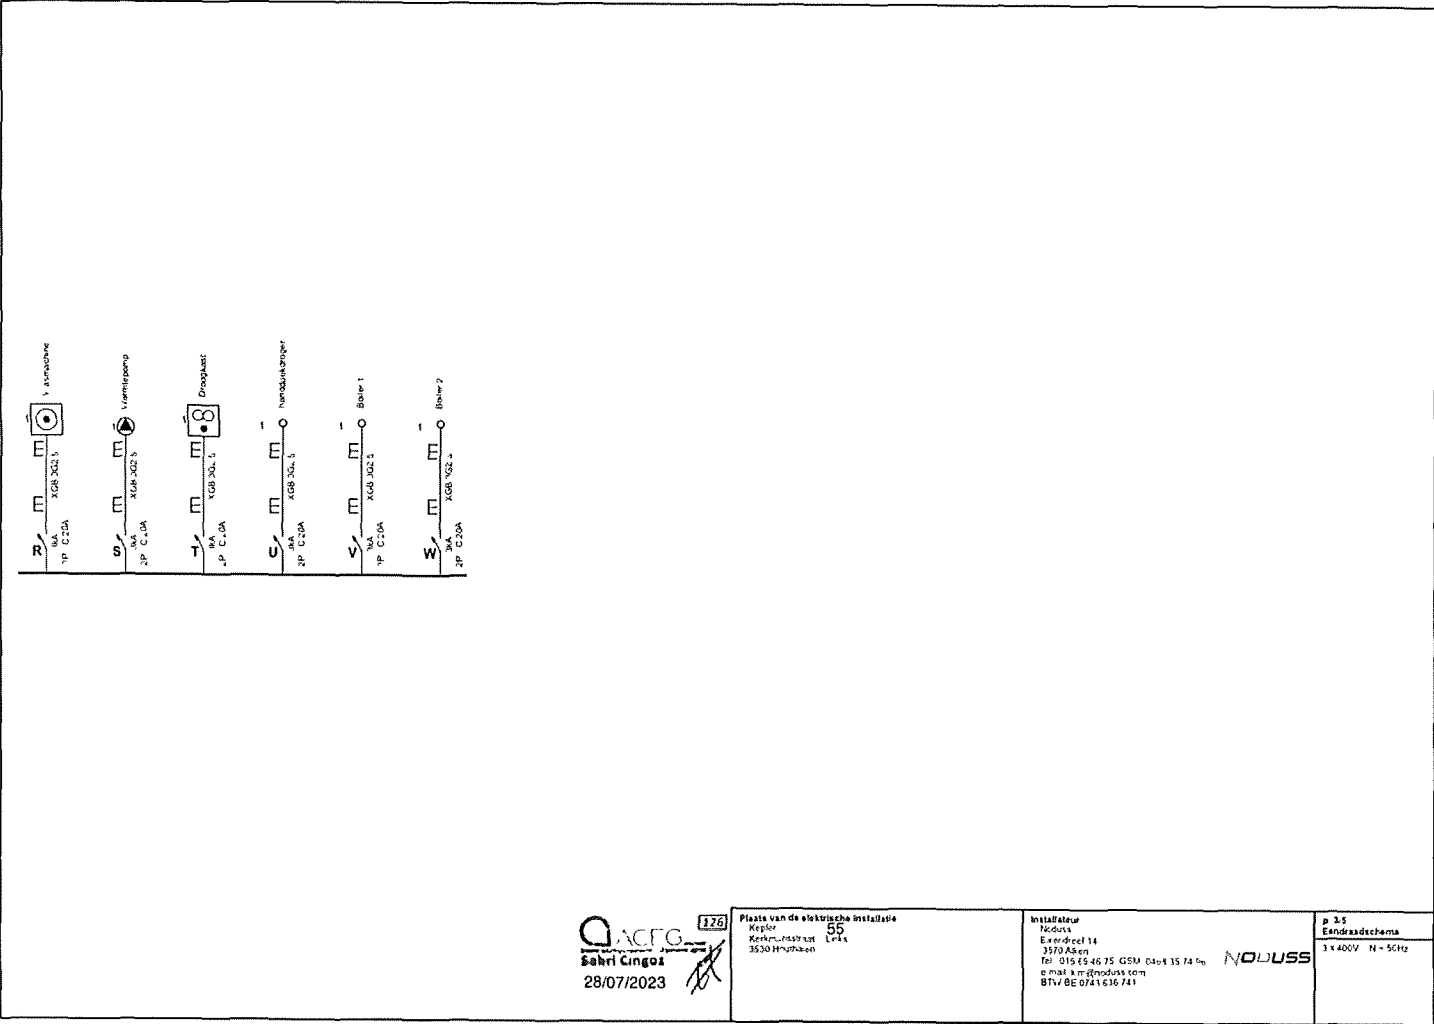

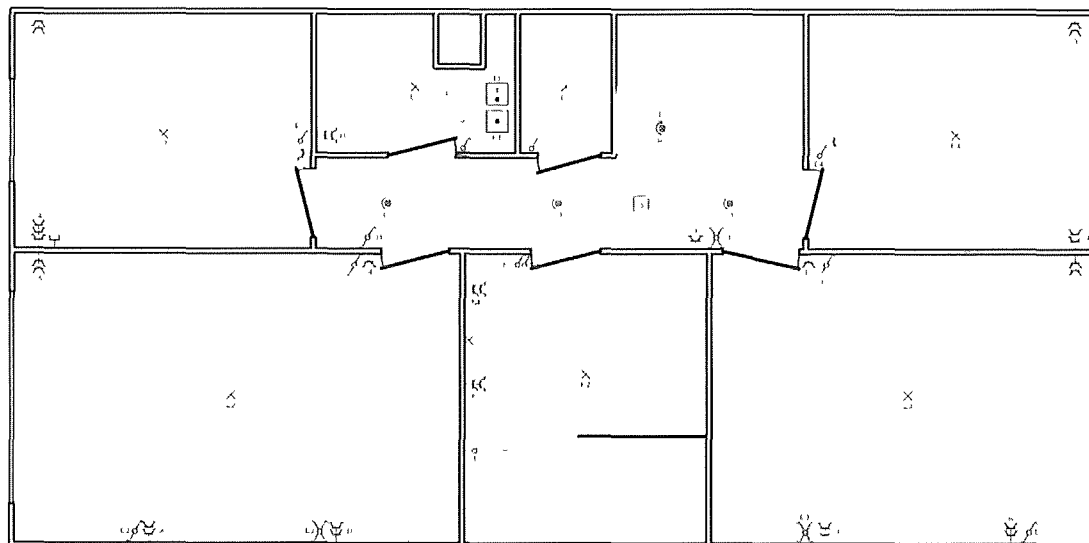[illegible]



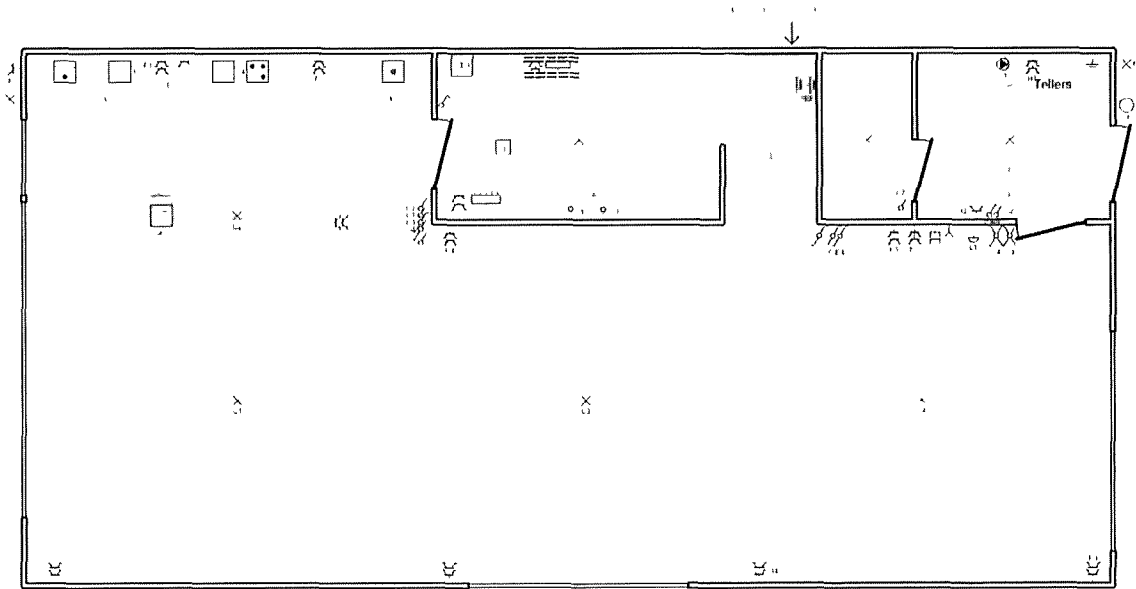

DACTU 126
Gabriel Congoi
28/07/2023

Plaats van de elektrische installatie
Formaat: 65
Kleur: wit
352718-01-00

Installateur
B-0000
Econostall 14
3573A000
Tel: 016 65 46 75 P. 511 016 4 13 74 14
e-mail: km@econostall.com
BTW BE 0711 017 741

p. 43
Situatieschema
1 x 422 / 11 5, 112

