

## DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN  
T: 03 216 28 90, E: [btv.antwerpen@btvcontrol.be](mailto:btv.antwerpen@btvcontrol.be)


Verslagnummer: 0083-180405-02 Datum van het onderzoek : 05/04/2018  
Extra controle datums

### ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : ██████████  
BAKLAAN 3  
2830 TISSELT

Visualisatie van de installatie

EIGENAAR : ██████████  
Adres : BAKLAAN 3  
2830 TISSELT

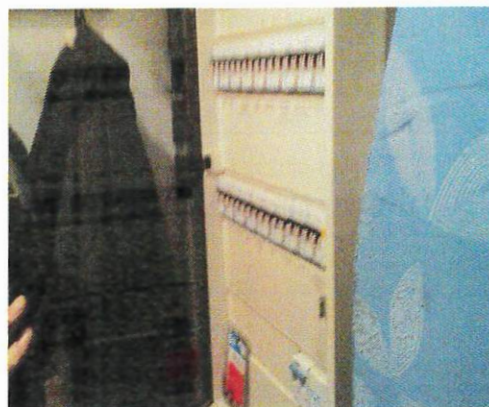

OPDRACHTGEVER : SBR  
Adres : KLEIN-MECHELEN 70  
2880 BORNEM

INSTALLATEUR : SBR  
Adres : KLEIN-MECHELEN 70  
2880 BORNEM

BTW of IK : BE 0826.134.845

EAN : Teller nr. 12728816 Index : 61811 / 55634

### ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie / Uitbreiding /	Type der Lokalen :	zonnepanelen
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	4 x 10 mm <sup>2</sup>	Bescherming van de aansluiting :	40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	1
Uitwendige invloedsfactoren :	NVT	Schema :	TT

### ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,  
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

### METINGEN:

RA: 6 Ohm RI tot NG MOhm

**BESCHRIJVING:**

Zie schema  
 Het vermogen van de panelen: 19 x 310 Wp = 5,89 kWp (DC)  
 Het max. AC vermogen van de omvormer(s) : 1 x 4000 W = 4 kW (AC)  
 Merk, Type en serienummer van de omvormer(s): SOLAREEDGE SE4000 nr. 7313DCD-3B

**VASTGESTELDE INBREUKEN**

Geen

**NOTA'S**

- 1 Er is geen isolatiemeting mogelijk door de aanwezigheid van elektronica.
- 2 De werkingstest van het ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.
- 3 De overeenkomst tussen de karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot de controle.

**Besluit** De installatie is conform.  
 De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.  
 De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.  
 De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 05/04/2043 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,  
0083 JOHAN SEGERS

voor De Directeur,

**UITGEVOERDE CONTROLES**

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
- b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging,...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden,...;
- c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
- d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de eigen testinrichting;
- e) de controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
- f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de klasse 1
- g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
- h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.  
 Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

**PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS**

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.


**WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS**



19 Modules  
IBC Monosol 310Wp

Totaal 5890Wp

Array1  
1 String van  
19 modules

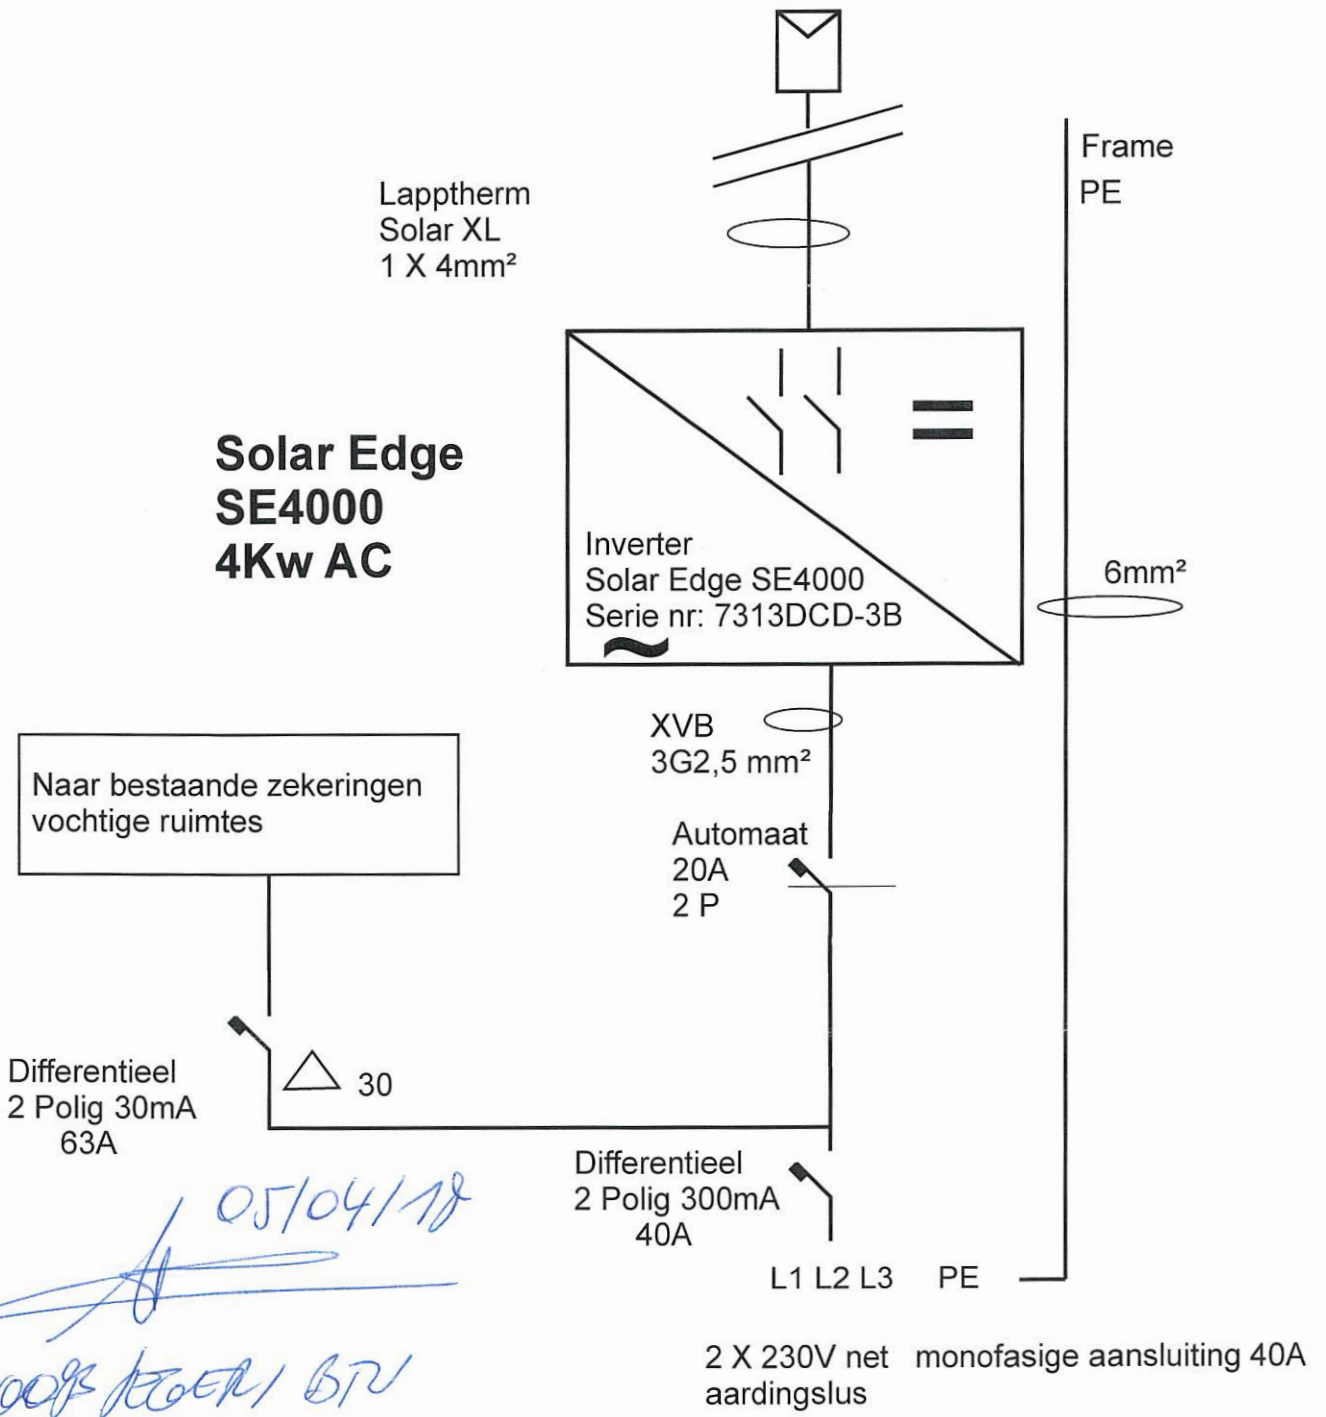

Datum: 04/04/2018	Klant:	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>
BTW nr: BE0826.134.845	Installateur :	SBR bvba Klein Mechelen 70 2880 Bornem 0472 58 51 90
