



A 0350134

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur :

Adresse :

Organisme de contrôle :

Référence :

Inspecteur :

Tél :

Installation contrôlée :

Adresse :

Date du contrôle : 16/06/2017

L'habitant est : ☒ propriétaire ☐ locataire

L'attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 : ☒ est présente N° : 1451228 ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Honeywell N° : 3783-1154 Index : 0.115

Pression de service de l'installation intérieure : 21 mbar

Appareils d'utilisation :

Type

Marque

Puissance nominale

Nombre : 1

1

Jouet CO

VALANT VCK PL 14/13-3

24 kW

2

3

Conclusion :

L'installation neuve :

- ☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

- ☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :

- ☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et est techniquement sûre.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées :

Date : 16/06/2017

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

NAF 3001PR-v5

EXEMPLAIRE : Blanc - GRD Rose - Client Jaune - organisme de contrôle



Je soussigné : Nom Prénom
Représentant de l'entreprise N° de T.V.A.
Rue N° Boîte
Code postal Localité: Tél : Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :
Adresse + Tél.

installation neuve / partie neuve d'installation (~~barrer la mention inutile~~) suivant le plan ci-après

installation neuve / partie neuve d'installation (indiquer la mention inscrite sur le plan) N° Boite Étage

Code postal : Commune :

Code postal : N° du compteur :


pour le compte de : Nom : Prénom :
A.D. Boite :

N° Boîte

Code postal : Commune :

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air pour la combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
- avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réserve à l'installateur : Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel », <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non Si oui : n° Cerga :	Réserve au GRD:	Date : Signature + nom: 
---	--	---

Annexe(s) :

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.



ORES



ÉTANCHÉITÉ DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE GAZ NATUREL

N° TTG : 1538533

INTERVENTION / MISE EN SERVICE

CLIENT	INSTALLATION (si différente du client)
NOM, prénom : <u>Bottamon Benjamin Carl</u>	Adresse :
Adresse : <u>Rue des Sources, 61, 30000 Lamoignon</u>
COMPTEUR	COMPTEUR ENLEVÉ (à compléter uniquement dans le cas d'un remplacement)
Marque : <u>Honeywell</u>	Marque :
Calibre : <u>G4</u> Année : <u>2019</u>	Calibre : Année :
Numéro : <u>3783-1654</u>	Numéro :
Index : <u>0</u>	Index :

Relevé après 10 min : 160 Litres

Remarque : L dL

Relevé au début : 160 Litres

Débit/10 min : 0 Litres $\times 6 \rightarrow$ 0 Litres/heure

1. L'installation peut être mise en service

☒ Installation étanche

☐ Un léger manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite ≤ 6 l/h).

L'installation est mise en service ; cependant, le client doit impérativement et dans les plus brefs délais rechercher l'origine de la fuite sur l'installation intérieure et procéder à la réparation requise. À cette fin, il est conseillé au client de s'adresser à un installateur habilité « gaz naturel »⁽¹⁾ (Cerga).

2. L'installation ne peut pas être mise en service

☐ Un manque d'étanchéité a été constaté (débit de fuite > 6 l/h).

Ce n'est qu'après la réparation de l'installation intérieure et un nouveau contrôle par un organisme de contrôle ou un installateur habilité qui signera l'attestation de conformité que le compteur pourra être ouvert.

☐ Une non-conformité grave avec danger immédiat a été constatée. Ce constat ne remplace pas un contrôle de conformité ultérieur par un installateur habilité « gaz naturel » ou un organisme de contrôle.

☐ Constat suite à un appel Odeur gaz (débit de fuite > 0 l/h)

Ce n'est qu'après la réparation de l'installation intérieure et un nouveau contrôle par un organisme de contrôle ou un installateur habilité qui signera l'attestation de conformité que le compteur pourra être ouvert.

3. Remarques

ok

Établi par l'agent :	Pour réception par le client final ou son délégué :
NOM : <u>L. J. J.</u>	NOM, prénom : <u>Bottamon</u>
Prénom :	Adresse :
Date : <u>6</u> / <u>9</u> / 20 <u>24</u>	Qualité : <u>propriétaire / locataire</u> Autres :
Signature : <u>[Signature]</u>	J'ai été préalablement informé par le GRD des dispositions en la matière et je confirme que l'installation n'a pas été modifiée depuis la fermeture du compteur ⁽¹⁾ . En signant le présent document, je reconnais expressément que le distributeur de gaz ou son représentant s'est bien assuré (conformément à l'article 48 de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971) de l'étanchéité à la pression de distribution de toute l'installation intérieure de gaz se trouvant dans l'immeuble dont l'adresse figure ci-dessus. Ma responsabilité d'utilisateur de réseau pourra être engagée en cas d'accident dont l'origine se trouverait sur l'installation intérieure. Je m'engage à faire remédier sans délais au(x) défaut(s) constaté(s).
	Signature : <u>[Signature]</u>

⁽¹⁾ À l'ouverture du compteur d'une installation autre que nouvelle

000 61

Schéma isométrique installation Gaz

① Compteur
Honeywell BK-G4M
N° 38834654
Index 00000, 115 M3

② Chaudière à condensation
Vaillant 24 Kw
VcW BE 296/3-S HR3

A Vanne


A-C 1 mètre
Tube acier
 ϕ

C-D 2,4 mètres
Tube cuivre
 $\phi 22$

D-E 4,4 mètres
Tube cuivre
 $\phi 22$

E-F 3,3 mètres
Tube cuivre
 $\phi 15$

F Vanne + 20 cm cuivre $\phi 15$
recommandement chaudière

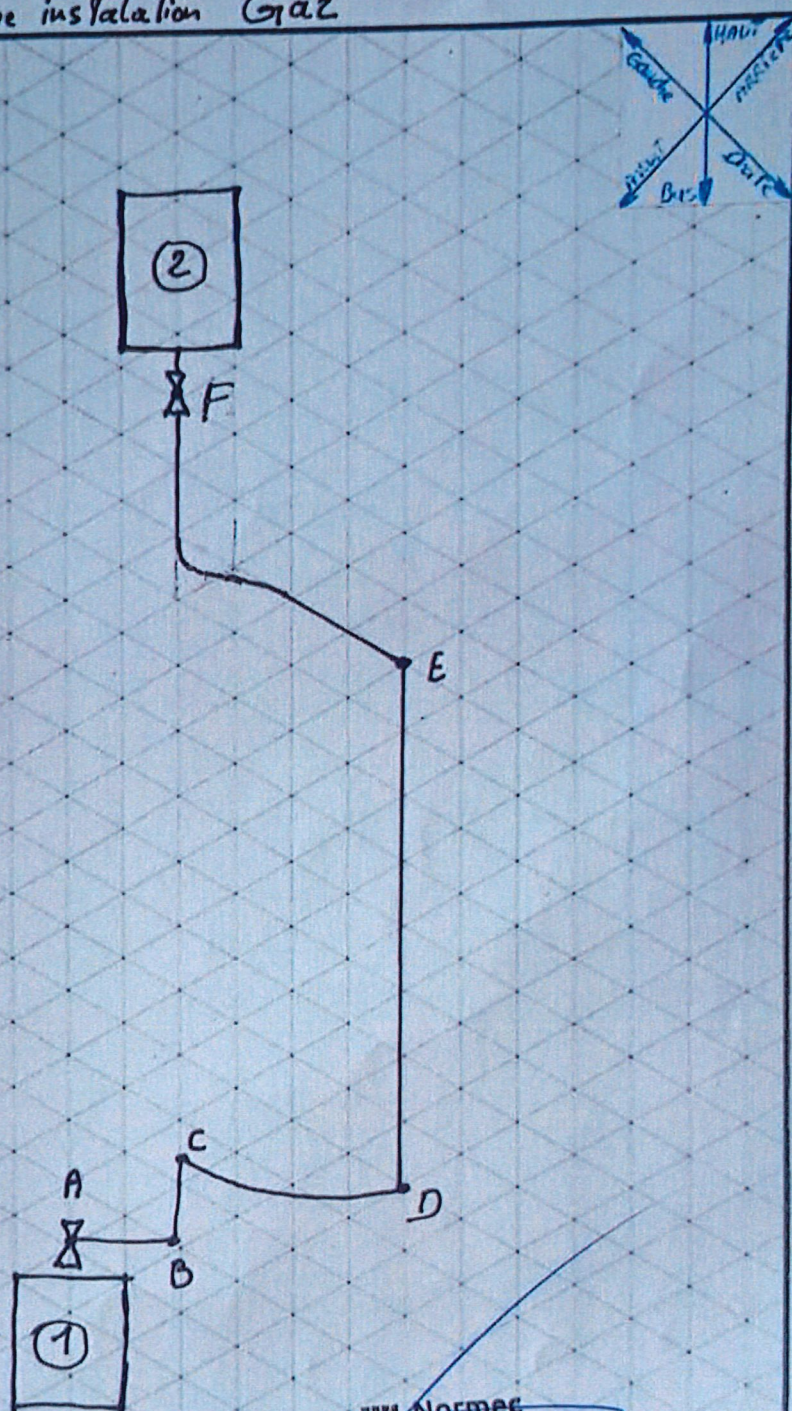

Normec
BTY

28-01-2024

ALEXANDRE FABRY
551

Adresse de l'installation	Compteur	Instalateur
Rue des Fossés Fleuris Cot Saux Namur	Marque: Honeywell BK-G4M N°: 38834654 Index: 00000, 115 M3	Batterman Cael Mise en conformité
