


TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

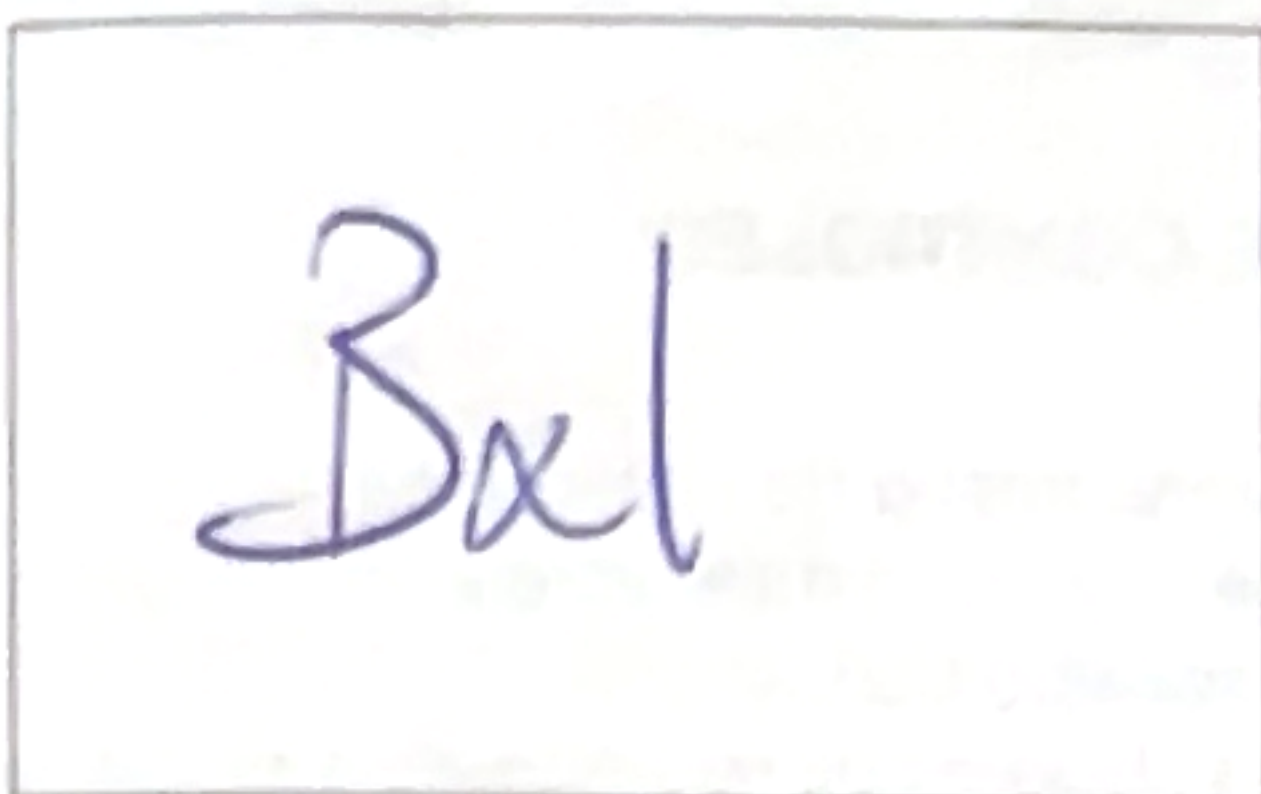

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.

18/140120/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Buurt Oeverlaan 6

399 Oeverlaan

EIGENAAR: _____

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: idem

Adres: idem

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 61476886

Index: _____

Datum van het onderzoek: 20-1-2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

~~(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)~~

Aard installatie: Nieuwe ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~verkoop wooneenheid~~ Type der lokalen: Woning

Begin werken: ~~Fundering vóór-na~~ 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 3x230 V Bescherming van de aansluiting _____ A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type 401901

Type van de aardelektrode: ~~las~~ ~~beren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~ Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 20; RA: 27 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: Geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20-1-2039 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

De directeur,
