

3480723



VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001
volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Voortopig / Bestaande / Verzwaring / Splitsing meter / Spanningswijziging / Verkoop wooneenheid

Type der lokalen :

Plaats van onderzoek :

Eigendom van :

Opdrachtgever :

Installateur :

BTW : ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Datum van onderzoek :

Datum :

BESCHRIJVING

Dienstspanning :

Hoofdbeveiliging :

Meter-bordverbinding :

Voedingsbekabeling :

Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net - Wachtbuis :

Aardelektrode :

Aantal borden :

Diff. schak. :

1 x 230 V 3 x 230 V 3 x 380 V + N

Zek. : 1 x 16 A - 1 x 6 A - 1 x 10 A

aantal geleiders : 4 x 16 A

aantal geleiders : 4 x 16 A

Type : lus / baren / pennen / horizontale geleiders

Aantal eindstroombanen :

algemene : 1 x 16 A - 1 x 6 A - 1 x 10 A

werking testknop : in orde - niet in orde

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - neen

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend - toestellen :

Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

Sean in breed

BESLUIT

De installatie is conform / niet conform met het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd - door dezelfde organisatie - uiterlijk op : 16/11/2010
zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie mag / mag niet in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker


erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

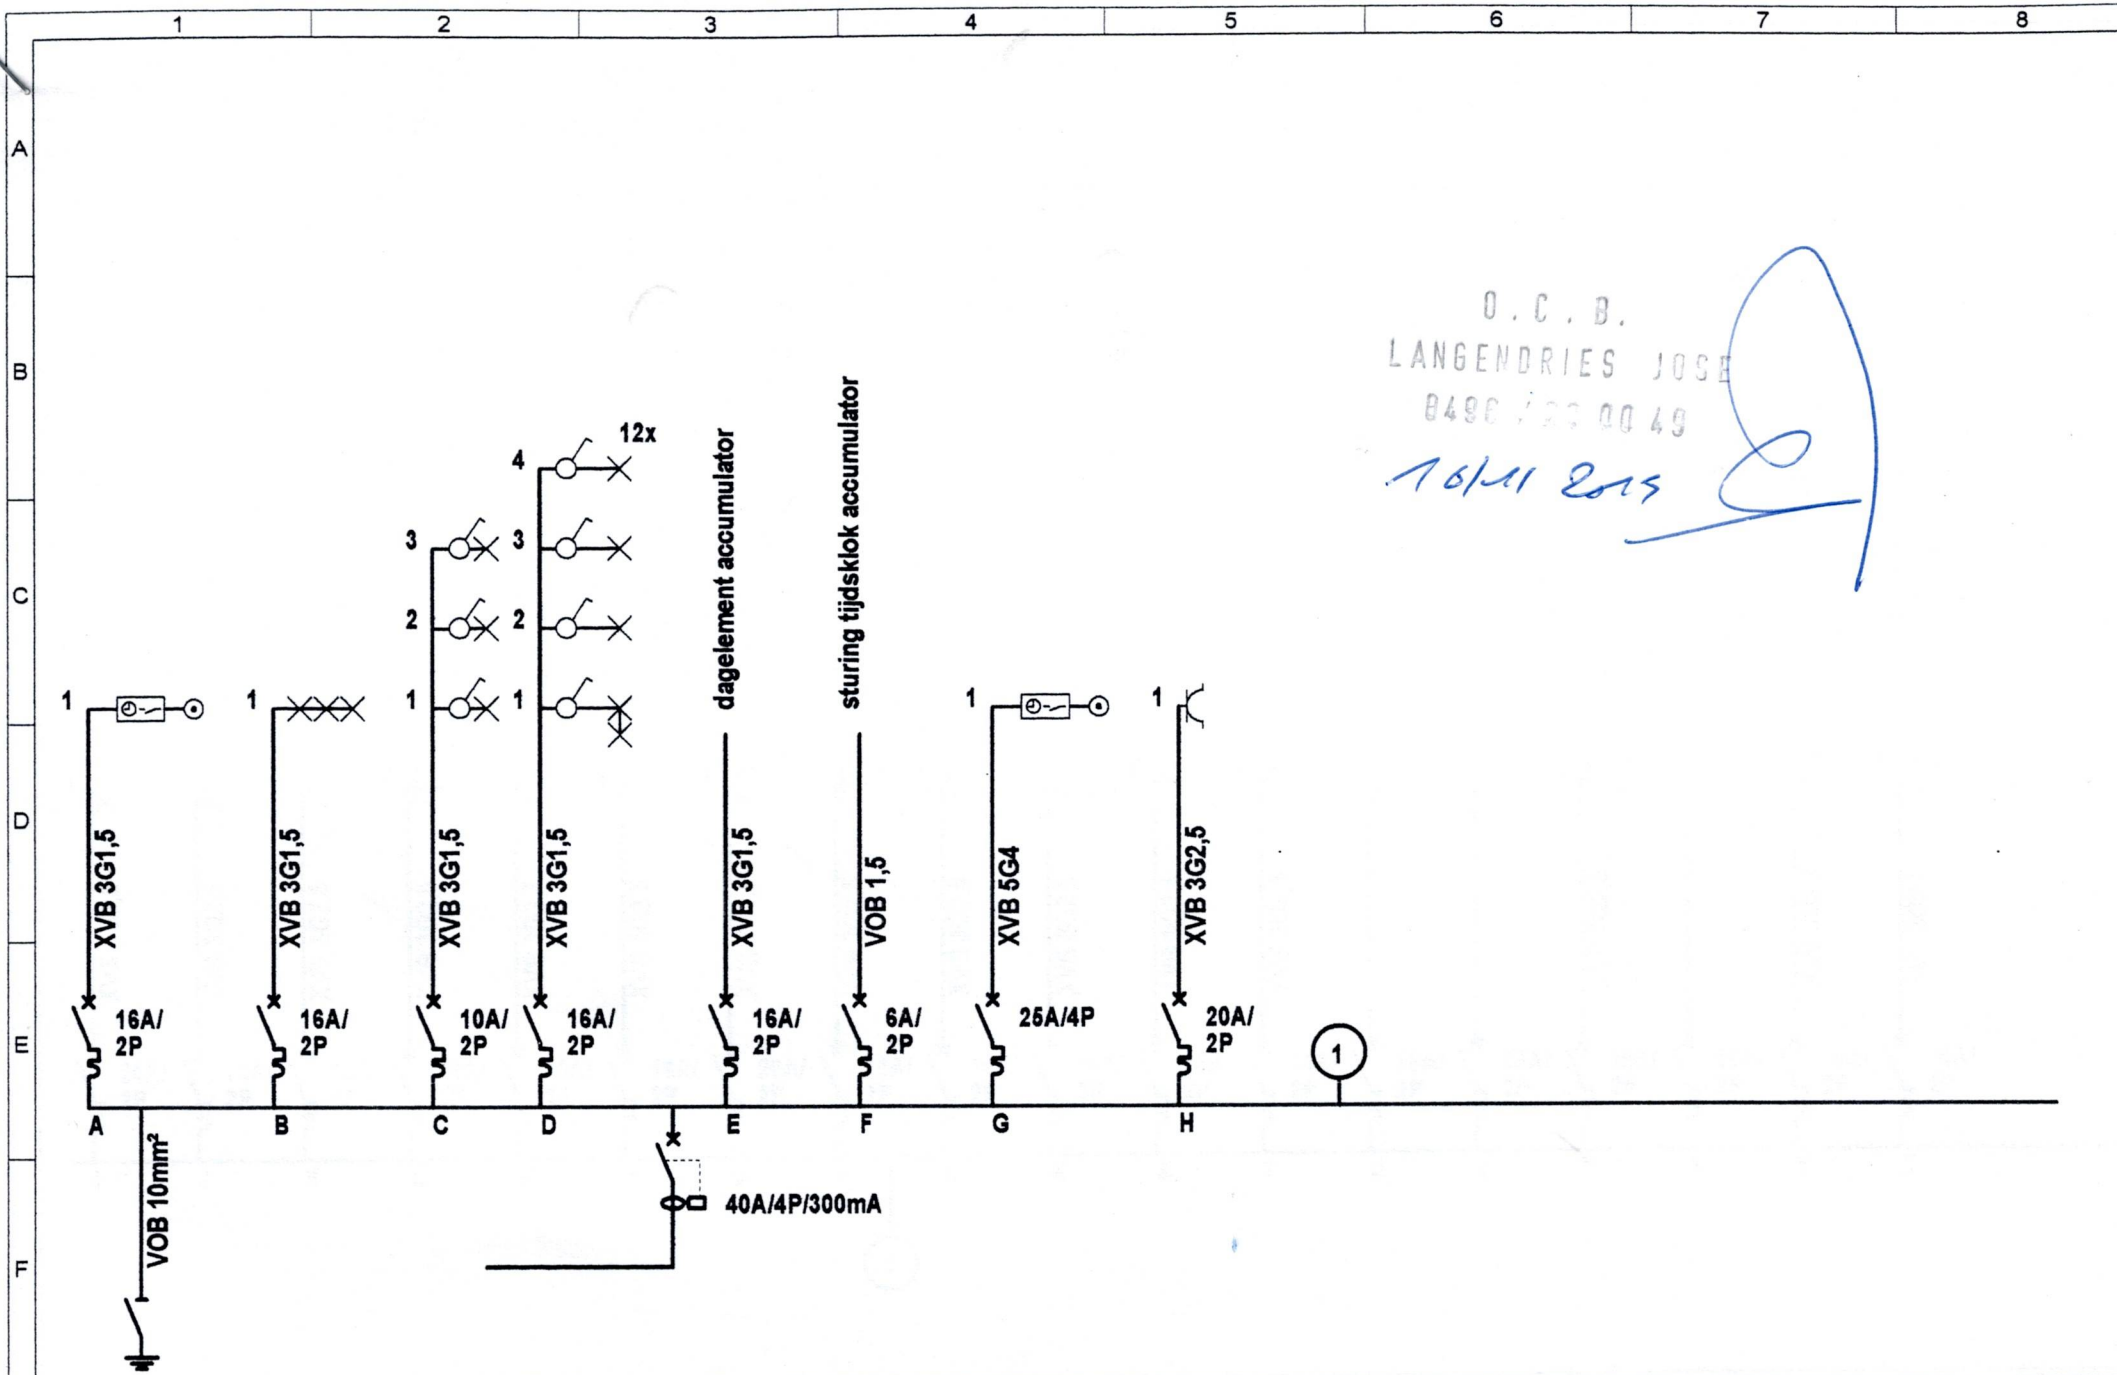

O.C.B.
LANGENDRIES JOSE
8496 / 23 00 49

16/11/2015

[Handwritten signature]

Titel van het bestand	woning Schrieksebaan 71 Tremelo	Ontvanger	Datum	Wijzigingen	Datum besta
		Croes Eddy			4/1/15
OnderTitel van het blad	woning Schrieksebaan Tremelo Zekeringskast 1	Tekenaar			Datum blad
		Croes Eddy			4/1/15
		Verificateur			3 / 4
		Dit blad wordt door het programma SEE TECHNICAL van de groep IGE-XAO ontvengd			

HANDELSPAND
SCHRIEKEBAAN 71C
TREMEL

O.C.B.
LANGENDRIES JOSE
0496 / 20 00 69
16/11 2005

