


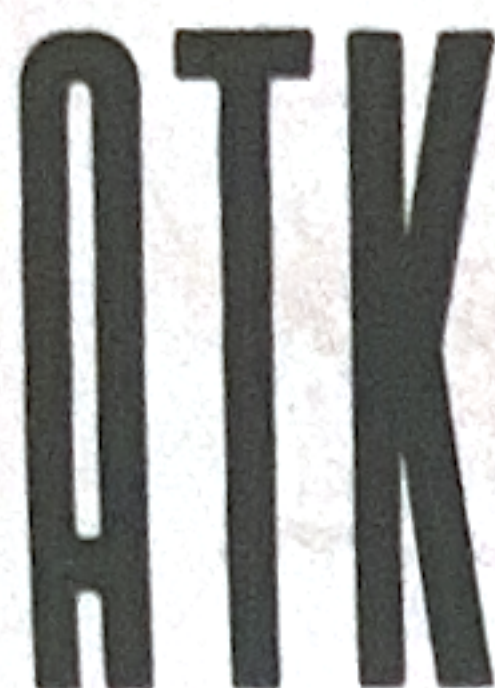

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

STROOMVERDELER :

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR PM / 07 / 625 - 10

ADRES INSTALLATIE: DR Van De Perrestraat

2440 Geel

EIGENAAR : KS Tool Sell Factory b

Adres : op cirkel

OPDRACHTGEVER : Tomotech b.v.

Adres : Deugstraat 35

INSTALLATEUR : 2867 O.L.V. Waver

Adres :

BTW of IK :

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTA

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 20/5/2007 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Handelsruimte

Aard installatie: Nieuw - Uitbreiding - Wijziging - Tijdelijk - Verzwaring -

Begin werken : Fundering vóór - na 1.10.81 ; Installatie vóór - na 1.10.81 - ; Met Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86-87

Aansluiting: Spanning 3x400+N V ; Bescherming v/d aansluiting: Max 40 A ; Alg. schakelaar: type: ADS 40A/0.3

Netaftakkabel (type & sectie): nog te zien mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): XVB 4x10

Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepte aarding ; Aardverbindingssysteem: TT TN IT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 3 ; Spreidingsweerstand : 3,1 Ohm ; Alg. Isolatie niveau: 100

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

4 PADS 40A/0.3 A - 0 k - A.B.C

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270

en de technische procedure(s) TPR-E12 - E32.1

De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja - neen

De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja - neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: Geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Voorlopige keuring voor plaatsing definitieve tellingen

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting was - werd - verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op

(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

De installatie mag - niet - in dienst gesteld worden.

De installatie voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomverdelers.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK vzw
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Paul Michiels
