



Bien Sûr.

Bureau technique Verbruuggen asbl - www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 62 btv.bruxelles@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limbourg Tél. 011 42 18 34 btv.limbourg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaant-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN:

Ref:

Index:

Compteur n° 34206610

V. ref.:

N. Ref.:

Rapport N°:

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION:

PROPRIETAIRE:

Adresse:

DEMANDEUR:

Adresse:

INSTALLATEUR:

Adresse:

TVA ou CI:

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 02.06.2015 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: 6/10

Début travaux: Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 230 V

Protection raccordement 6.0 A

Câble aliment, tableau, princ.: 6 X 4 mm²

Inter.gén.: type 400/10,34

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 25; RA: 0.2 Ohm; RI tot 2.2 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION:

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

PLAN LES VERBAL DE CONFORMITE

V. ref.

N. ref. mat. de distributeur

ref.

signature

CONCLUSION

- ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 30.06.2017 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: 30.06.2017

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

pour Le Directeur,




* V E R S L A G - R A P P O R T *



Schema Unif. Phase (1)



01/05/2017

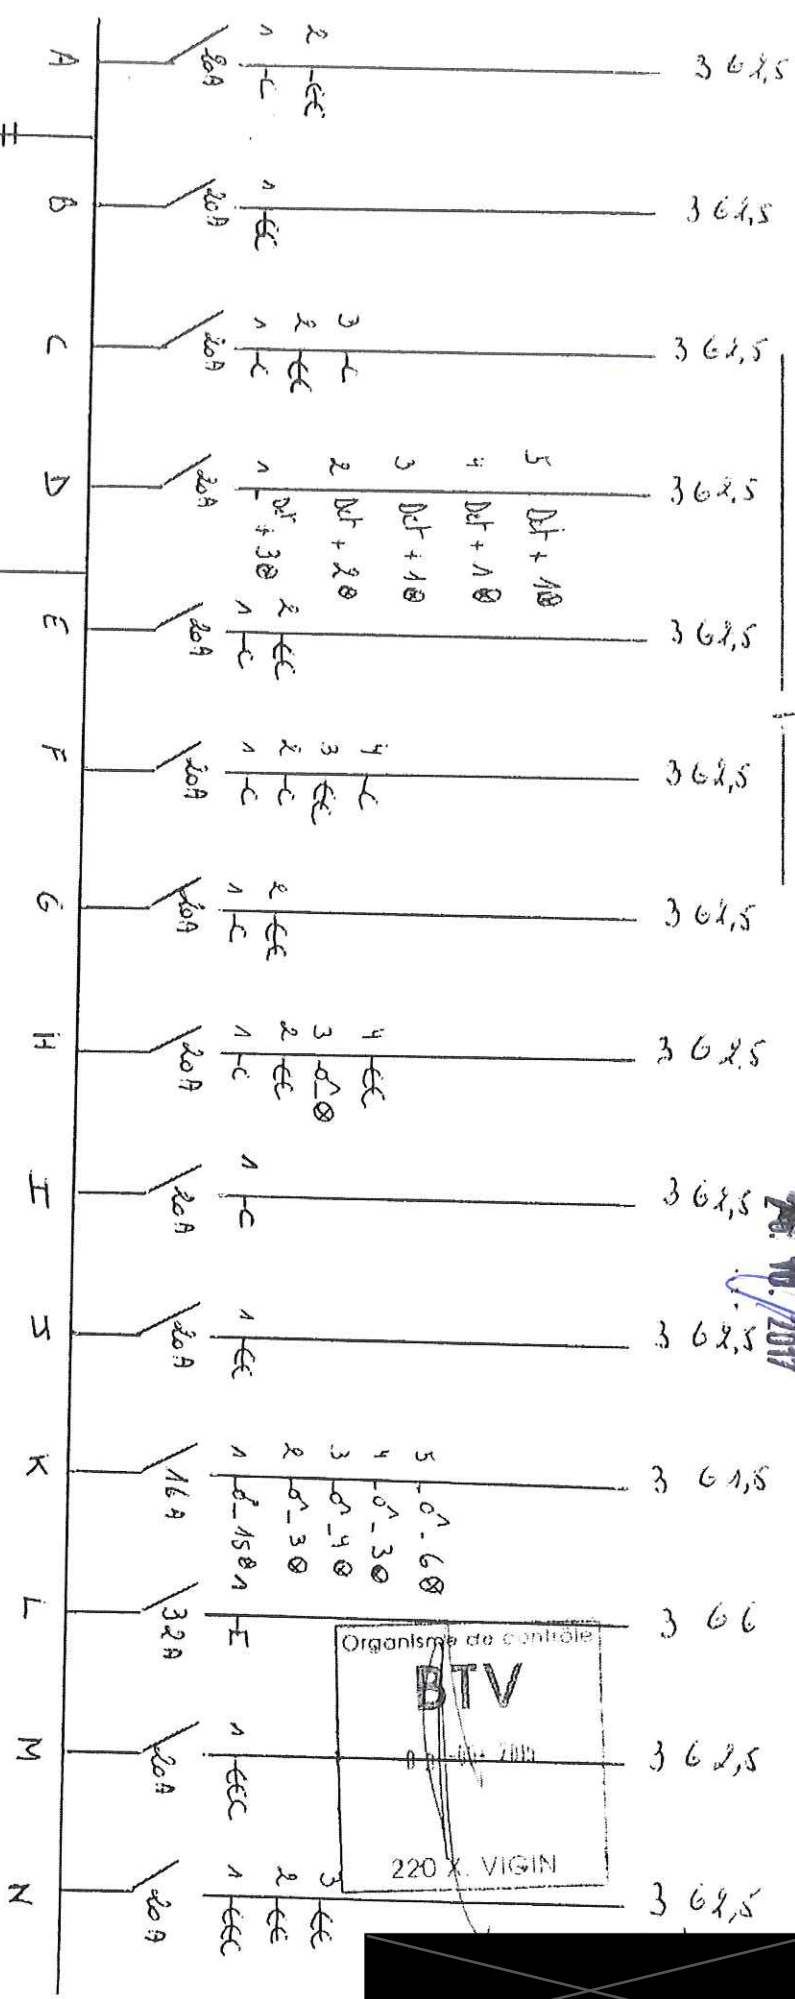

Organisme de contrôle
BTV
220 X. VIGIN

XVB 4x 10²

300 HA
40 A
30 HA
40 A.

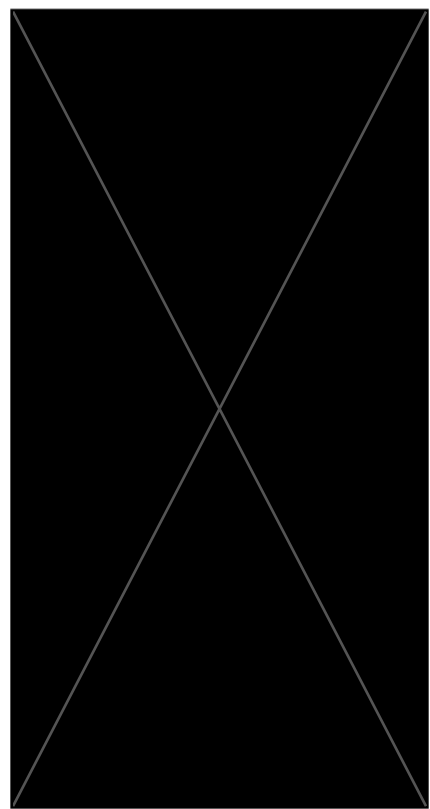

Plan Cove.

