

Resp. client:
N° commande:
N° client:
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: huguescolle@hotmail.be



Organisme de contrôle a.s.b.l.

ProKo.: LS01
N° rapport : 4786317
N° rapp. prov.:
Date: 24/04/2017

Client / Mandant :

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BT DE RACCORDEMENT DEFINITIF ou RESIDENTIEL
(exécuté sous l'accréditation BELAC suivant procédure interne QPRO/ELE/001, §7.3)

GENERALITES

Appareil/Install. ID: Type d'Installation: modification Type de locaux: Maison et gîte
Lieu de contrôle: RUE DU MONUMENT 20 RENDEUX 6987
Type de contrôle: examen de conformité Selon RGIE Art. 86/271
Date du contrôle: 10/04/2017 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant 30/04/2042 Contrôleur: BLAISE JACKY
Propriété de: -
Installateur: -
T.V.A.: - Carte-ID: - Délivré à: - Date: -

DESCRIPTION

EA n°: - N° compteur: -10491317 Index I: -37727kwh Index II: -
Raccordement: réseau aérien Fourreau: pas placé Plaque d'isolat.: présente
Tension de serv.: 3 x 220V Protection max.: 25A Protection principale: aut. 4p 25A Interr.: interr. diff. génér.
Liaison comptage-coffre de repart.: type de câble: CRVB nombre de conducteurs: 3 section: 4 mm²
Câble de raccordement au réseau: type de câble: VFVB nombre de conducteurs: 4 section: 10 mm²
Electrode de terre: type: conducteurs horiz. section: 25 mm² Résistance de dispersion: 12 Ohm
Interruteur Diff.: Général: 63A/300mA est plombé par des scelles d'OCB: pas en ordre Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Fonctionn. bouton d'essai: en ordre Contrôle boucle de défaut: en ordre Résist. d'isolem. général: 0.9 MOhm
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre Etat du matériel électrique: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre Matériel fixe et mobile: en ordre
Description - appareils: ☐ voir les schémas en annexe ☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Ne sont pas encore placés: ☐ cuisine ☐ salle de bains ☐ chauffage central ☒ compteur de gaz ☐ - d'eau
Ne sont pas encore raccordés: ☐ liaison équipotentielle principale ☐ - supplémentaire
Nombre de tableaux: 5 Nombre de circuits terminaux: 19

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

CONCLUSION

L'installation est conforme aux prescriptions mentionnées. L'installation peut être rester en service.
L'installation doit être contrôlée au plus tard à la date mentionnée ici dessus, comme prévu par l'art. 271 du RGIE, ainsi qu'avant toute mise en service d'une modification importante ou d'une extension notable, exécutées avant cette date.

Pour le Directeur Technique,


Le contrôleur

1/1


6387

~~6387~~ WARISY.


Rec du monument 20

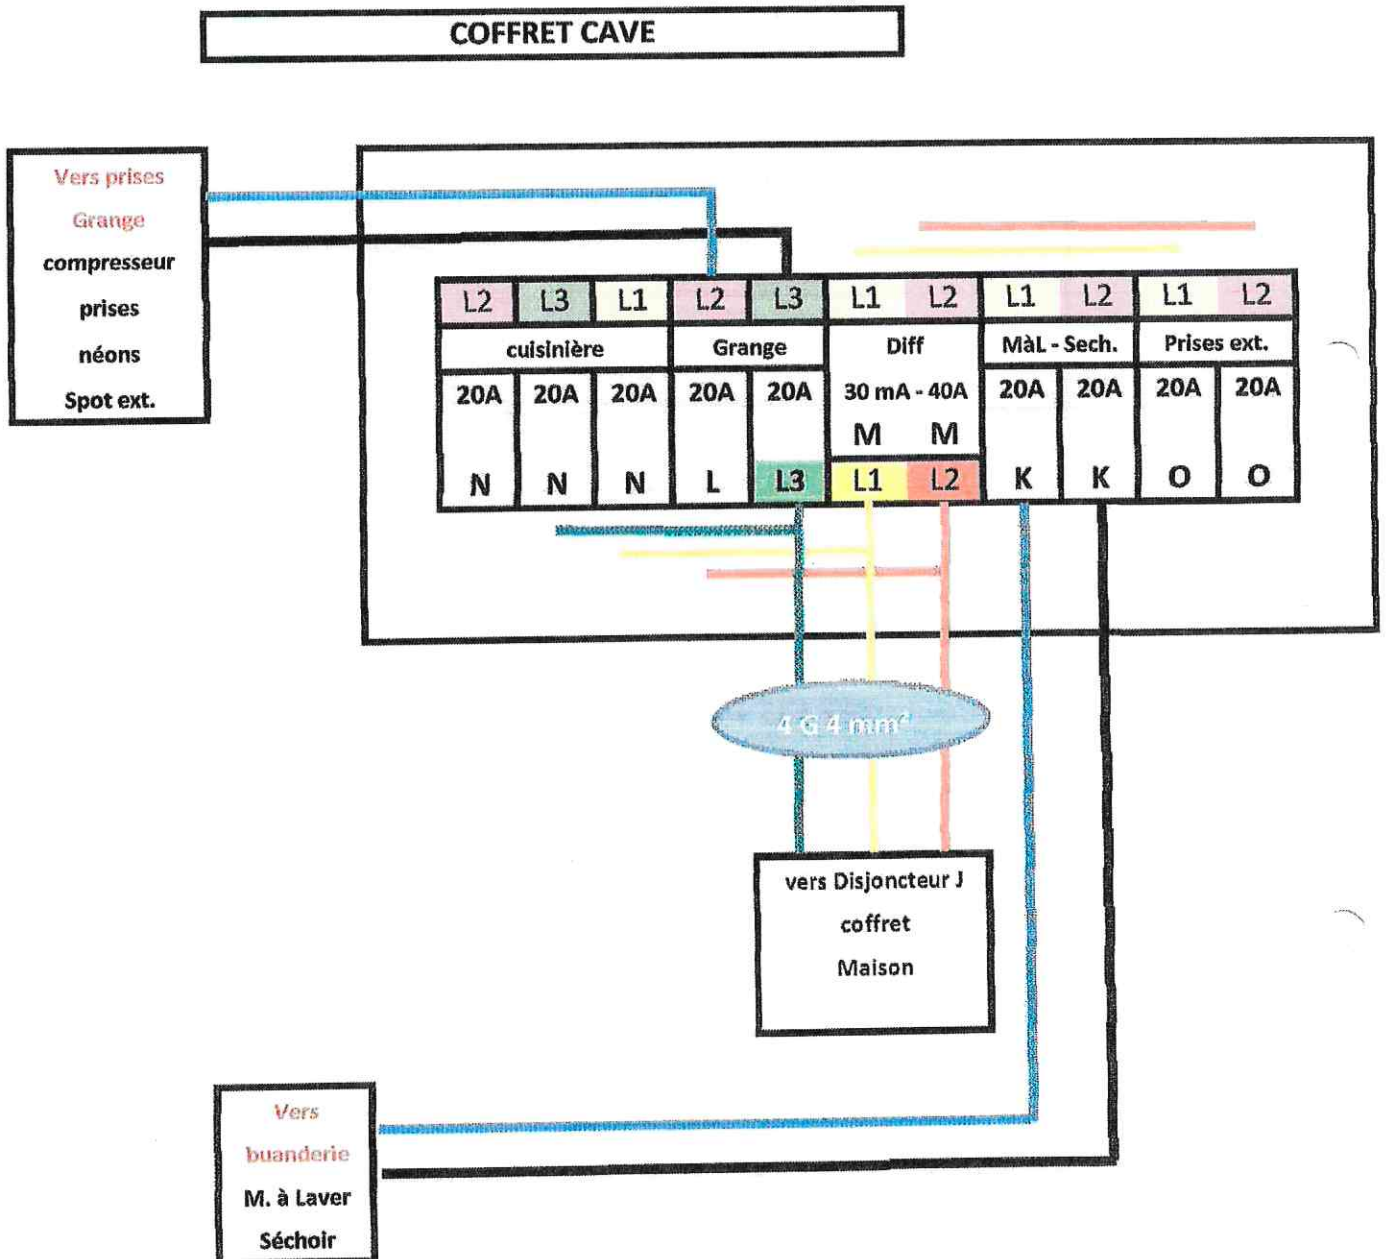


COFFRETS MAISON 1

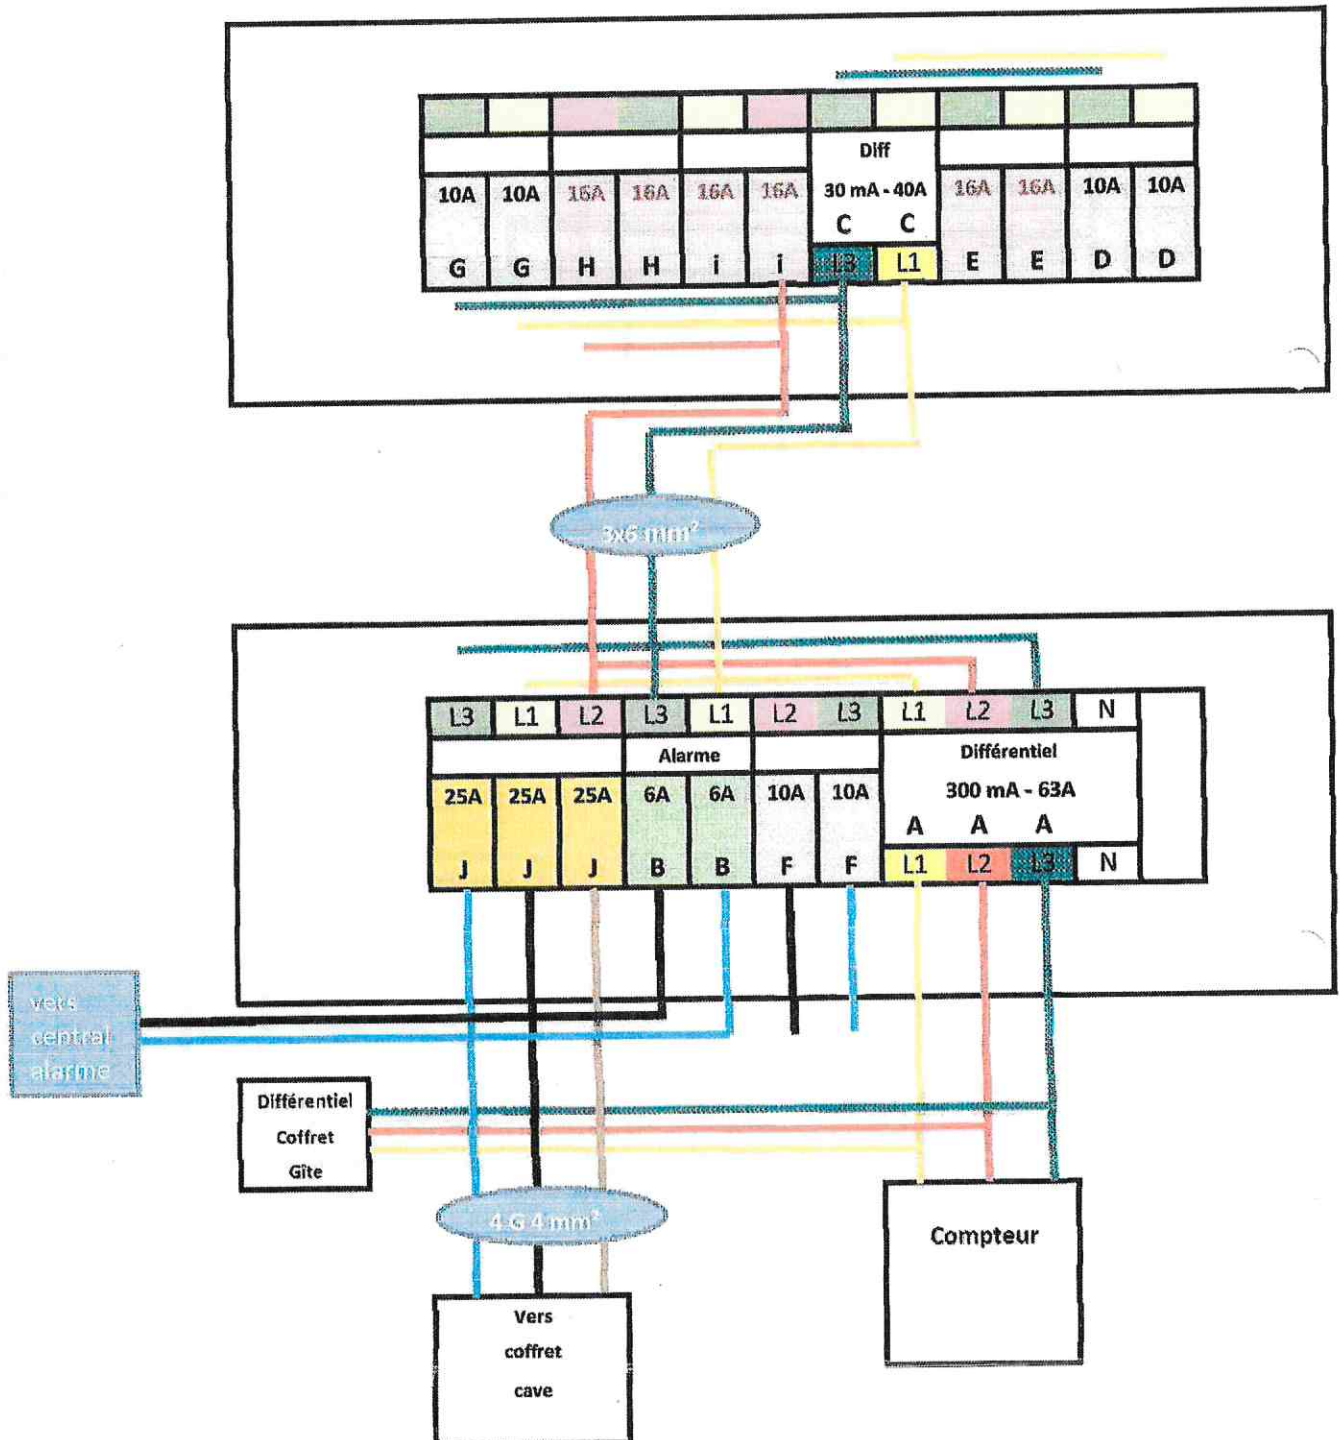


REZ

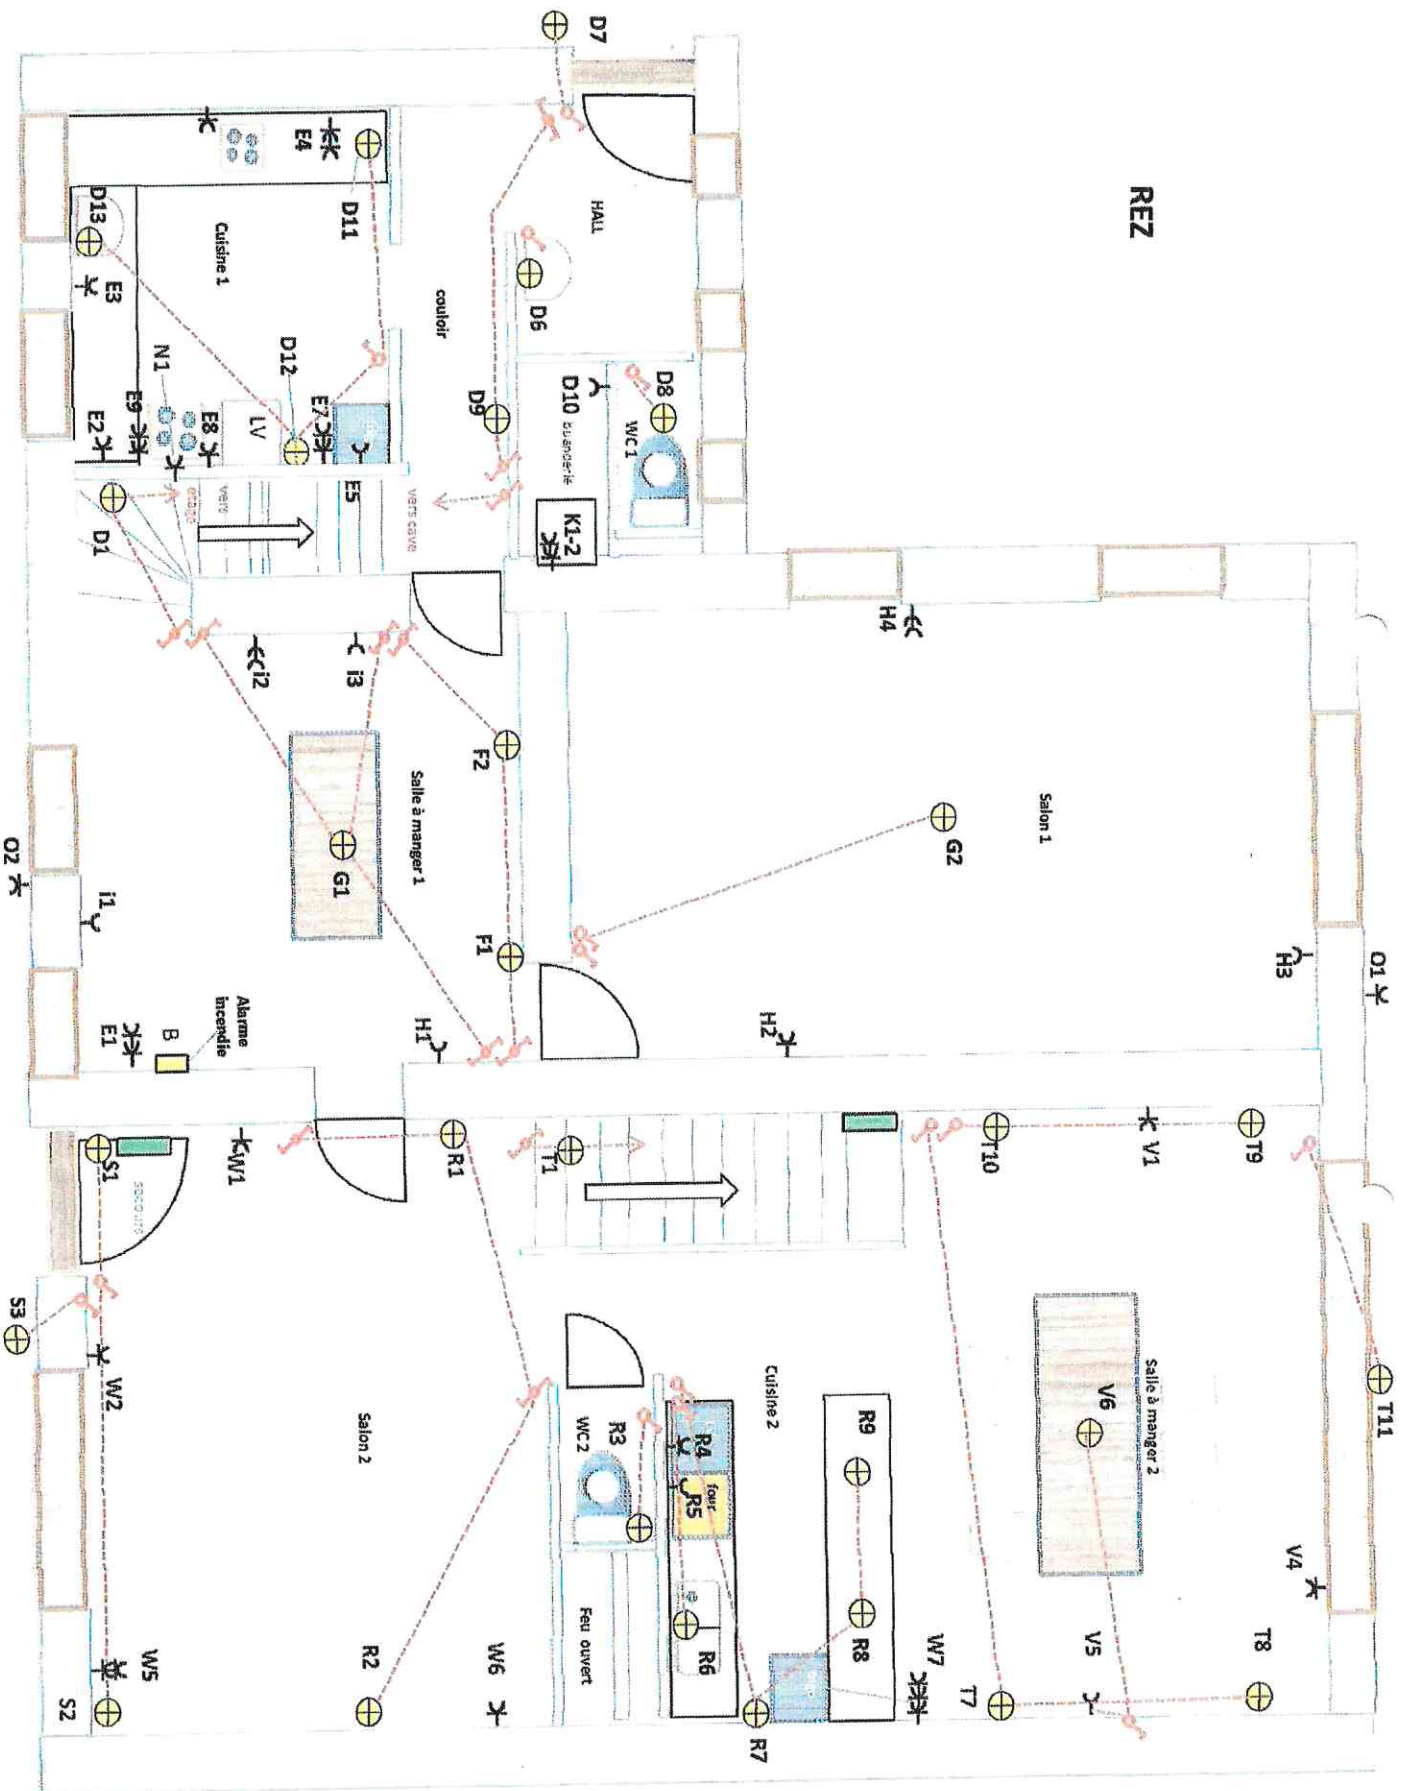

ETAGE

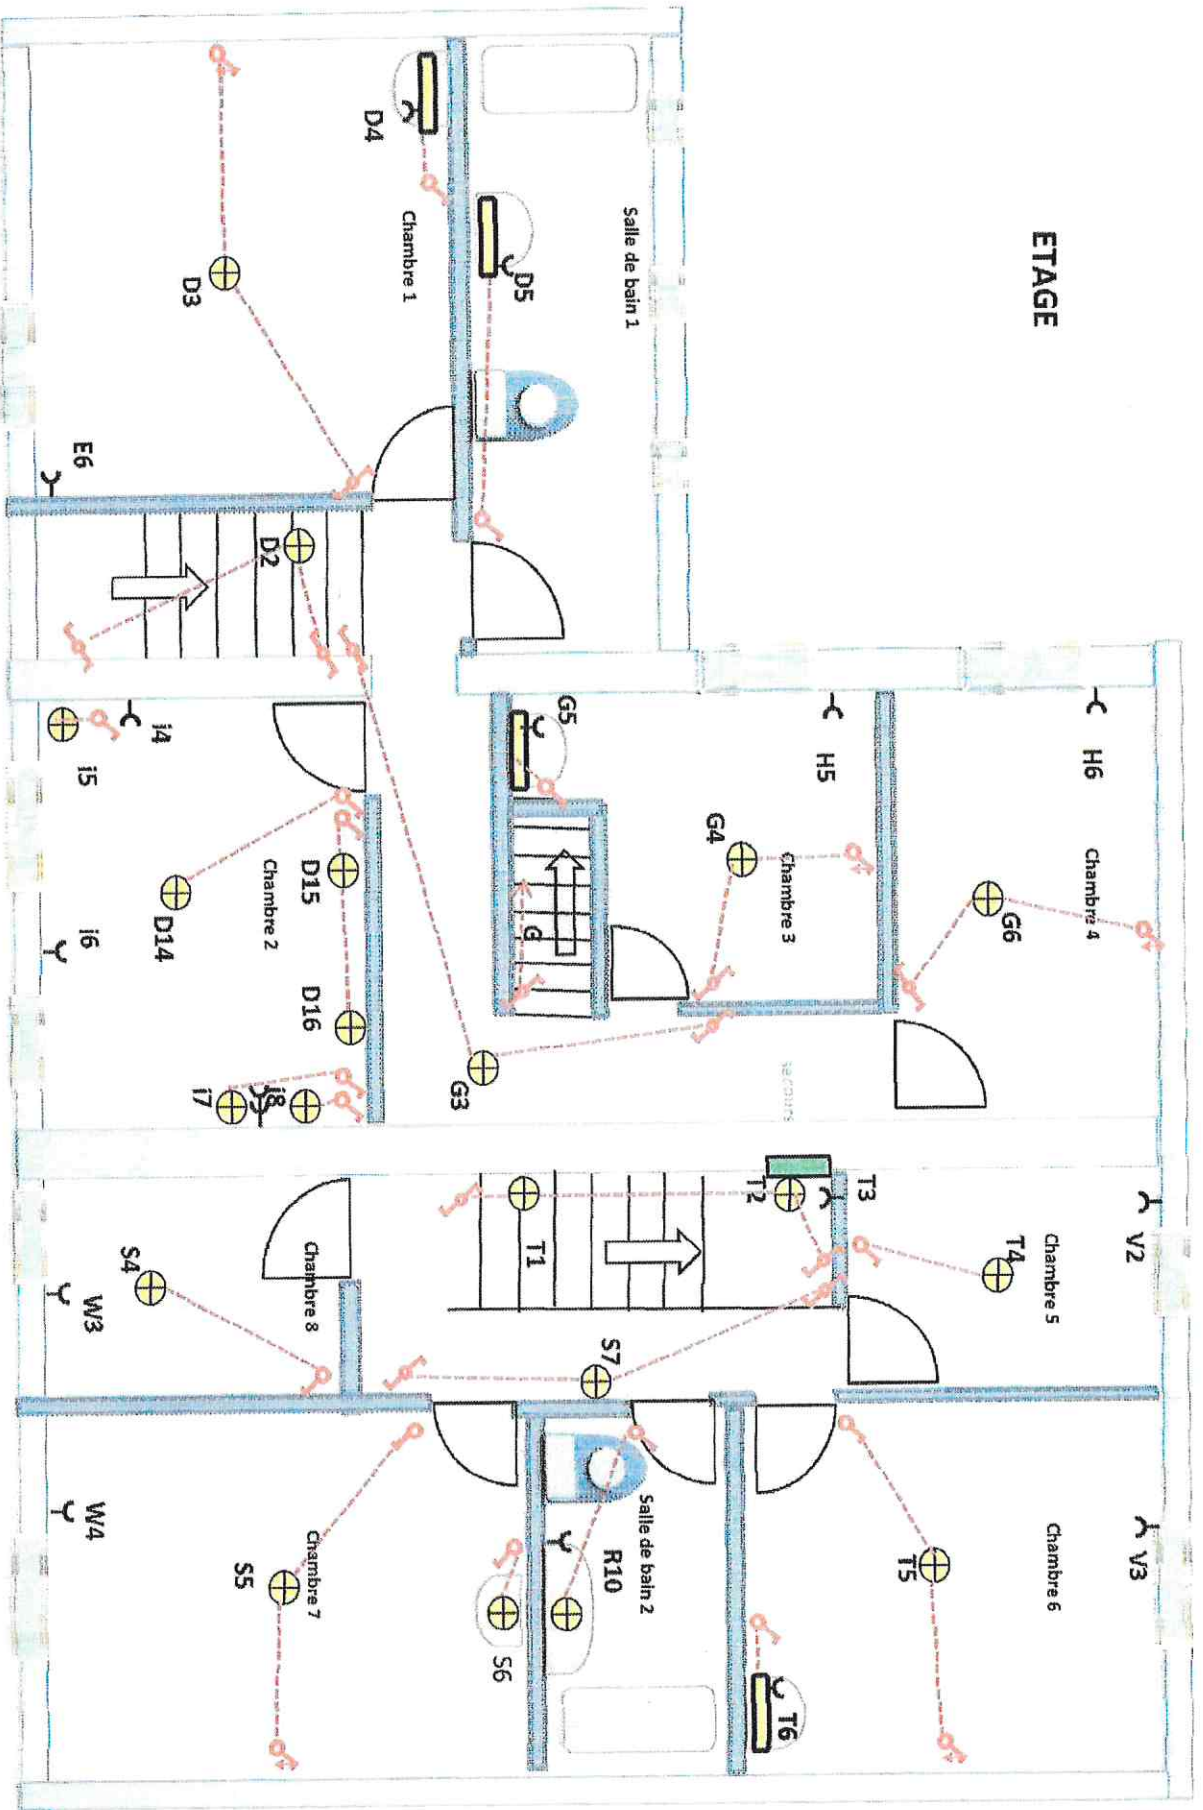

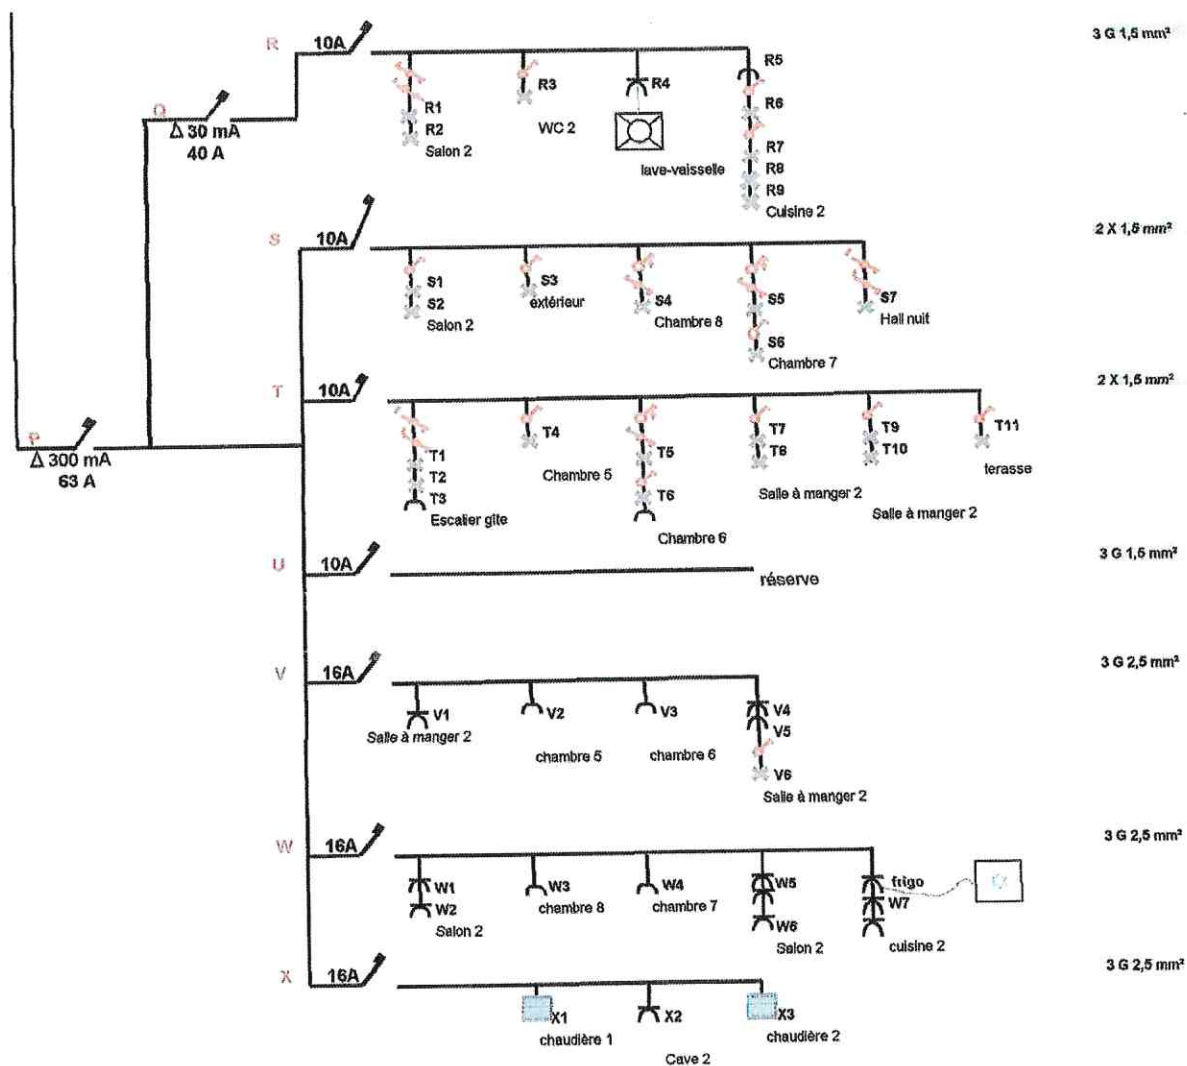

Propriétaire: [REDACTED]

Adresse: Rue du Monument 20
6987 RENDEUX

Organisme agréé: OCB

Délégué:

Signature:

Date:

Installation est contrôlée par:
OCB, Place des Jardins de Baseilles 4 boîte 23, 5101 Namur
Inspecteur: **BLAISE Jacky**
Date: 10-04-2014
PV n°: 4486317
Signature: [Signature]

