

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

STROOMLEVERANCIER:

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index :

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. :

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE :

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER:

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW of IK:

Datum van het onderzoek : 27/10/2005 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens :

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.P. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie : ~~Nieuwe~~ - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ : Type der lokalen :

Begin werken : Fundering ~~voór~~-na 1.10.81 - Elektrische installatie ~~voór~~-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V

Bescherming van de aansluiting

Voedingskabel hoofdbord : 4 X 10 mm²

Alg. schakelaar : type

Type van de aardelektrode rus ~~beren~~ ~~pennen~~ ~~horizontale geleider~~

Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 10 ; RA : 157 Ohm; RI tot 100 MOhm

BESCHRIJVING:

Vastgestelde inbreuken en/of nota's :

EROLIS-VERBAAL VAN HET

GEL LIKVORMIGE FIDSONDERZOEK

gezien op

de aangedestelde van de stroomverdelers

num: 577

bandtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie keerzijde.

BESLUIT


1. De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de ééndraads en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 2019-10-30 (art. 271 AREI) alsook vóór de Ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER :
nr. + naam + handtekening

De directeur,

Verklaring van de symbolen :

SB	stopkontakt boiler	2 x 2,5 +	
SW	stopkontakt werkvlak	2 x 2,5 +	
VL	aansluiting verlichting	2 x 2,5 +	
K	aansluiting kookplaat/fornuis	4 x 4 +	
GA	aansluiting gas	Ø 1/2"	
GE	stopk. elektr. ontsteking gasplaat	2 x 2,5 +	
GF	stopkontakt grill/friteuse	2 x 2,5 +	
SDK	stopkontakt dampkap	2 x 2,5 +	
OF	stopkontakt oven	2 x 2,5 +	
MW	stopkontakt micro-wave	2 x 2,5 +	
KW	aansluiting koud water	Ø 1/2"	
WW	aansluiting warm water	Ø 1/2"	
AF	aansluiting afvoer	Ø 40 mm	
SF	stopkontakt frigo	2 x 2,5 +	
SDV	stopkontakt diepvries	2 x 2,5 +	
SVW	stopkontakt vaatwas	2 x 2,5 +	
SWM	stopkontakt wasmachine/droogkast	2 x 2,5 +	

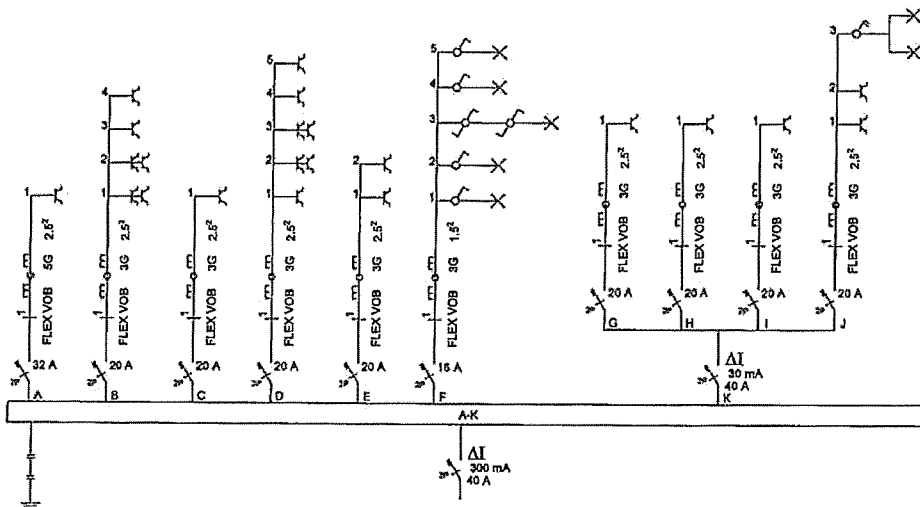

Appartement 11


Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3N, 400V/230V~
Naam/Nom Agelec bvba BTW / TVA BE 0867 209 692 Datum/Date 23-10-2006 Handtek/Sign	Organie. Naam/Nom AGENT-ONDERZOEKER Datum/Date 23-10-2006 Handtek/Sign TECHNISCHE BUREAU	Naam/Nom Ibema Straat/Rue Desmedestraat 31-33-35 Gemeen/Comm Zaventem Handtek/Sign	02541 FIX-O-CAD vynckier

27/10/08


Eerste verdieping

Situatieschema / Schéma de situation

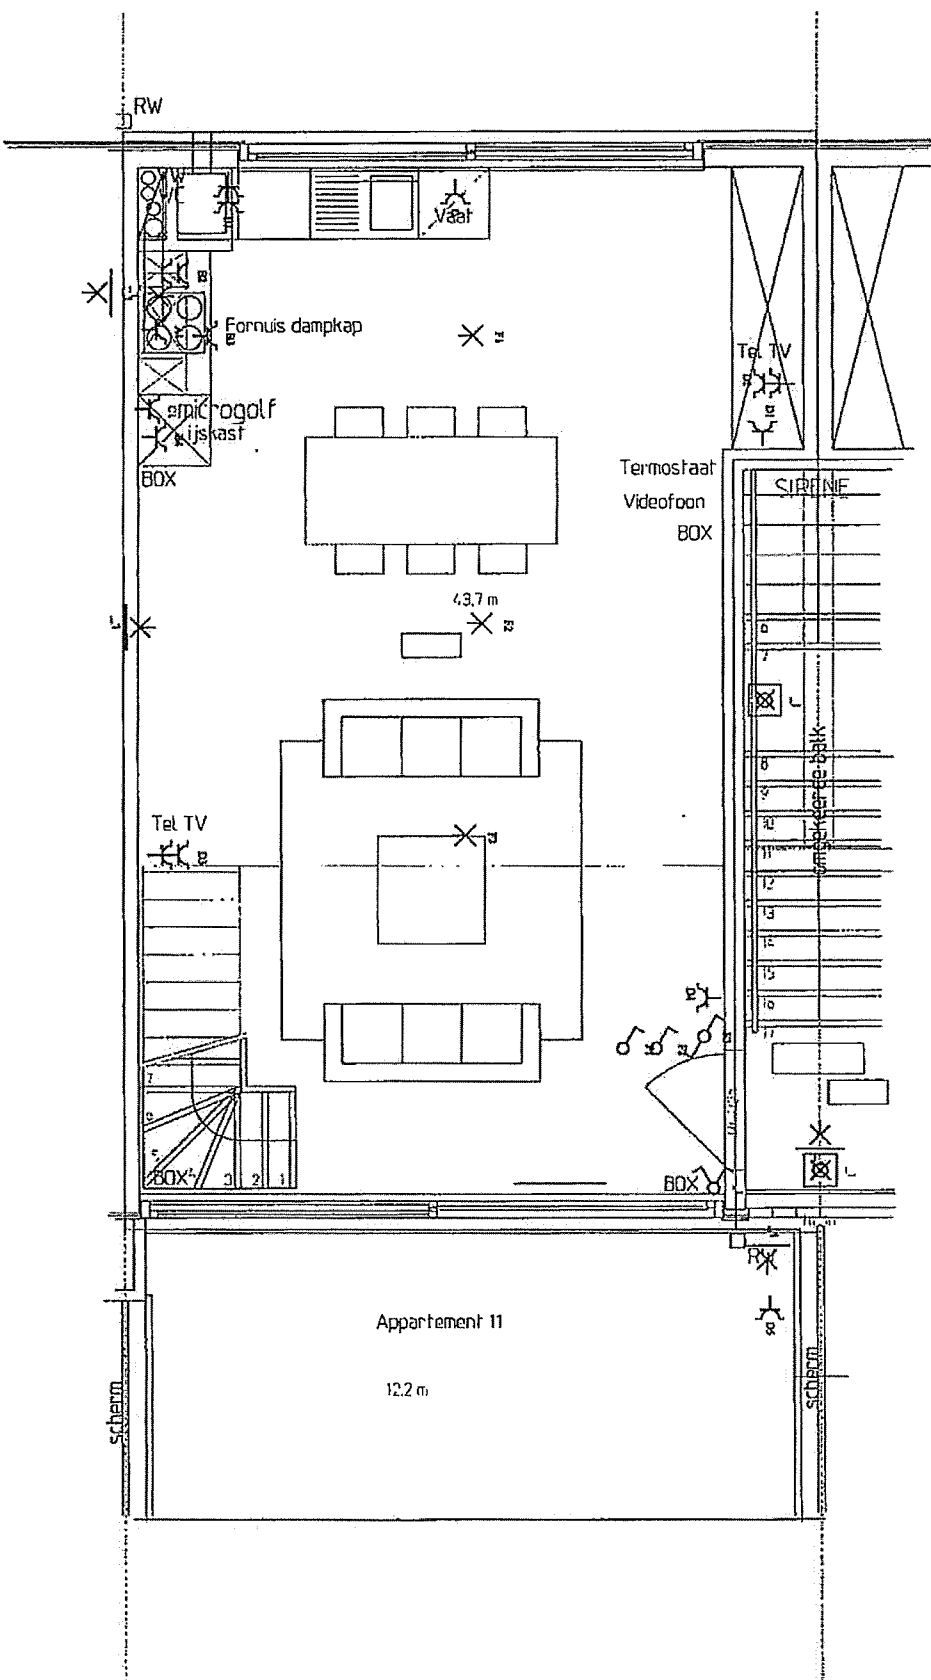

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	
Naam/Nom Agelec bvba BTW / TVA BE 0867 209 692 Datum/Date 23-10-2006 Handtek/Sign	Organis. Naam/nom Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Ibens Straat/Rue Desmedestraat 31-33-35 Gemeen/Comm Zaventem Handtek/Sign	3N, 400V/230V- FIX-O-CAD Vynkelier 02541

Tweede verdieping

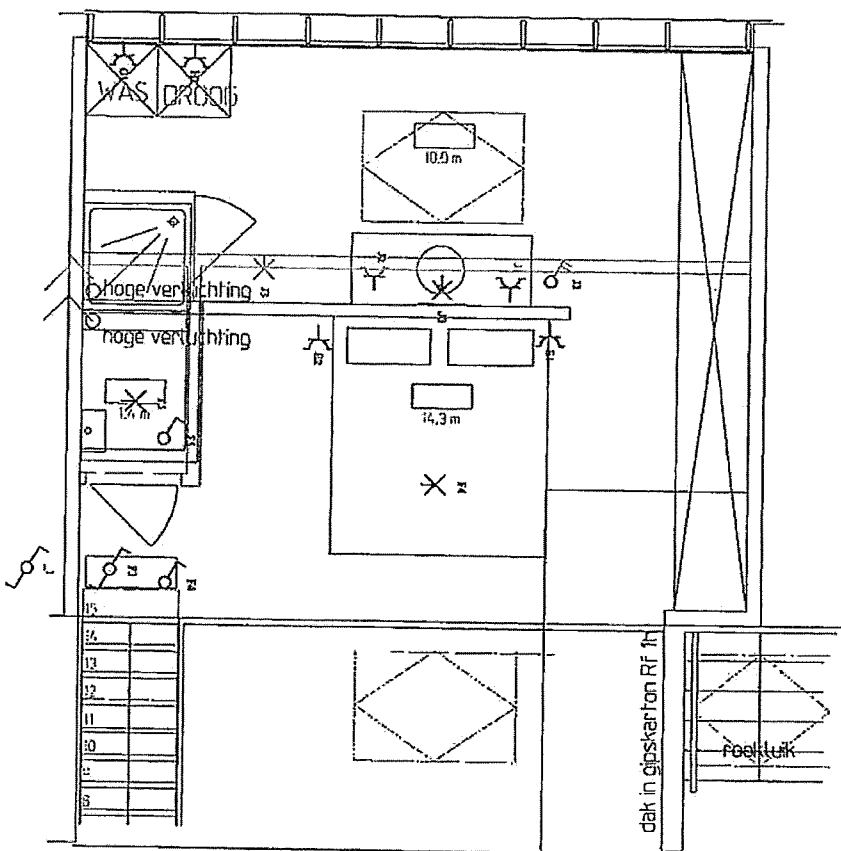

Appartement 11

Situatieschema / Schéma de situation

INSTALLATEUR

Naam/Nom Agelec bvba
BTW / TVA BE 0867 209 692
Datum/Date 23-10-2005
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis.
Naam/Nom
Datum/Date
Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom
Straat/Rue
Gemeent/Comm Zaventem
Handtek/Sign

3N, 400V/230V~

FIX-O-CAD

Wynckler

02441

