



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. : 2020099121 / G. /



N 217700

Resi code:

☐ Antwerpen-Limburg

tel.: 03 221 86 11

☒ Oost & West -Vlaanderen

tel.: 09 244 77 11

☐ Brabant

tel.: 02 674 57 11

☐ Wallonië

tel.: 081 432 611

1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : Cool	Naam, voornaam : ...
Ident. Kaart nr. 591-3041016-71	Adres : Turnhoutse Verhaegen 39 1081
BTW nr.: BE	Post nr. + Stad : 9820 Herelbeke
	Tel. : ... / ... / ...

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270	☒ ingebruikname	☐ wijziging	☐ uitbreiding	☒ Art 86	☐ Art 271 bis	☒ Woonenheid
☐ Art 271	☐ mobiel	☐ tijdelijk		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 276	☐ periodiek	☐ controle		☐ Art 88	☐ Art	☐ Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaring	☐ Art 276bis : verkoop van een woonenheid			☐ Art ...	☐ Art	☐ Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☒ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. 35773785	meterstand dag : 94686	nacht : ...
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100		☐ kWh excl. nacht meter : ...
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐ aardingslus	☒ pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord : 4 x 10 mm ² - Type : XVB	☐ ...	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA	Aantal borden : 1	Aantal eindstroombanen : 1
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☒ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : 10 Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : 23 MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☒ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	Geen zichtbare inbreuken
☐ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie	
☐ Nihil	
Opmerkingen	
☒ Nihil	

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie	☒ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.
☐ De bestaande installatie	☐ voldoet	☐ voldoet niet	aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

23/11/2036 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Agent bezoeker :

Naam : Volckaert Koen Agent nr. : 2209 Datum : 23/11/2021

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 3 ☒ Eéndraadsschema(s) : 1

Voor de directeur generaal : Handtekening




Koen VOLCKAERT
Inspecteur
2209


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij persoonlijk letsel of dodelijke slachtoffers worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

reider

zolder hoogste punt 3,81 m
laagste balk in zolder 2,10 m

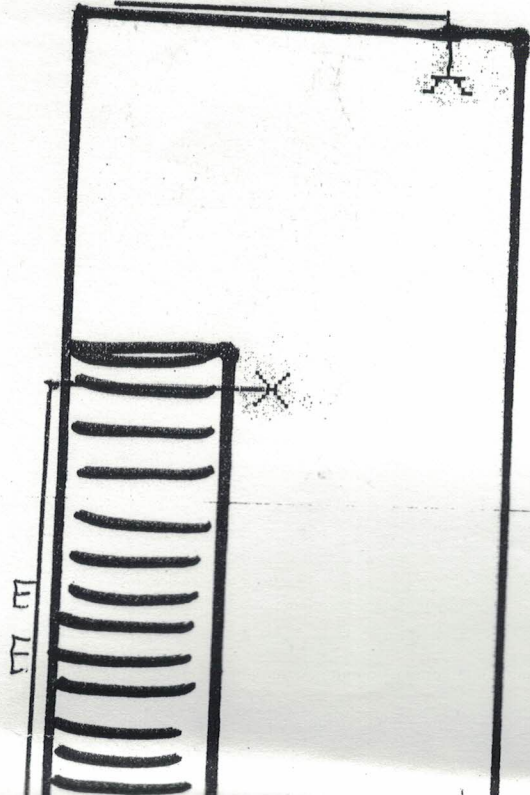

7,5 m

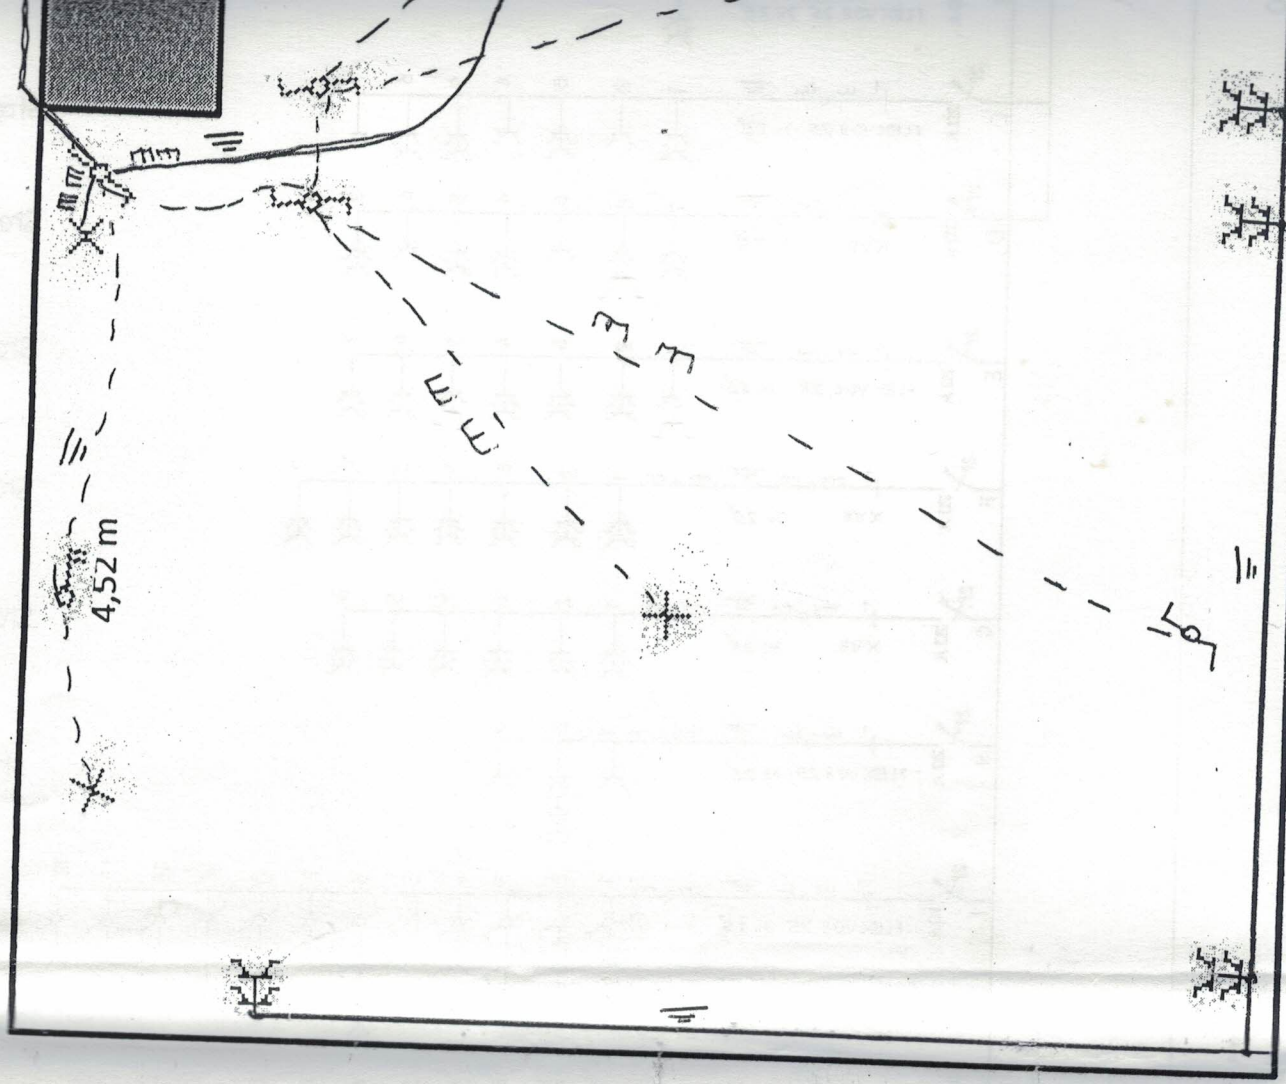

Koen VOLCKAERT

Inspecteur

2209

0477/646873

Verlichting Zolder

Verlichting Woon

Stopcontacten

Stopcontacten


Stopcontacten

Stopcontacten

Stopcontacten

Stopcontacten

Stopcontacten

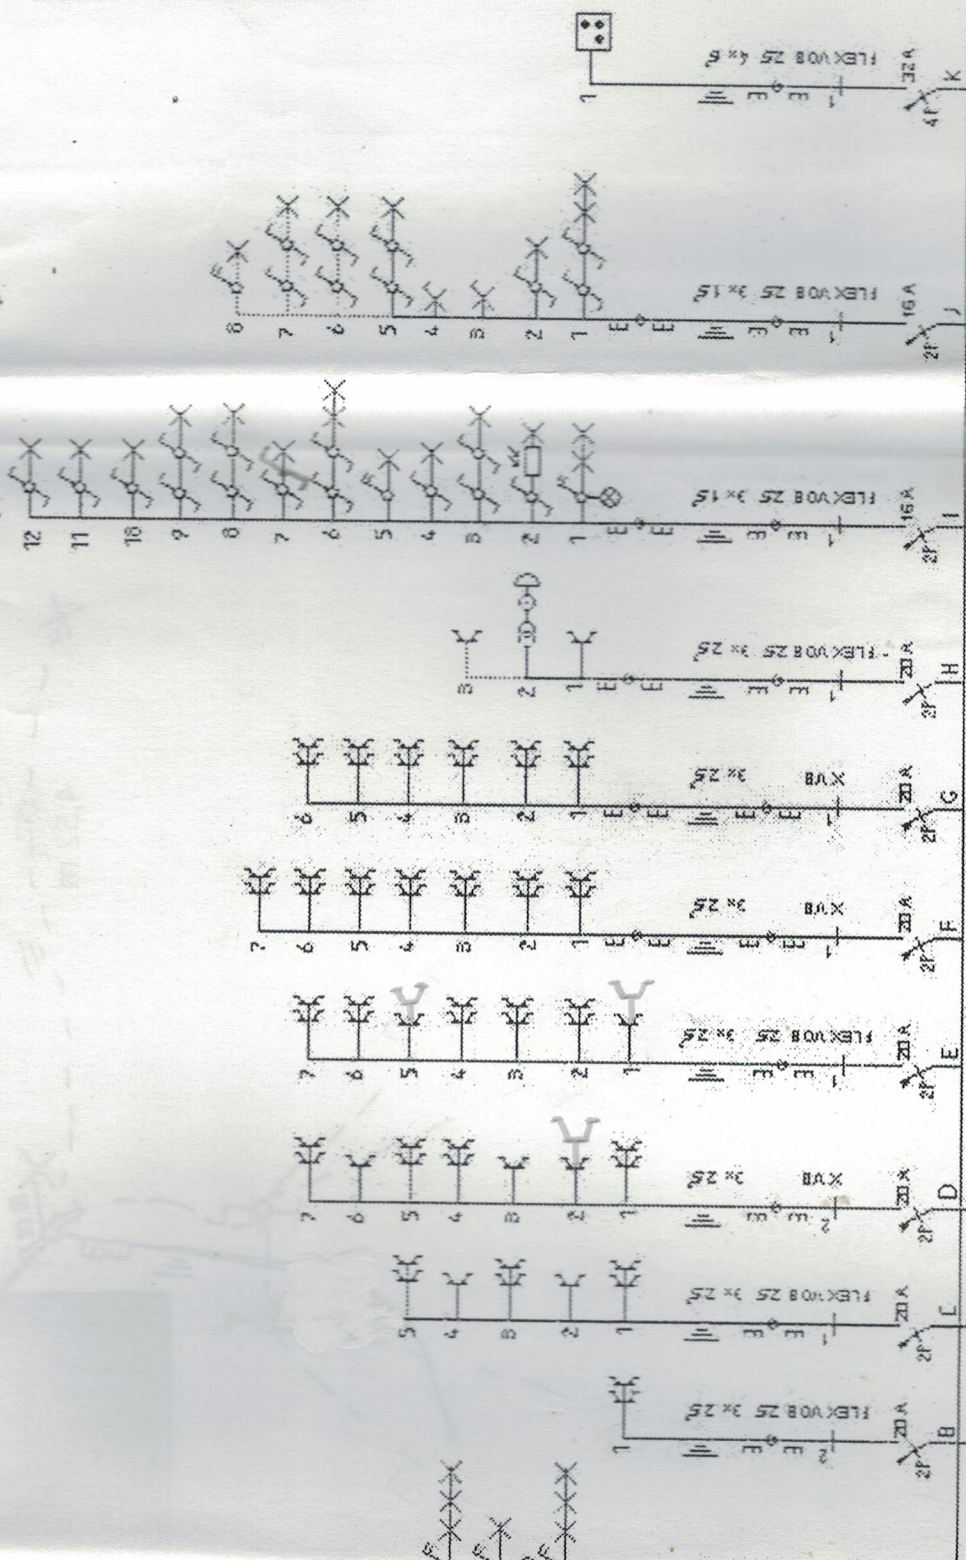

30mA
40k

3 100°

R < 30

1^e verdieping, hoogte 2,52 m

8,60 m

Raam:

1255 x 1465

Raam: 660

x 1480



Koen VOLCKAERT
Inspecteur
2269
0477/046873



11,20 m

raam:

Raam:

460 x 605

1,43 m

op 0,8 m

Deur:

885 x 2030

3,7 m

de kade
voor een huis (reel)

460x595

trap

3,2 m

Koen VOLKAERT


Inspecteur

2209

0477/040873


TE

kelder

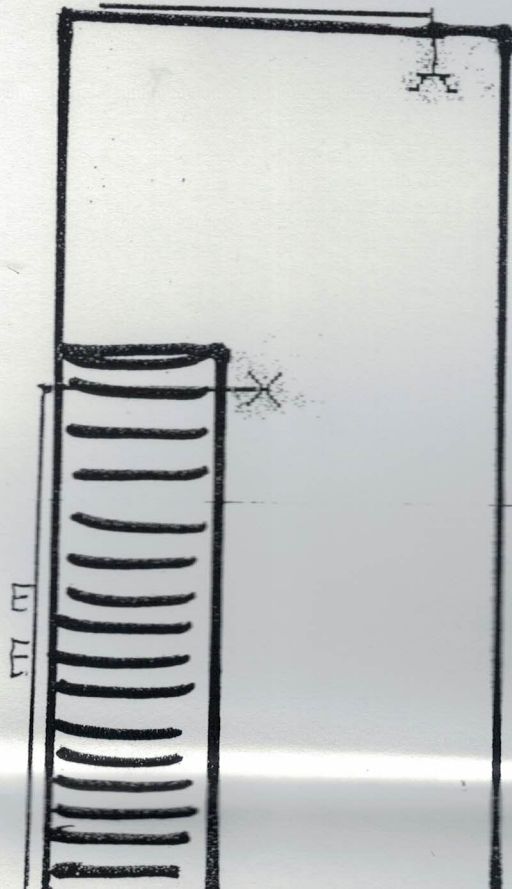

Zolder hoogste punt 3,8
laagste balk in zolder 2,1

7,5 m

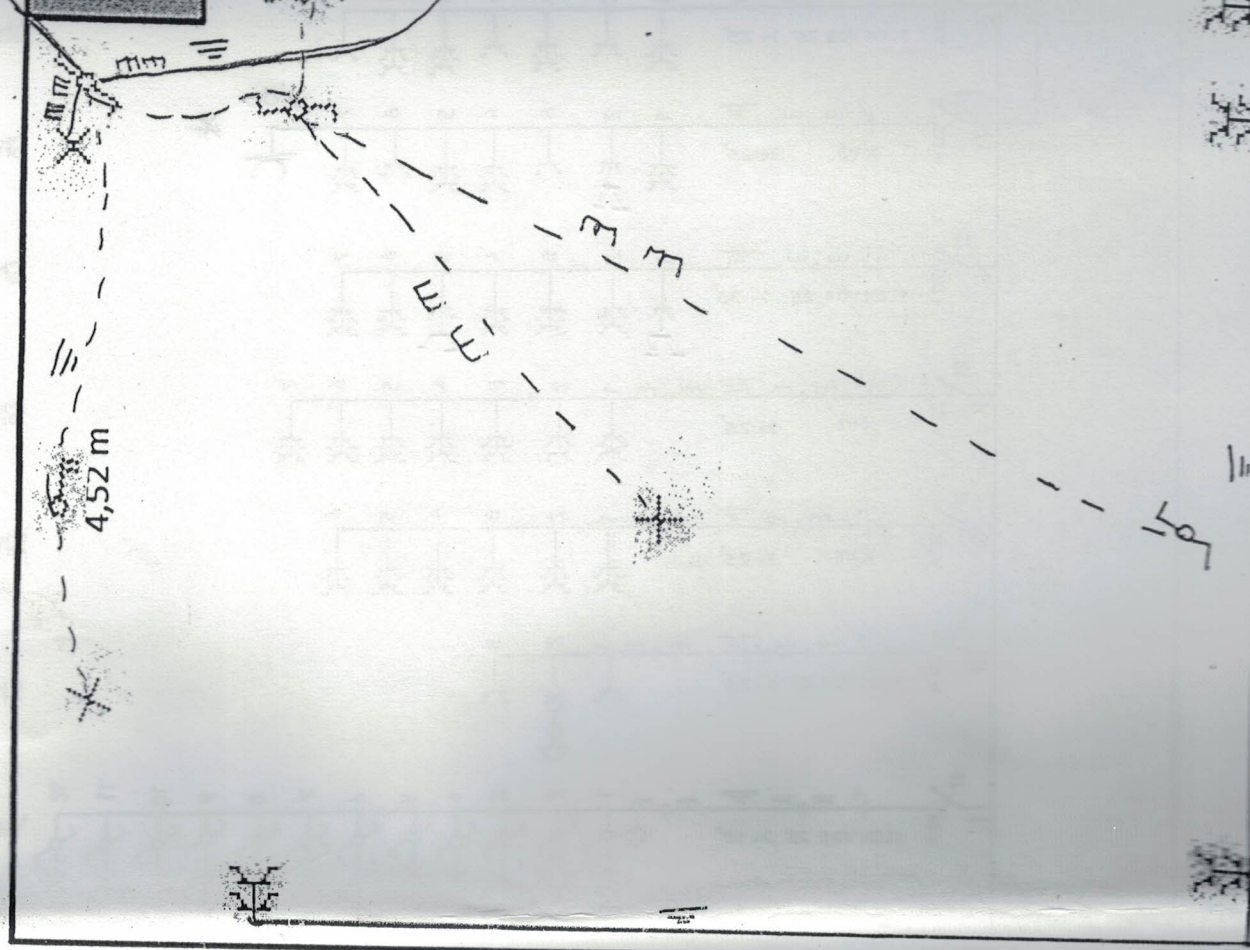

11,20 m

raam:

Raam:

460 x 605

1,43 m

op 0,8 m

1310 x 1160

1,06 m

trap

Deur:

885 x 2030

3,7 m

in kast
over heen hius (sech)


3,2 m


7,50 m

8,60 m

Raam: 660
x 1480

Raam:
1255 x 1465

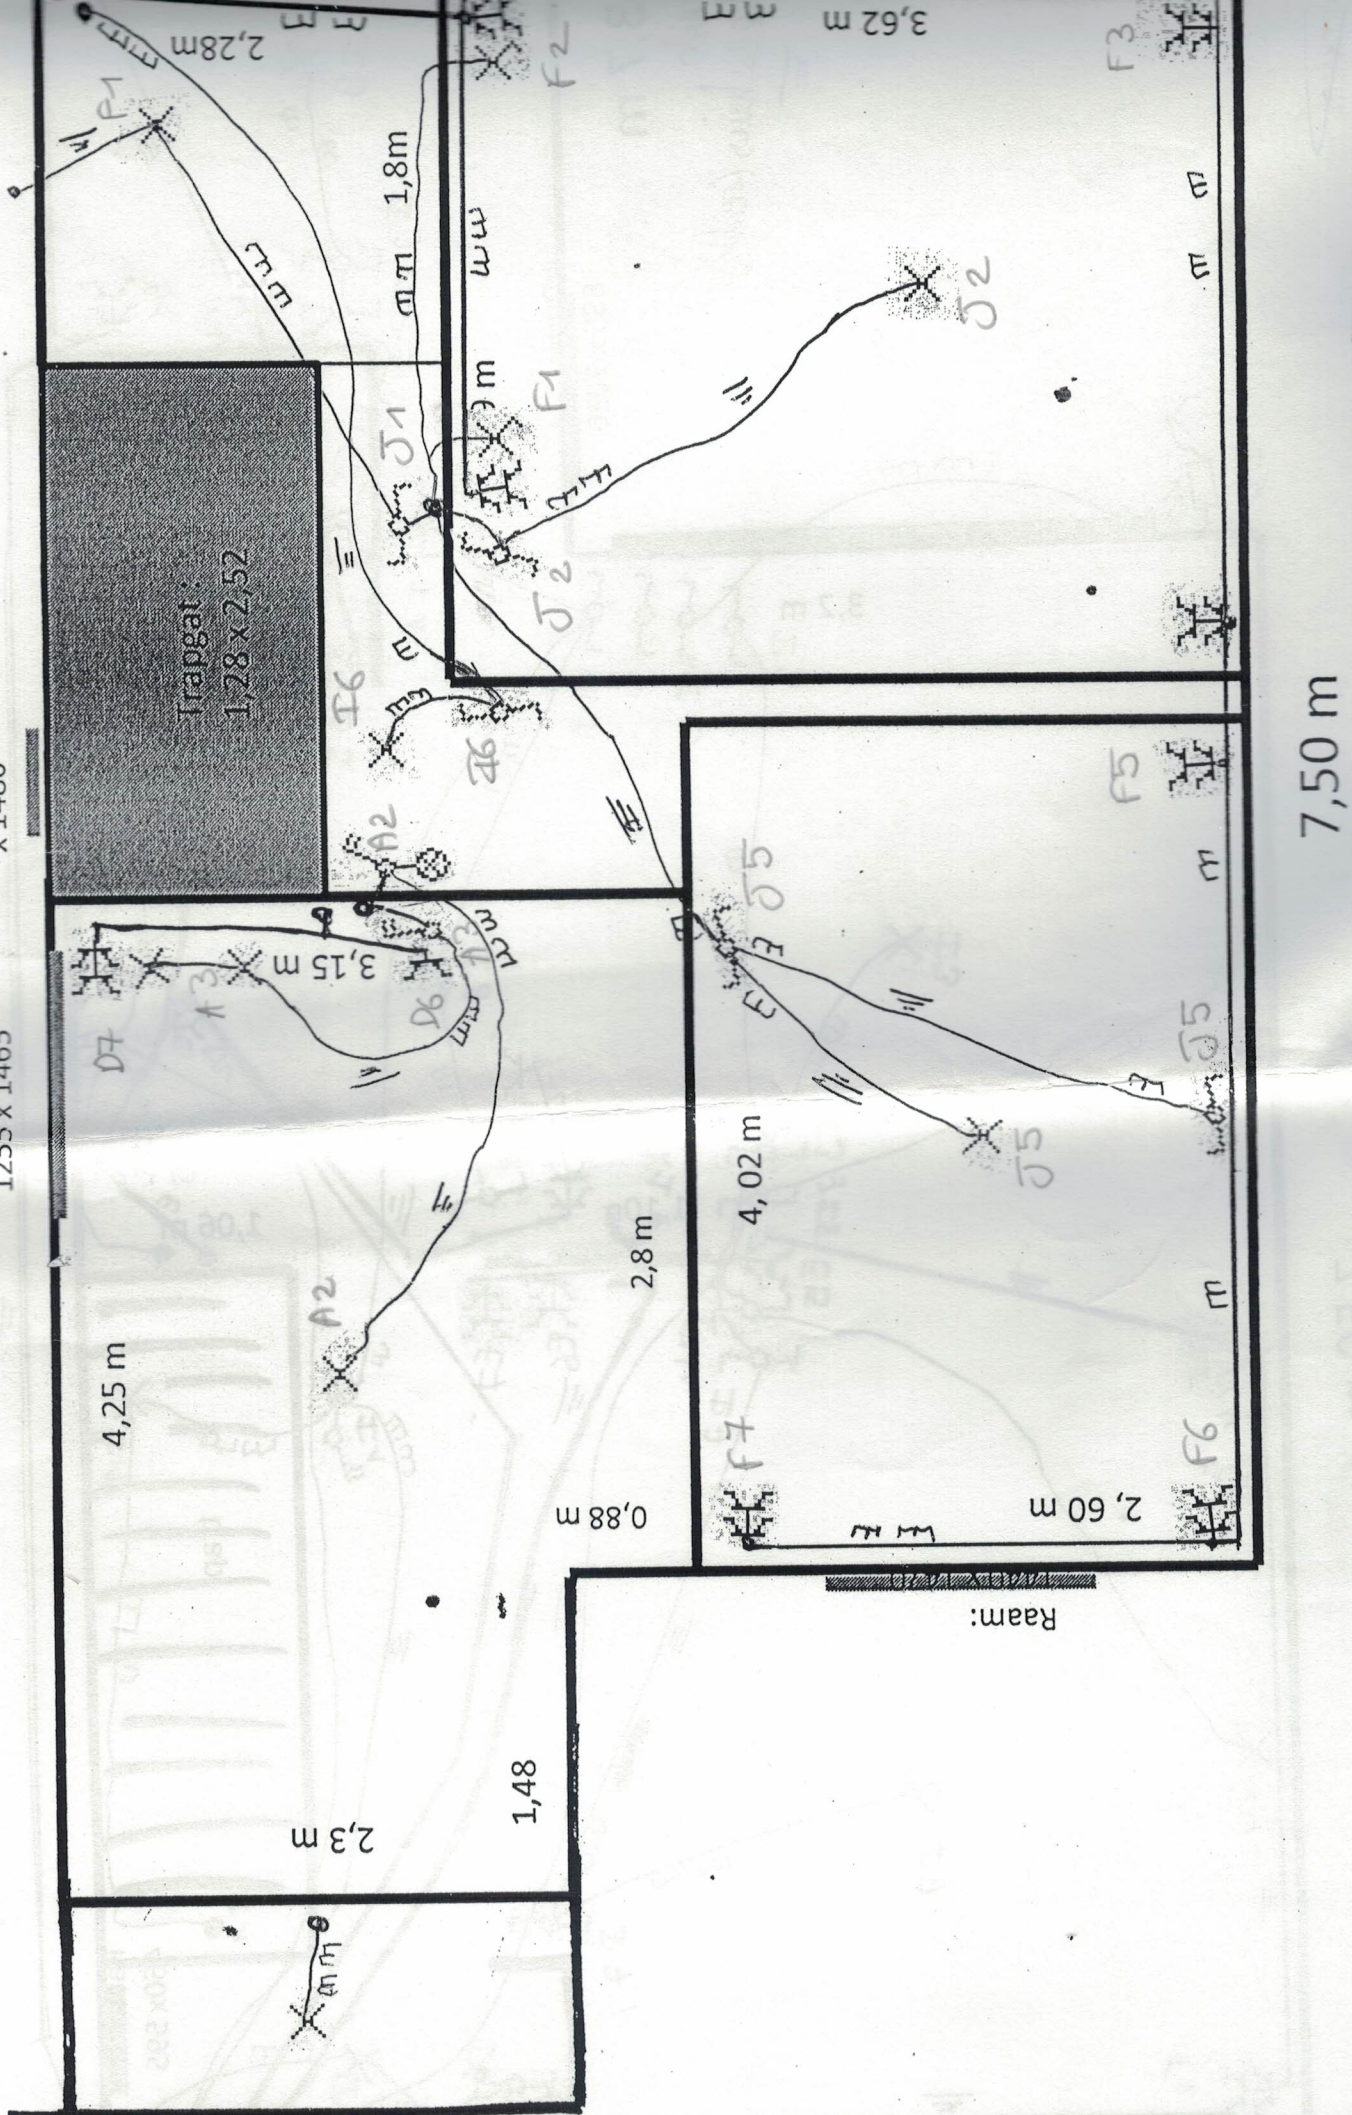



A 0245748

CONTROLEVERSLAG VAN EEN INSTALLATIE WERKEND OP AARDGAS UITGEVOERD IN HET KADER VAN HET OPENEN VAN EEN GASMETER

Naam installateur : BYBA DE SMET - TIGERSCHOOTAdres : MOERSTRAAT 32
9230 WATZGHEControleorganisme : KING 0736Referentie : DR101-203 CH66KINZ AVB
35060270Inspecteur : WILCKAERT K201Tel : 0472/646873Gecontroleerde installatie : Adres : TUINWIJK GAD VERHAEGED 39
9220 TIGERSCHEDatum van de controle: 23.11.2011De bewoner is: ☒ eigenaar ☐ huurderHet "Getuigschrift af te leveren aan de aardgasdistributienetbeheerder (DNB) voor het openen van de gasmeter overeenkomstig het Koninklijk besluit van 28 juni 1971": ☒ is aanwezig ☐ is niet aanwezig

Karakteristieken van de installatie :

Meter : Klasse Q_{max} : 6 m³/h Fabrikant : ITRO Nr : 801/24777643 Index : 0,152

Bedrijfsdruk van de binneninstallatie: mbar

Verbruikstoestellen:

Aantal :	Type	Merk	Nominaal vermogen
①	<u>1 K6761 C33</u>	<u>R6M6HA</u>	<u>24,1 kW</u>
2	<u>56R16 H°</u>	<u>111902271660</u>	
3			
...			

Besluit :

De nieuwe installatie:

☒ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
de dichtheidsproef voldoet.

Het nieuw gedeelte van de installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die momenteel van toepassing zijn en **is technisch veilig**.
de dichtheidsproef voldoet.

De bestaande installatie:

☐ is conform de betrokken voorschriften⁽¹⁾ die van toepassing waren bij de inbedrijfstelling van de betrokken installatie en **is technisch veilig**.
de dichtheidsproef voldoet.

(1) De betrokken voorschriften zijn onder andere de normen NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 en NBN B61-002.


Deze normen hebben zowel betrekking op de leidingen als op de toestelgebonden eisen, zoals de toevoer van verse verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten.

28/11/11
Gezien Eandis
Peter DhanynsDatum: 23.11.2011

Handtekening inspecteur controleorganisme

003B	V10
Berging	16 °C
ti	16 °C
Buislengte	45 m
tegels	
Rol: 3 (120m)	

002D	V10
Keuken	20 °C
ti	20 °C
Buislengte	71 m
tegels	
Rol: 3 (120m)	

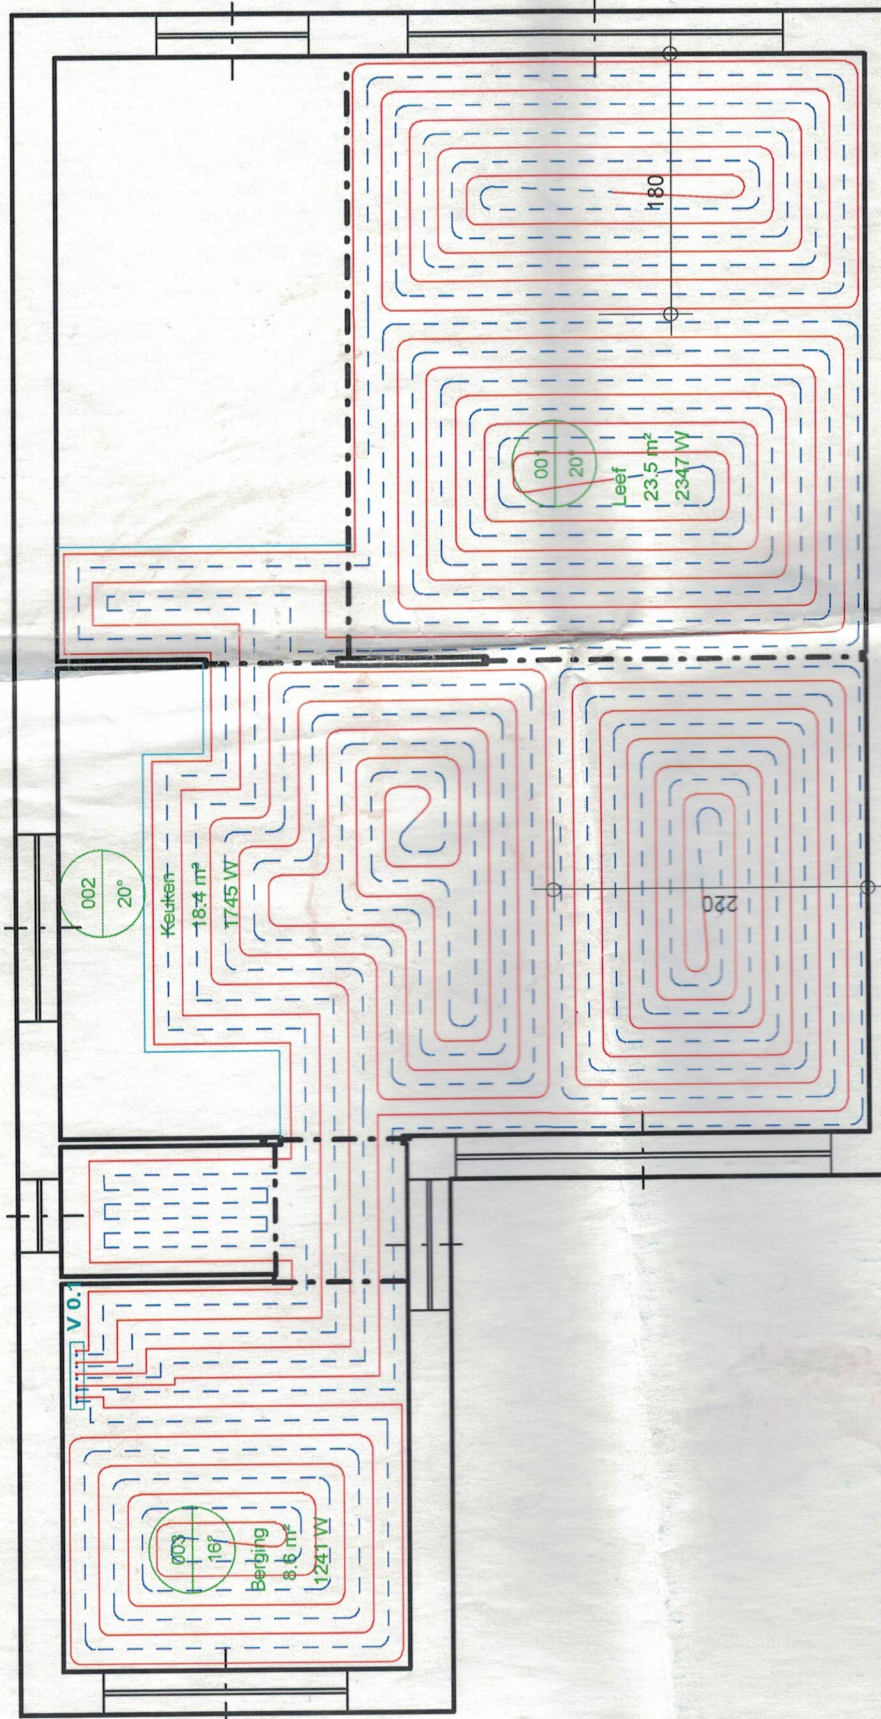

002C	V10
Keuken	20 °C
ti	20 °C
Buislengte	82 m
tegels	
Rol: 4 (90m)	

001A	V10
Leef	20 °C
ti	20 °C
Buislengte	104 m
tegels	
Rol: 2 (120m)	

001D	V10
Leef	20 °C
ti	20 °C
Buislengte	101 m
tegels	
Rol: 1 (120m)	
