

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BTV
Gebrode

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 320130328/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Residentie Hagelbeek 20
Oorlogsvrijheidsstraat 20 bus 20 - 3300 Tienen

EIGENAAR: Vandecasteele Jean

Adres: id. inst.

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: id. eig.

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. 2358674

Index: 072066,5 kWh

Datum van het onderzoek: 18/10/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2006) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwaring verkoop wooneenheid: Type der lokalen: MHL (4pp)

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230V mono V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 20 mm² Alg. schakelaar: type DNF 40A/1003A

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6; RA: 2,7 Ohm; RI tot 20 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING: Het bevestigings volgens verslag van 20/10/11 15/14

zie eendraads- en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:

geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.


- BESLUIT
1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eendraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/10/2013 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 2. De installatie is niet conform.
 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 320 Marc Ngeli
nr. + naam + handtekening

De directeur,

ENDRAAD SCHEMA.

RESIDENTIE HAGEDAAN NR 10
3300 TERNEN

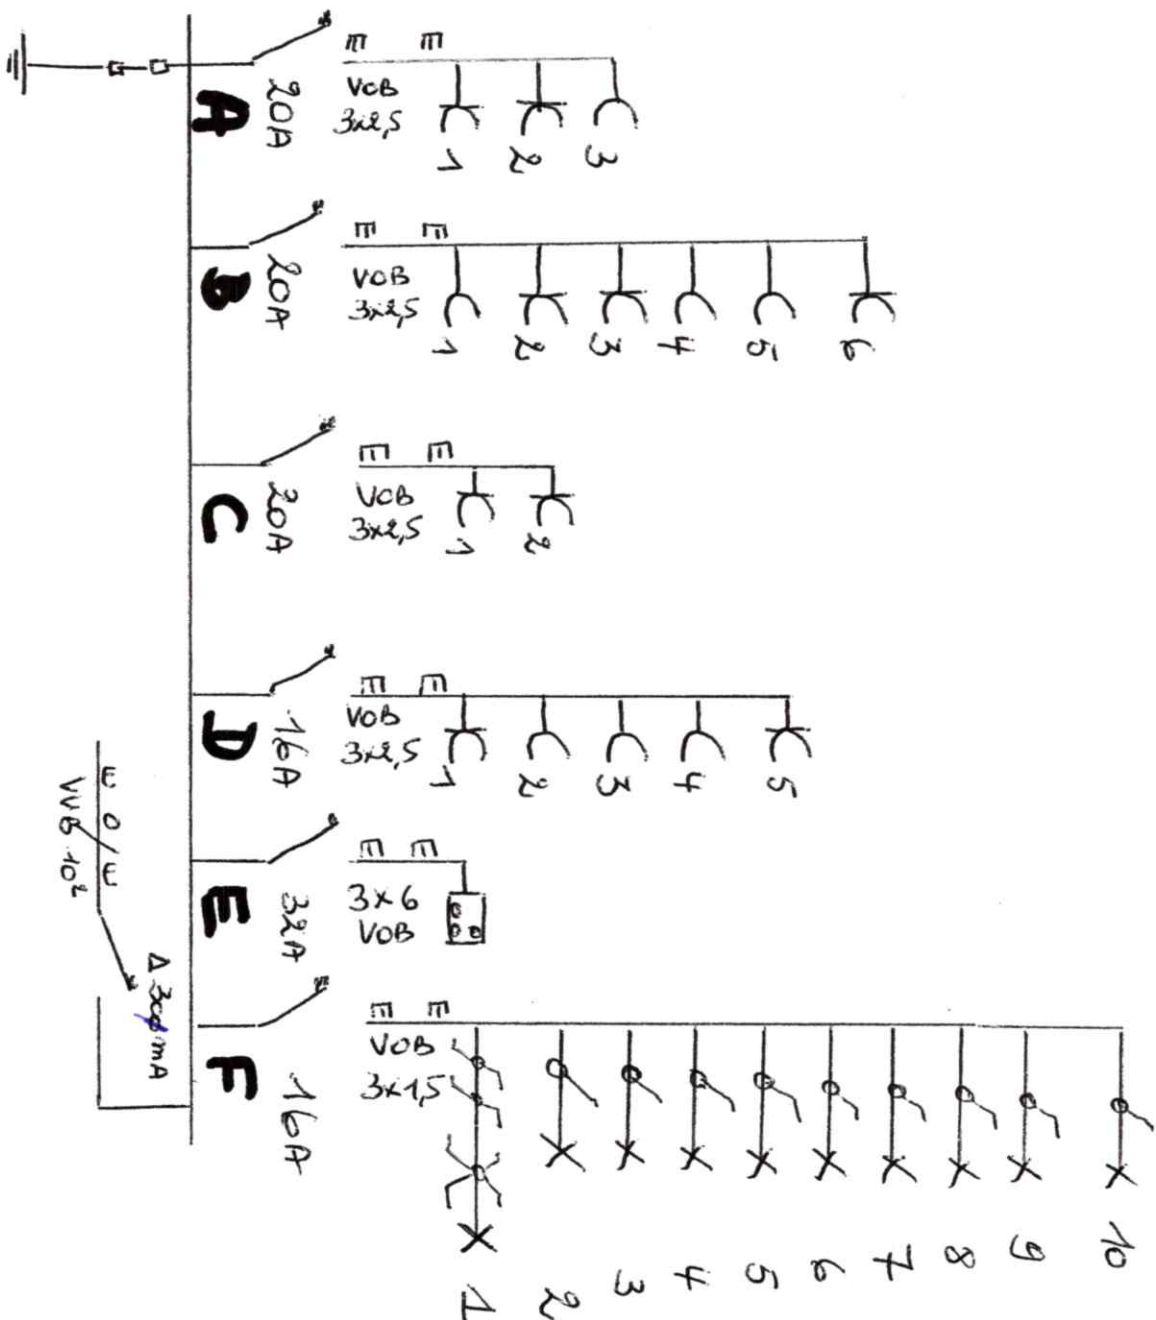

Handwritten signature and date: 28/03/2013
