

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 10/06/2021

Inspecteur: Wout Schockaert

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest
ET61557

Serie Nr.: 19481265

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 556528

Plaats van het onderzoek

Straatnaam August Vermeylenlaan
Huisnummer 19
Busnummer 13
Postcode 2050
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Naam contactpersoon Walls
Telefoon 03 233 33 00
Gsm nr. (SMS)

Type : woning

EAN : 541 448 820 038 440 524

Eigenaar

Naam -
Straatnaam August Vermeylenlaan
Huisnummer 19
Busnummer 13
Postcode 2050
Gemeente ANTWERPEN
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Teller Nr.: : 45 851 485

Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens AREI boek 1 hoofdstuk 6.5. en 8.2.2 en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 10

Isolatie: 340 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 1,14 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _{Δt}	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	10		
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	3		

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
7	C	20		2	2,5
1	C	25		4	4
2	C	10		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen)

☐ OK ☒ NOK

Directe aanraking

☒ OK ☐ NOK

Indirecte aanraking

☐ OK ☒ NOK

Aansluitingen

☒ OK ☐ NOK

Correcte schema's

☐ OK ☒ NOK

☐ schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing

in afwachting

Continuïteit

☒ OK ☐ NOK

Verlichting / toestellen

☐ OK ☐ NOK ☒ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O1 Dit verslag vervangt verslag met documentnummer

O4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 10/6/2046



De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, toegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.



Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7



VRIJGAVE VAN TECHNISCH VOORBEZOEK

De inspecteur Wout Schockaert

De werknemer,

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechte​sreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


www.aceg.be


02 880 88 90

BE53.0689.0209.2953 - BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 10/6/2046	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.

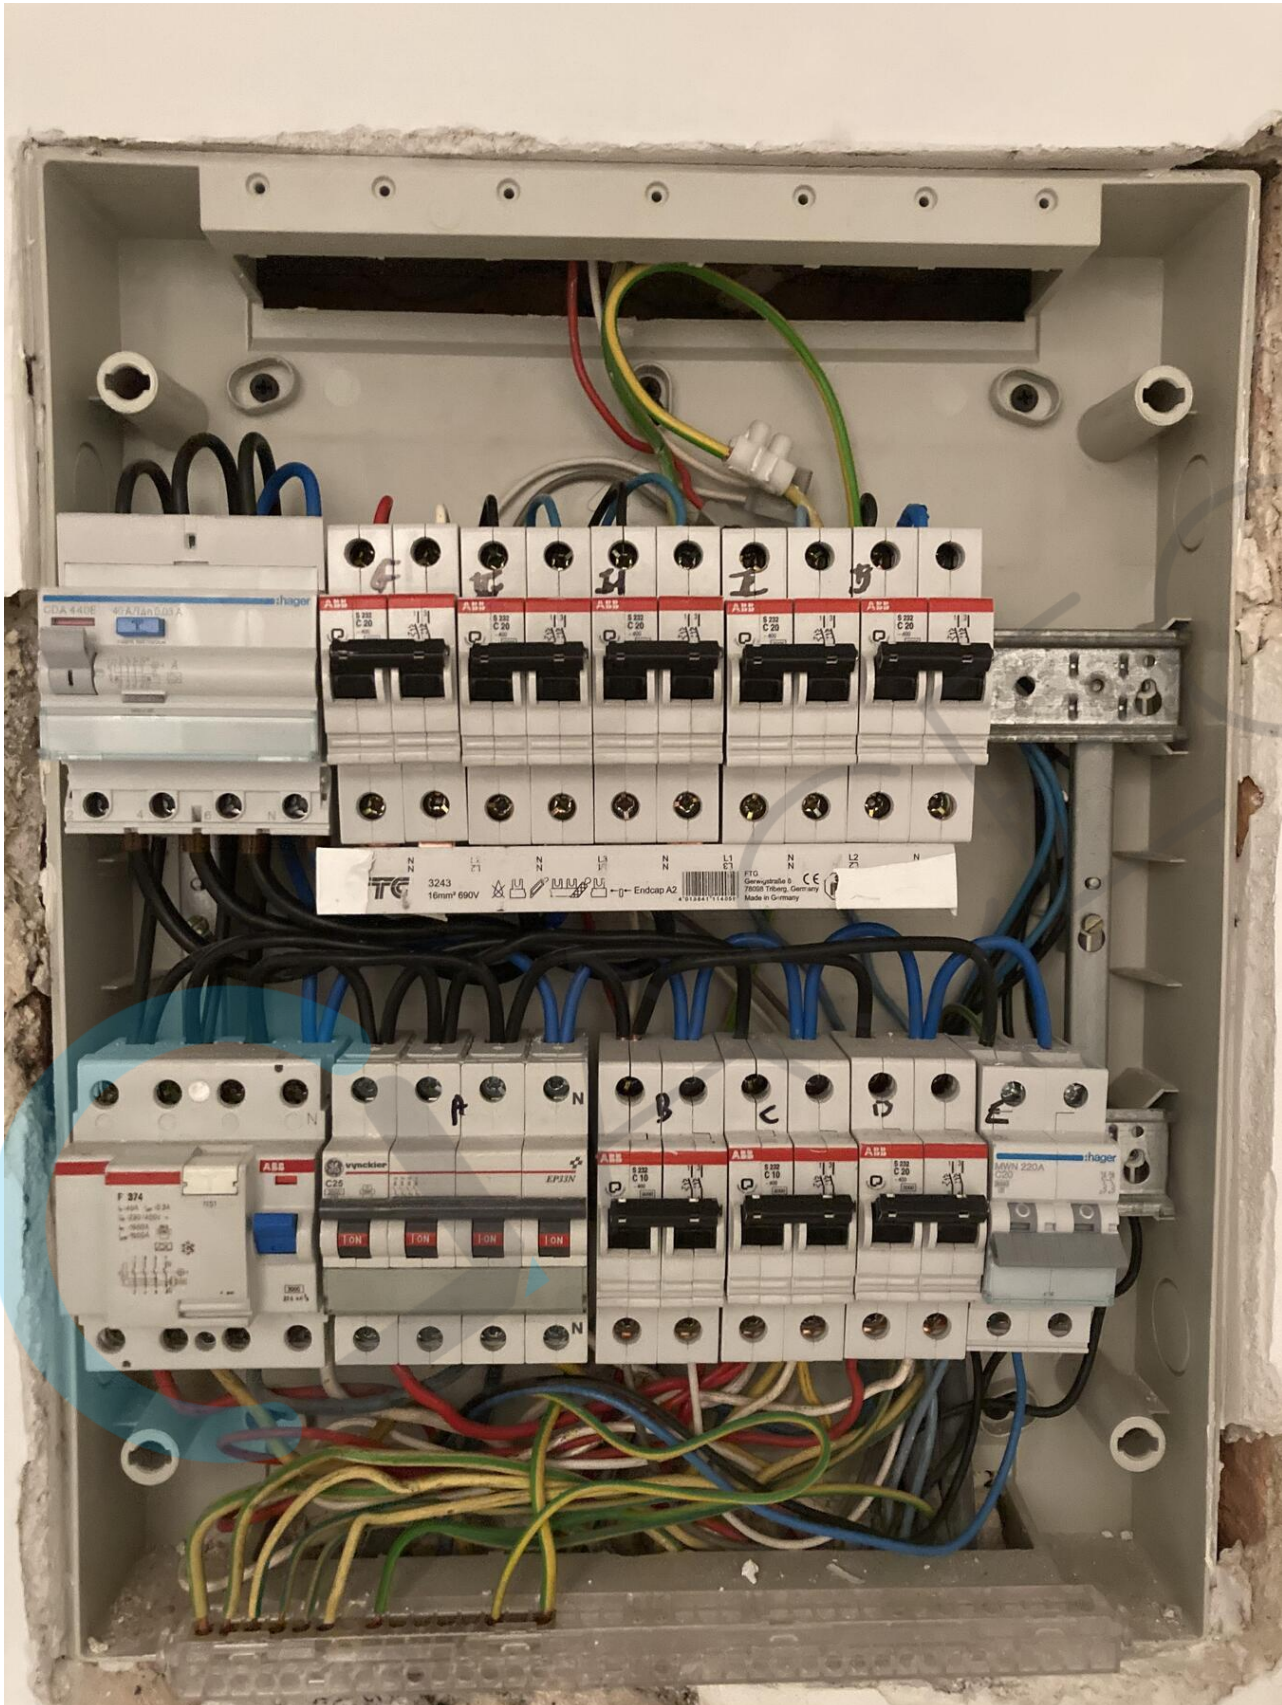

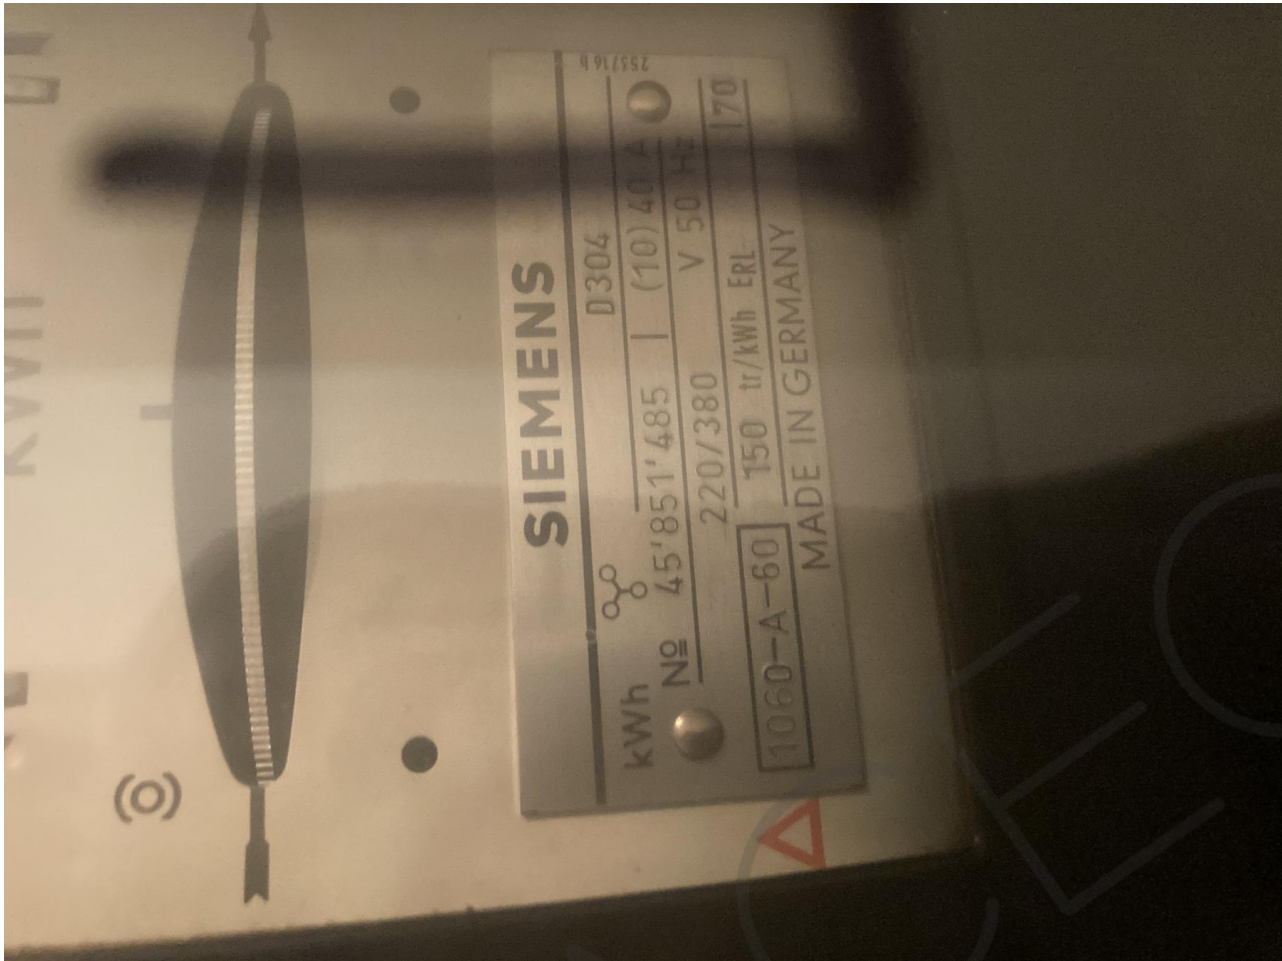

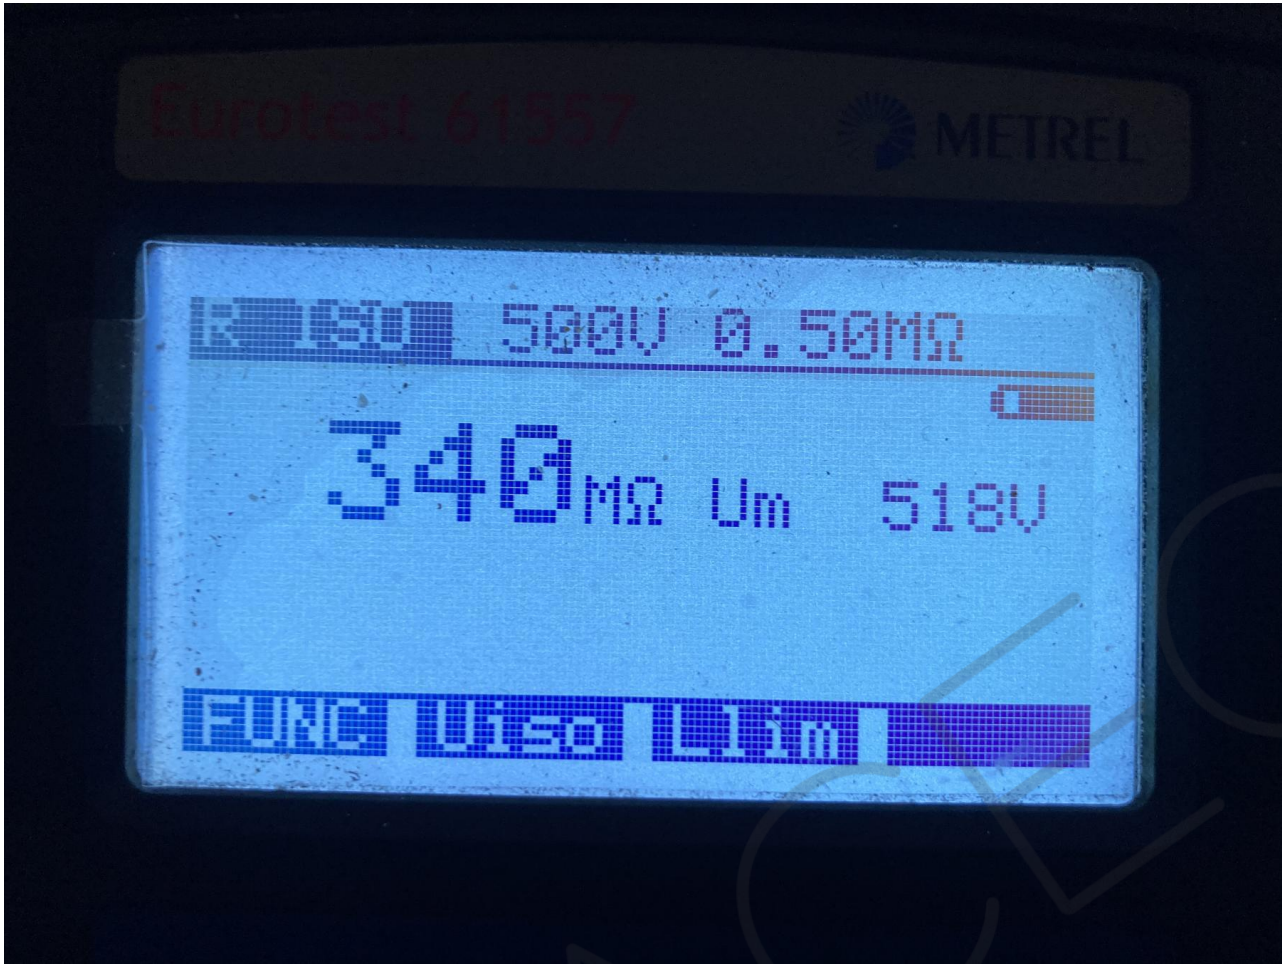

	Plaats van de elektrische installatie Lynn Debouvy August Vermeylenlaan 19 2050 Antwerpen EAN 5411448820038440524	Installateur D&T projects Dijkstraat 205 9120 Melsele GSM: 0485585751 e-mail: Thomas@dt-projects.com BE0749645989	p. 2/4 Eendraadschema 2 x 230V ~ 50Hz
ACEG #155 Wout Schockaert	Schema's getekend door: Thomas Dejonghe		

2021-06-17 13-25 3/4

Gereed

