

Mise en service écrit à la main: Gaz naturel se trouvant à l'intérieur conformément à la norme NBN D51-003, NBN D51-004 (MOP <= 100 mbar et DN <= 50) et NBN B61-002

Date: 24/06/2019

Inspecteur: Michaël Polys

Mentor:

Installateur: Elecsam

Étiquette d'identification:

Type de contrôle

Gaz naturel

Adresse de l'installation

Rue

Roosevelt

Numéro

31

Code postal

4650

Commune

Herve

Propriétaire

Dethier Martin

Client reference:

Inspection count 1

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Voir Schéma isométrique

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

Néant

CONCLUSION

☒ L'installation est conforme

☐ L'installation n'est pas conforme

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Michaël Polys

www.aceg.be

02 / 880.88.90

BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481





A 1254839

**ATTENTION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971**

Je soussigné : Nom : THEEVISSSEN Prénom : Samuel
Représentant de l'entreprise : ELEC SAH N° de TVA : 0873.622.927
Rue : Grands Herms Jacques N° de Boîte :
Code postal : 58300 Localité : T.H. M. S. T. E. C. E. Tél :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise)
Adresse : Tel :

atteste formellement et garantit par la présente

l'installation neuve / partie neuve d'installation (sur la planche jointe) suivant le plan ci-après dans l'immeuble situé à : Rue : Grands Herms N° de Boîte : 0

Code postal : 58300 Commune : HERBE Boîte : 0 Elage : 0
Marque compteur : HERBE N° du compteur : 0581401113 Boîte :
Nom : Debrin Prénom : Ruben
Rue : Boîte :
Code postal : Commune : Boîte :

pour le compte de :

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NF D 51 et NF B 61 et les avis techniques ARGB et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les appareils liés aux appareils à gaz installés, telles que l'arrivée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
- avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réserve à l'installateur

Je déclare que je suis : ☐ Corps-Installateur gaz professionnel

☐ oui ☒ non

Si oui : n° Corps :

Réserve au GRD


Date : 24/06/2019

Signature : [Signature]

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique : le compteur de gaz, le tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), la section et le diamètre (mm), les raccords indiqués au moyen de majuscules A, B, ...

Ce schéma peut être remplacé par un schéma isométrique qui contient au moins les mêmes données

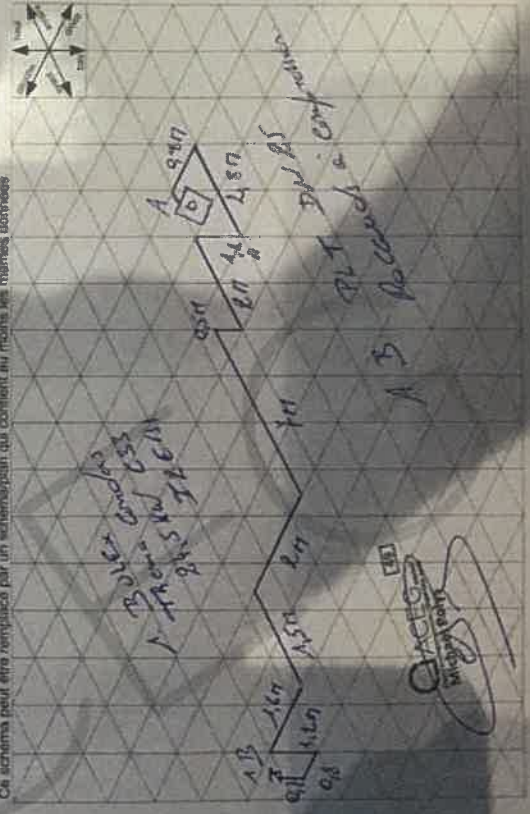

Modèle 710223/14

A 0554329

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : <u>Elkasan</u> Adresse : <u>Rue Gene Toullecq 10</u> <u>49000 Toullecq</u> <u>06 88 68 98 17</u>	
Organisme de contrôle : <u>AGEG</u> Inspecteur : <u>Polys Hibel</u> Référence : <u>24 06 12 19</u>	
Installation contrôlée : Adresse : <u>Rue Pascale 31</u> <u>45000 Reuilly</u> L'habitant est : ☒ propriétaire ☐ locataire	
Date du contrôle : <u>24/06/2019</u> L'Attestation a été délivrée au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'arrêté Royal du 28 juin 1971 : ☒ est présente n° <u>18.56.13.9</u> ☐ n'est pas présente	
Caractéristiques de l'installation : Compteur : Classe Q _{max} : <u>6</u> m³/h Fabricant : <u>NETRIX</u> n° : <u>15160783</u> Index : <u>00000000</u> Pression de service de l'installation intérieure : <u>20</u> mbar	
Appareils d'utilisation : Type : <u>233</u> Marque : <u>Buder Thermo Condens</u> Puissance nominale : <u>24,5 kW</u> Nombre : 1 2 3	
Conclusion : L'installation neuve : ☒ est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre. L'essai d'étanchéité donne satisfaction.	
La nouvelle partie de l'installation : ☐ est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ actuellement en vigueur et est techniquement sûre. L'essai d'étanchéité donne satisfaction.	
L'installation existante : ☐ est conforme aux prescriptions correspondantes ⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et est techniquement sûre. L'essai d'étanchéité donne satisfaction.	
(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes HDN D 51 et HDN B 43 et les avis techniques ATCA et CTEG. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la technique que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'ensemble d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Prescriptions applicables : <u>NBN S1003 et 61006</u>	

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

Date : 24/06/2019
 N° de rapport : 231023
 Client : Elkasan - Client : Elkasan - Organisme de contrôle : AGEG



BULEX

Golden Hopestraat 15, 1620 Drogenbos, Belgium

Thema Condens 25/30 -A (E-BE) R1

Chaudière à condensation/HR-toestel/condensatieketel/Brennwertgerät

TYPE C13, C33, C43, C43P, C53, C83, C93, B23P

BE	I2E(S)	2E(S) - G20/G25 - 20/25 mbar
LU	I2E	2E - G20-20 mbar

PMS = 3 bar	10 bar
PMW = 0,3 MPa	1 MPa

NOx = 5	Code = 75
230V~50Hz	113 W

G20	IPX6
-----	------

$Q_n = 7,8 - 25,0 \text{ kW (Hi)}$	$Q_{nw} = 7,8 - 30,0 \text{ kW (Hi)}$
$P_n (80/60^\circ\text{C}) = 7,5 - 24,5 \text{ kW}$	$P = 7,8 - 30,6 \text{ kW}$

$P_{nc} (50/30^\circ\text{C}) = 8,5 - 25,9 \text{ kW}$
--

$Q_n = 6,4 - 20,7 \text{ kW (Hi)}$	$Q_{nw} = 6,4 - 25,3 \text{ kW (Hi)}$
$P_n (80/60^\circ\text{C}) = 6,1 - 20,3 \text{ kW}$	$P = 6,4 - 25,3 \text{ kW}$

$P_{nc} (50/30^\circ\text{C}) = 6,9 - 22,2 \text{ kW}$
--



1312 19

12/19



1312BU5335

N° 21191200100173631610007343N5

0020200288_01 - 07/17



