


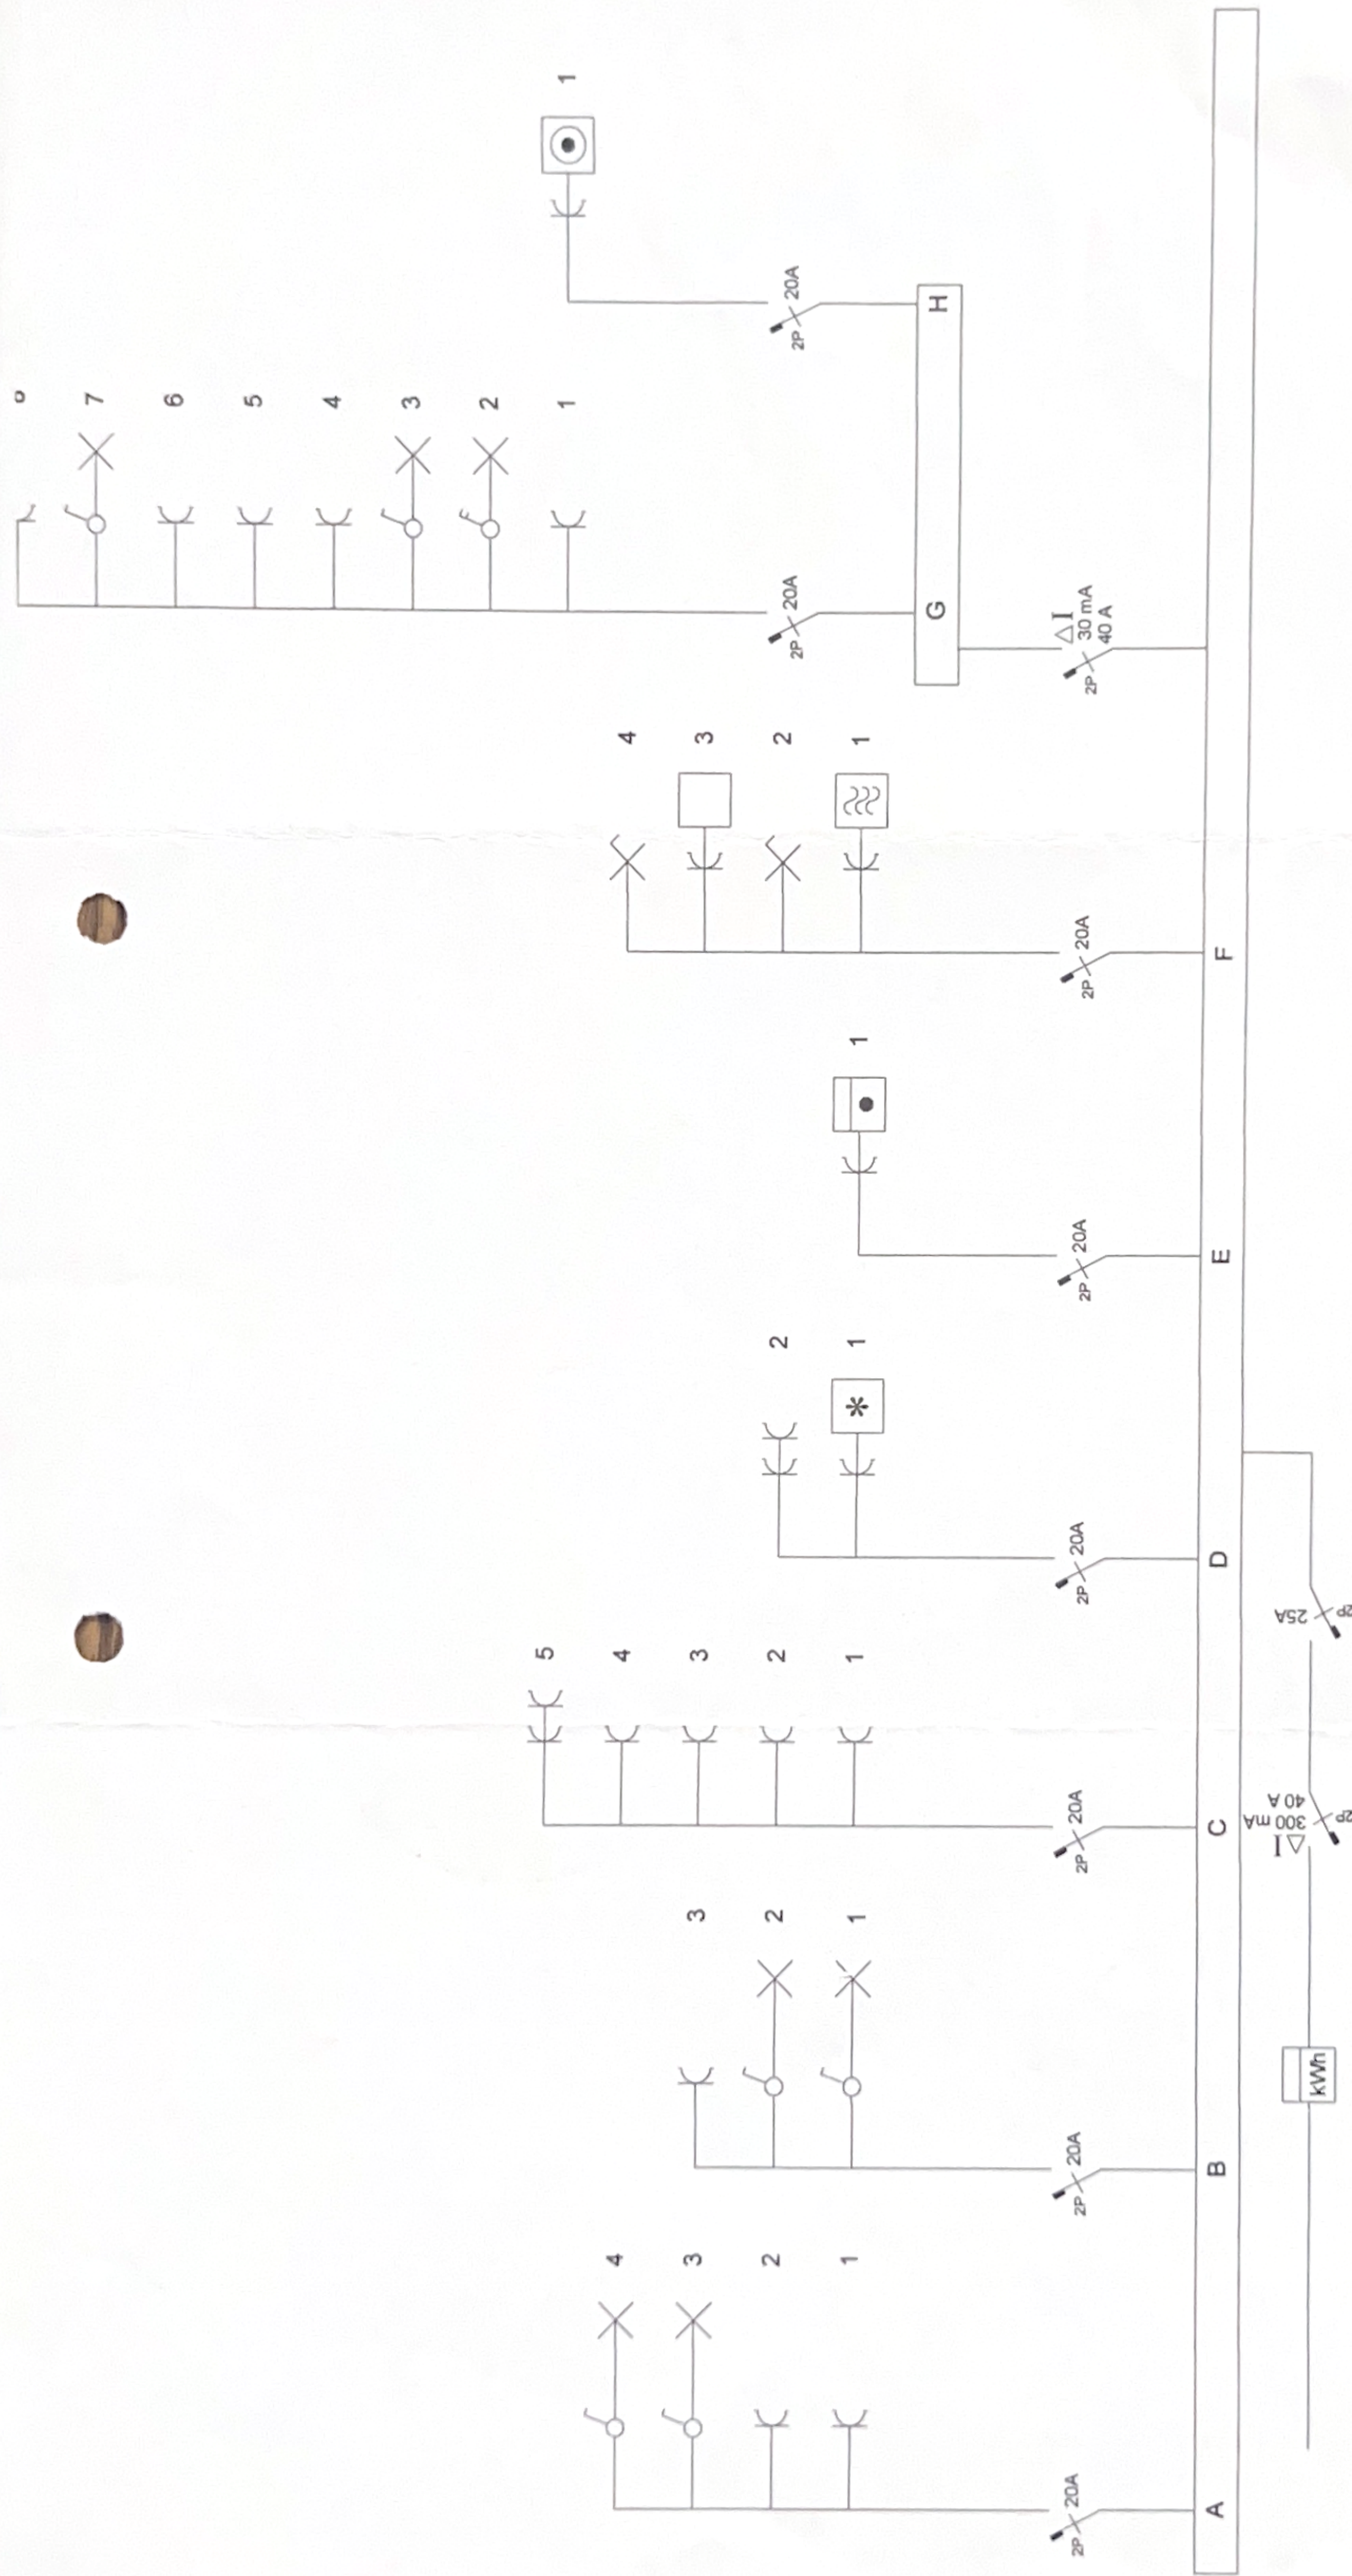

Installatie – adres : Pieter de Coninckstraat 9 2600 Berchem

Installateur





Naam : Elektro – Dave
BTW : BE 0822.648.189
Handtekening : 
Datum : 05/08/2010

Eigenaar

Naam : Katrien van Dyck
Straat : Pieter de Coninckstraat 9
Postcode en plaats : 2600 Berchem
Handtekening : 
Datum :

Afgevaardigde erkend organisme

Naam : BTW 163 Cooley
Handtekening : 18/11/2011
Datum : 

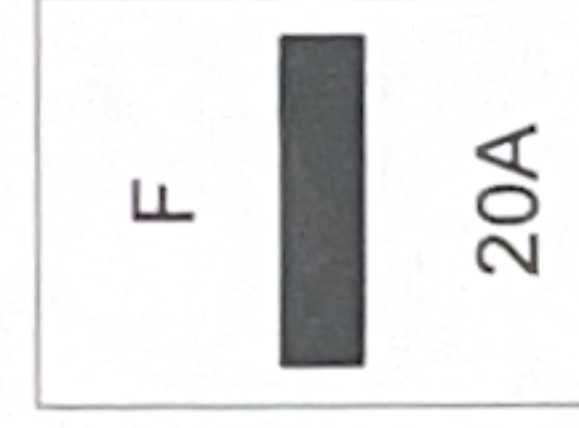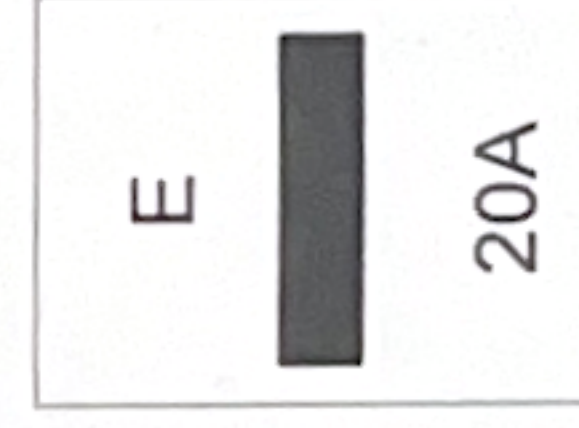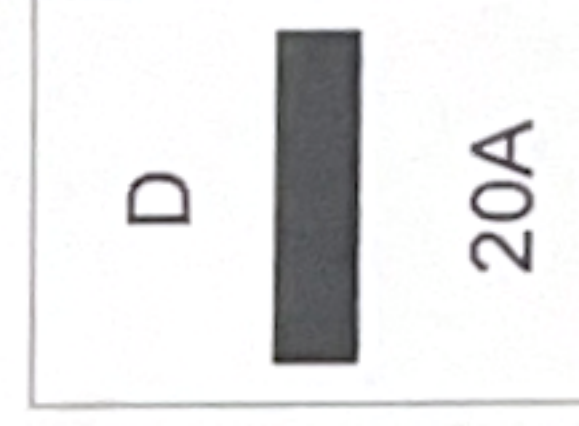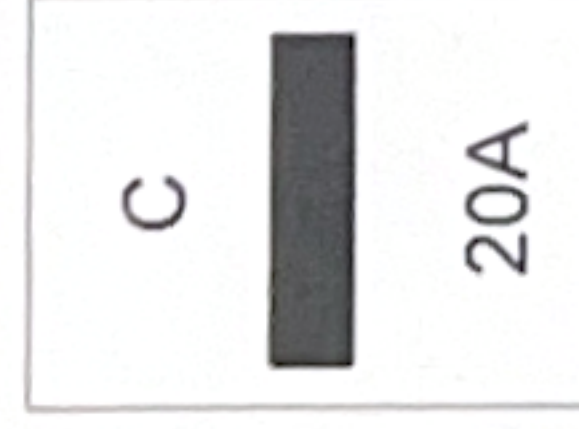

Kring A : stopcontacten living rechts + licht living en keuken

Kring B : licht hal en kleine slaapkamer + stopcontact kleine slaapkamer

Kring C : stopcontacten living Links en keuken

Kring D : koelkast en werkstopcontacten

Kring E : oven

Kring F : microgolfoven + dampkap + lichten onder keukenkasten

Kring G : stopcontact en lichtpunt badkamer + stopcontacten en lichtpunt grote slaapkamer + stopcontacten en lichtpunt bureau

Kring H : wasmachine

- A1 : stopcontact living rechts
- A2 : stopcontact living rechts aan TV
- A3 : lichtpunt living met enkelpolige schakelaar
- A4 : lichtpunt living met enkelpolige schakelaar

- B1 : lichtpunt hal met enkelpolige schakelaar
- B2 : lichtpunt kleine slaapkamer met enkelpolige schakelaar
- B3 : stopcontact kleine slaapkamer

- C1 : stopcontact living links
- C2 : stopcontact keuken naast deur
- C3 : stopcontact keuken naast raam bovenaan
- C4 : stopcontact living links
- C5 : dubbel stopcontact living rechts

- D1 : stopcontact koelkast
- D2 : werkstopcontacten keuken

- E1 : stopcontact oven

- F1 : stopcontact microgolfoven
- F2 : lichtpunt onder keukenkasten
- F3 : stopcontact dampkap
- F4 : lichtpunt onder keukenkasten


- G1 : stopcontact badkamer
- G2 : lichtpunt badkamer met dubbelpolige schakelaar
- G3 : lichtpunt grote slaapkamer met enkelpolige schakelaar
- G4 : stopcontact grote slaapkamer
- G5 : stopcontact grote slaapkamer
- G6 : stopcontact grote slaapkamer
- G7 : lichtpunt bureau met enkelpolige schakelaar
- G8 : dubbel stopcontact bureau

- H1 : stopcontact wasmachine



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

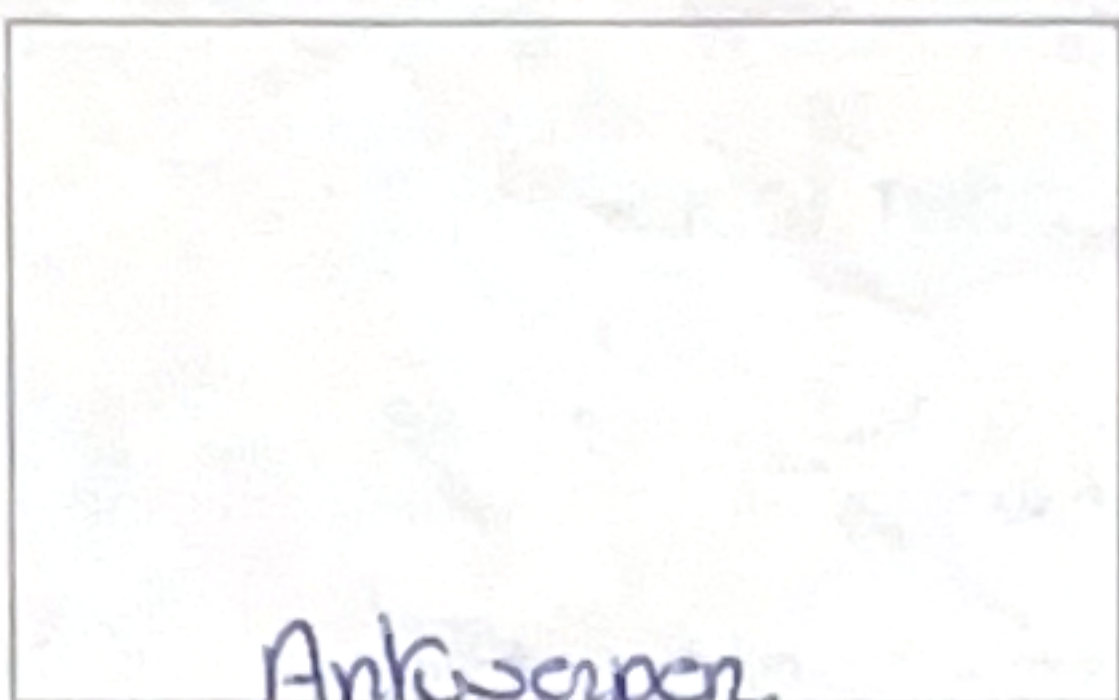

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 163/11118/02

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2600 Berchem

Pieter de Coninckstraat 9

EIGENAAR: Van Dyck

Adres: 2600 Berchem, Pieter de Coninckstraat 9

OPDRACHTGEVER: Idem

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 18/11/2011 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ABAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Voorlopig Verzwaring verkoop wooneenheid: Type der lokalen: App 4de links

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning mono 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A autbm

Voedingskabel hoofdbord: 2 X 6 mm²

Alg. schakelaar: type ADS 40A 30mA

Type van de aardelektrode: lus baren pennen horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: _____; RA: 20 Ohm; RI tot >100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: - Schroombanen zie eendaadschema.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

FASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF ~~NOTES~~ Geen.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers
naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18/11/2036 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening 163 Cogol

De directeur,
