

3391605

13/09/60/1263

|              |             |
|--------------|-------------|
| VERDELER     | PV nagezien |
| Naam         |             |
| Datum        |             |
| Handtekening |             |



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

EAN nr. :  
 Teller nr. : 32974484  
 Stand I : 009909,1 II :

## VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelijkvermogenonderzoek~~ controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001  
 volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / ~~AREI art. 271~~ / AREI art. 276bis /  
 Aanvulling verslag nr. :  
 Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Voorlopig~~ Bestaande / ~~Verzwarend / Splitting meter / Spanningswijziging~~ / Verkoop wooneenheid  
 Type der lokalen : ~~APPARTEMENT (4<sup>e</sup> D)~~  
 Plaats van onderzoek : ~~JOSSE GOFFIN LAAN~~ 133 BUS 10 1082 BRUSSEL  
 Eigendom van : ~~DR. KESTENS JOZEF~~  
 Opdrachtgever : ~~BLVA WILLETS P.&C. WEDERHAAT 56 1781 ROOSDAAL~~  
 Installateur :  
 BTW : ID-kaart : Uitgereikt te : Datum :  
 Onderzoeker : ~~JURGEN MOENS~~ Datum van onderzoek : 04/09/2013

### BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~3 x 230 V~~ ~~3 x 380 V / N~~ Max. Beveiliging : 2 x 6A Omschakelaar : stand  
 Hoofdbeveiliging : Zek. : 2 x 6A Schak. : 2 f 20 A 300 mA  
 Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 4 mm<sup>2</sup>  
 Voedingsbekabeling : kabeltype : aantal geleiders : doorsnede : mm<sup>2</sup>  
~~Bovengrondse net/ondergrondse net/bovengrondse net/ondergrondse net - Wachtbuis - geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat - aanwezig/niet aanwezig~~  
 Aardelektrode : Type : ~~lus / baren / pennen / horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm<sup>2</sup> Spreidingswaarde : 18 Ω  
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 3 Algemene isolatieweerstand : > 20 MΩ  
 Diff. schak. : algemene : 2 f 40 A 300 mA type A bijkomende : 2 f 40 A 300 mA type A (LAB)  
 werking testknop : in orde ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde ~~niet in orde~~  
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja ~~niet~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde ~~niet in orde~~  
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde ~~niet in orde~~  
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde ~~niet in orde~~  
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend ~~toestellen~~

### VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.  
 N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - nog niet geplaatst.

**I GEEN.**


### BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.  
 De installatiedient opnieuw gecontroleerd ~~door de installateur~~ uiterlijk op 04/09/2013  
 zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging  
 of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ mag niet in dienst gesteld  
 worden / blijven indien zonder verhoging wordt voldaan aan de vastgestelde minimum veiligheidsmaatregelen  
 maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,  
de onderzoeker

**JURGEN MOENS**  
 Kruiskouterstraat 59  
 O.C.B. 1750 Lennik  
 02/269.07.07 0475/45.23.82

Shidro Jef. Kestens

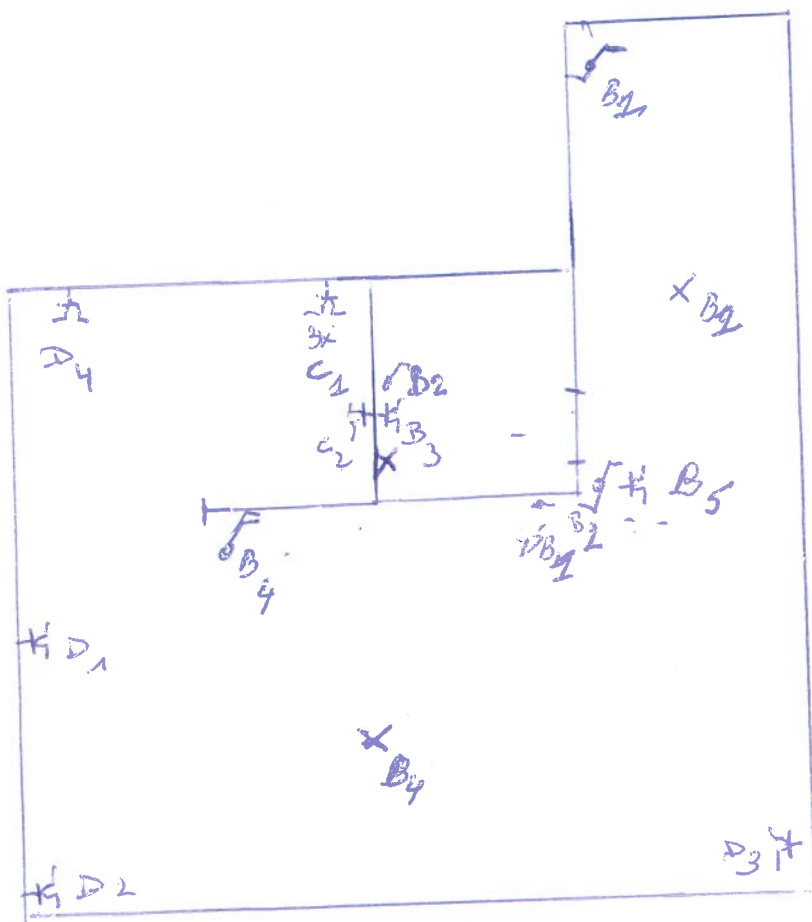

4. 09. 2013

**Jurgen MOENS**  
inspecteur  
**O.C.B.**  
Kruiskouterstraat 59 • 1750 Lennik  
☎ 02-269.07.07 • 0475-45.23.82

