

CERD: _____ Compteur n°: _____ Index: _____ Code EAN: _____

CONTROLE D'INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION ALIMENTEE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION BT

Appareils de mesures utilisés: Mesureur de terre n° SGS: B0031 - Mesureur d'isolement n° SGS: B0031 - Mesureur de continuité n° SGS: B0031
 Schéma liaison à la terre: TT - TN - IT Procédure technique: (RGIE art. 86) TEC EE 102
 Date du contrôle: 10/11/19 (RGIE art. 87/86) TEC EE 211 - 212
 Type de contrôle: examen de conformité avant mise en usage (RGIE art. 270) (Prescriptions distributeur)
 visite de contrôle périodique (RGIE art. 271 et 271 bis) (RGPT art. 262) (Prescriptions distributeur)
 Ancienne installation: visite de contrôle pour renforcement et/ou changement compteur (RGIE art. 276) (Prescriptions distributeur) (Information importante au verso)
 Type d'installation: Existante - Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Chantier:
 Type locaux - compris dans l'installation: habitation (maison, appartement, autres...), compteur de chantier "domestique", parties communes d'une installation résidentielle:
 Début des travaux: fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5: Oui/Non
 Raccordement: Tension: 230V V AC-DC; Protection raccordement: Existante: _____ A - Prévue: _____ A
 Alimentation tableau principal: 1 x 25 mm², type: ELAB; Inter. général: 100 A, type: _____ A
 Type prise de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
 Nombre de tableaux: _____; Nombre de circuits term.: 12; Ra = 115; Ri tot = 10 M

DESCRIPTION: ☒ Voir schéma en annexe

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>3000</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

Dispositif de protection à courant différentiel résiduel (DPCDR)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
<u>3000</u>	<u>3000</u>	<u>300</u>
Circuit	Calibre	Ligne / Utilisateur
		<u>voir plans</u>

- DPCDR installés adaptés à la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre: Bon - Infractions - Remarques
- Protections installées contre les surintensités adaptées aux sections des circuits qu'elles protègent: Bon - Infractions - Remarques
- Existe-t-il salle de bains - lessiveuse - salle d'eau - lave-vaisselle - séchoir - boiler - salle de douche: Oui - Non.
- Eclairage TBTS placé: Oui - Non.
- Chauffage électrique placé: Oui - Non.
- Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas: Bon - Infractions - Remarques.
- Etat du matériel électrique: Bon - Infractions - Remarques.
- Protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects: Bon - Infractions - Remarques.
- Continuité des liaisons équipotentielles principales et supplémentaires: Bon - Infractions - Remarques.
- Matériel électrique fixe et mobile: Bon - Infractions - Remarques.
- Contrôle du fonctionnement des DPCDR par leur bouton test via un courant de défaut: Bon - Infractions - Remarques.

INFRACTIONS - REMARQUES:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: voir verso.

CONCLUSION: Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

L'installation est conforme aux prescriptions du RGIE. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur, sous réserve de ☐ (voir verso 1). Le DPCDR général est: était plombé. Les schémas, unifilaire(s) et de position, ont été visés et sont signés par les deux - trois personnes intéressées.

L'installation n'est pas conforme aux prescriptions du RGIE. Le DPCDR est: était plombé ☐ (voir verso 2).


Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le _____

L'INSPECTEUR:
 N° = nom + signature

NOM - FONCTION/QUALITE:
 Vu inspecteur à la date ci-dessus


VISA DU DISTRIBUTEUR:

DATE:

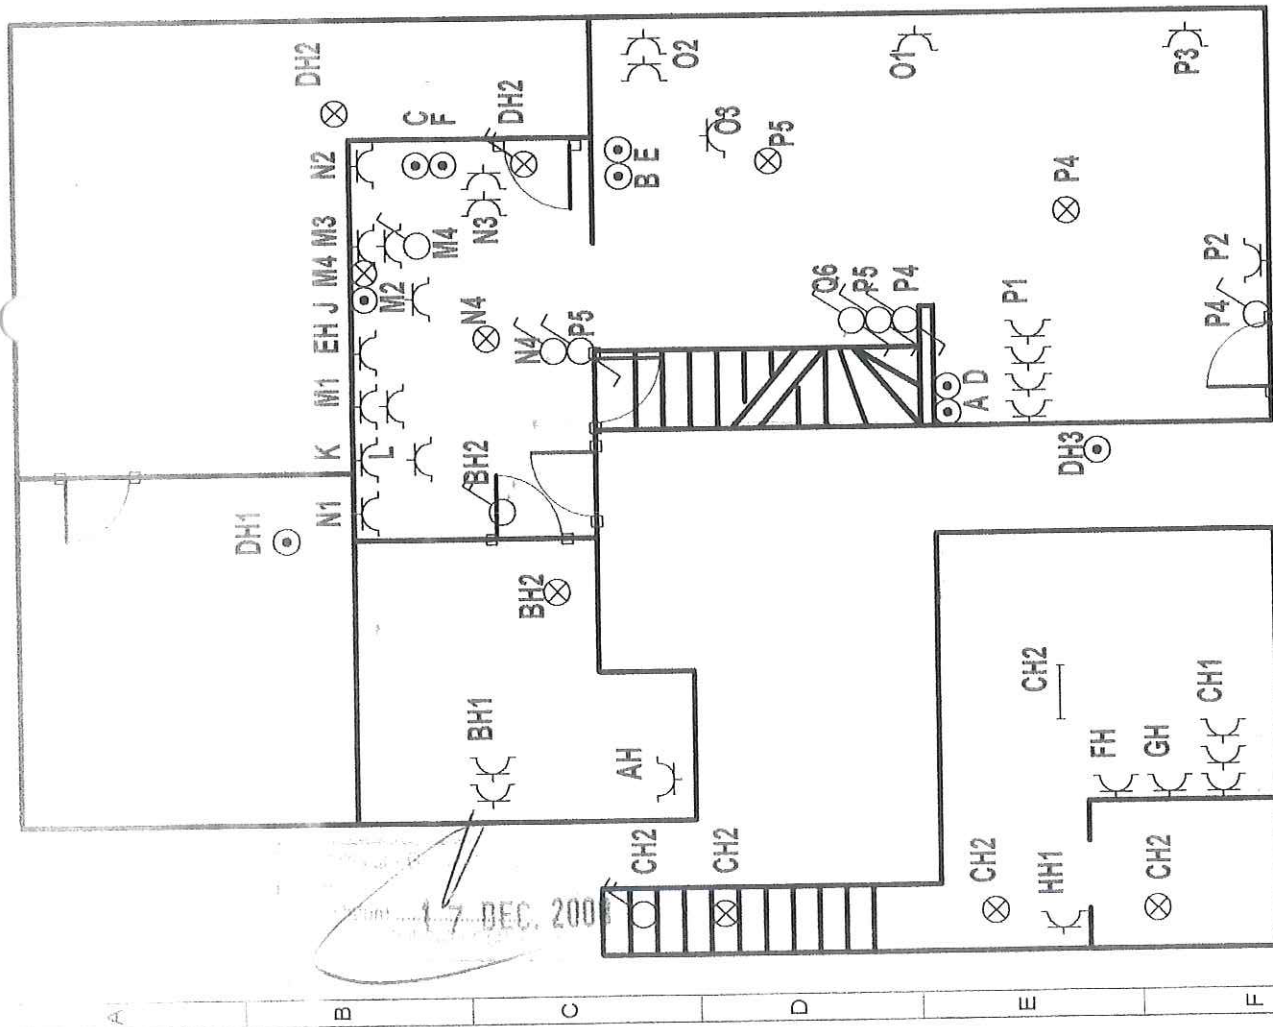


CAVE

REZ-DE-CHAUSSEE

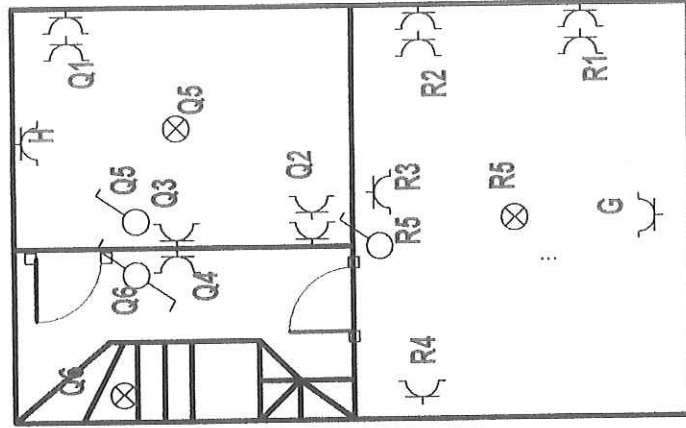

ETAGE

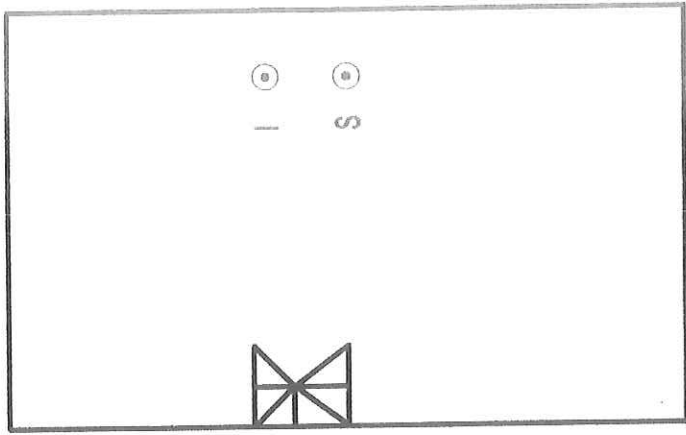

GRENIER

Désignation du dossier

HANCART ELEC SPRL

Rue TERRY MOUCHON 101

6042 Lodelinsart

TVA BE 461 045 651


0475 / 50 28 94

Désignation du folio


1

Schémas d'implantation
Plus de 1 mètre 70 à 7m la mesure

Concepteur	Date	Modifications	Date
Hancart			
Réalisateur	Date		
Hancart			
Vérificateur	Date		
Hancart			

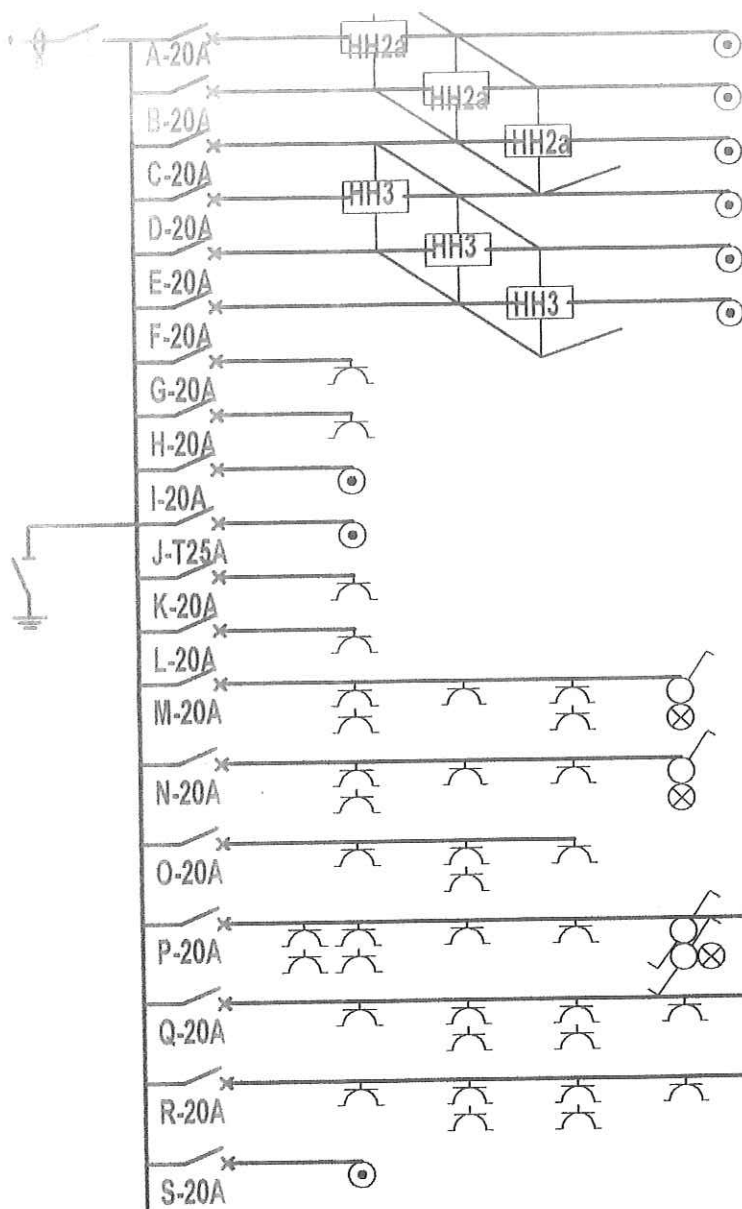

DIFFERENTIEL SANITAIRE 40A/30mA

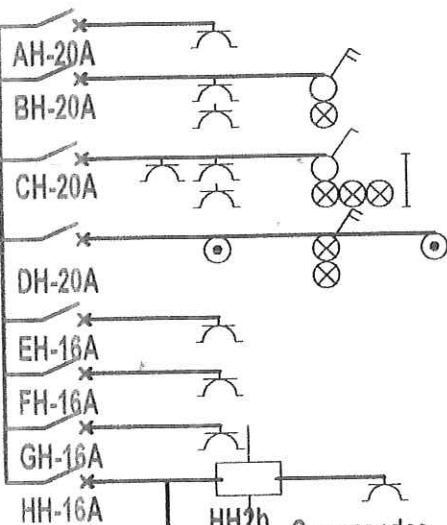

HH2b

Commandes

Commande HH3

HH2a
HH2b

Thermostat

Accumulateur Salon
 Accumulateur Salle à manger
 Accumulateur Cuisine
 Fonctionnement accu Salon
 Fonctionnement accu SAM
 Chauffage direct Cuisine
 Chauffage chambre avant
 Chauffage chambre arrière
 Chauffage grenier
 Cuisinière
 Four traditionnel
 Four à micro-ondes
 Cuisine
 Cuisine
 ...
 Salle à manger
 Salon et éclairage Séjour
 Chambre arrière et escaliers
 Chambre avant
 Grenier

Chauffage SAB
 Salle de bains
 Caves
 Extérieur
 Lave-vaisselle
 Lave-linge
 Sèche-linge
 Chauffe-eau

17 DEC. 2008
