



N° 234-INSP.

**ELECTROTEST**Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et FormationV.Z.W.
ASBLKerkstraat 33
1820 MELSBOEK

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Ones

Nr teller :

N° comp :

3266218

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° rapport: 3266218

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. ☐
Genre de contrôle : RGIE ART		☐	☒	☐	☐	☐		

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de Bruxelles 22

1472 Viers

Eigenaar

Propriétaire: TERA TERRE

Adres :

Adresse :

GENAPPE

Installateur :

KEMURMIRE

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

30/11/2015

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

BELLIANS

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. 2.1

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding

Liaison compteur-tableau :

XUB 4x10-2

Max. beveiliging :

Protection max. :

63A

Aardelectrode :

Electrode de terre :

Bougie

Ohm

Isolatie :

Isolement :

643

Mohm

Aantal verdeelborden :

Nombre de tableaux :

7

Differentieelschakelaars

Interrupteurs différentiels

In (A)

 Δ In (mA)

type

63

300

A

63

30

A

Aantal eindstroombanen :

Nombre de circuits terminaux :

14

51-14

1-14

Test In

OK

NOK

☒☒☐☐☐

1. In

OK

NOK

☒☒☐☐☐

AREI / RGIE

270

271

271bis

278

☒☒☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐Visueel nazicht : algemeen : ☒ OK ☐ NOKControle visuel : général : ☒ OK ☐ NOKdirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOKcontact direct : ☒ OK ☐ NOKIndirecte aanraking : ☒ OK ☐ NOKContact indirect : ☒ OK ☐ NOK

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potentiaalvereffeningen :

Liaisons equipotentielles :

OK ☒NOK ☐

Inbreuken/Infractions :

Opmerkingen/Remarques :

(zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.

De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation.

Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.).

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.).

Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek : 30/11/2016

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions.

Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.

Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de betrokken FOD verwittigd van de aanwezigheid van inbreuken.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur



Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
☐	☐	☐	☐	/
271 AK	☐	271 HK	☐	/
276 AK	☐	276 HK	☐	/

(02) 751 98 39
(02) 751 52 09
BE 0434 433 603

KBC: 734-11262000-33
IBAN nr: BE79 7341 1260 0033
BIC adres: KREDBEBB

BELFIUS: 068-2117692-45
IBAN nr: BE83 0682 1176 9215
BIC adres: GKCCBEBB

www.electro-test.be
info@electro-test.be
RPR Brussel

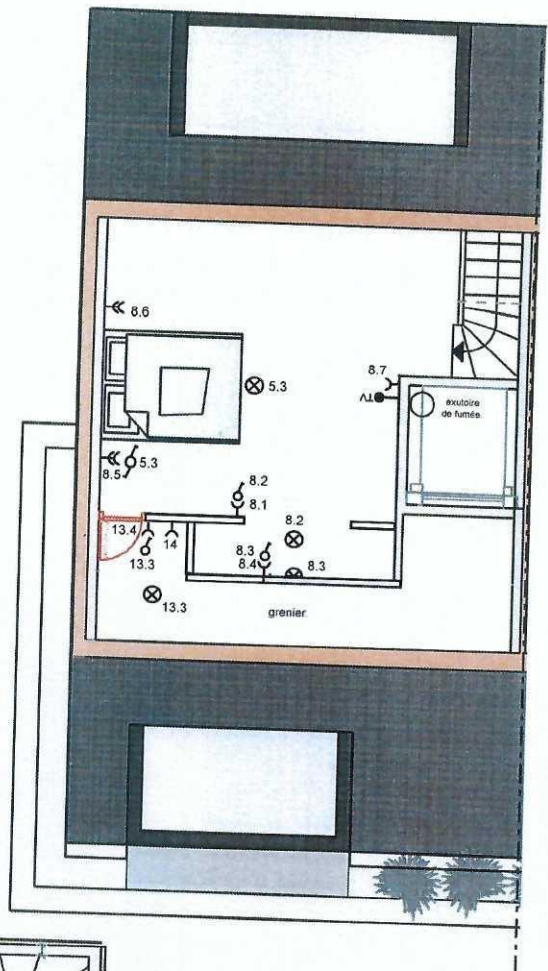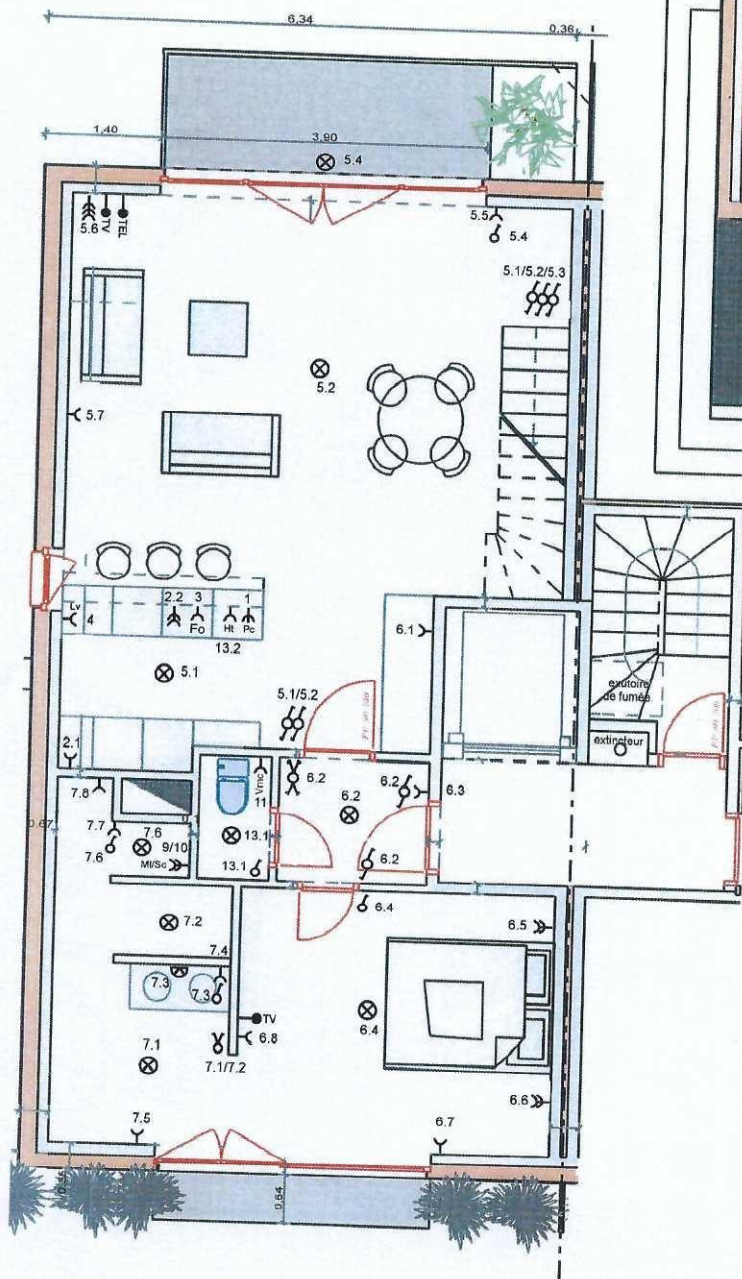

Cave 1 :
 - 1 point lumineux, 1 direction
 - 1 prise avec terre et sécurité

Client : TERATERRE
 Rue du Monument, 29a
 1340 OTTIGNIES

Chantier : Rue de Bruxelles, 221/1
 1472 VIEUX-GENAPPE
APPARTEMENT 2.1


ENTREPRISE D ELECTRICITE

Tél : 019/69.72.57.
 Fax : 019/69.73.21.
 TVA : BE 888.692.224.

**KEMPINAIRE
 S.P.R.L.**



RUE DE LANTREMANGE, 37 - 4350 POUSSET

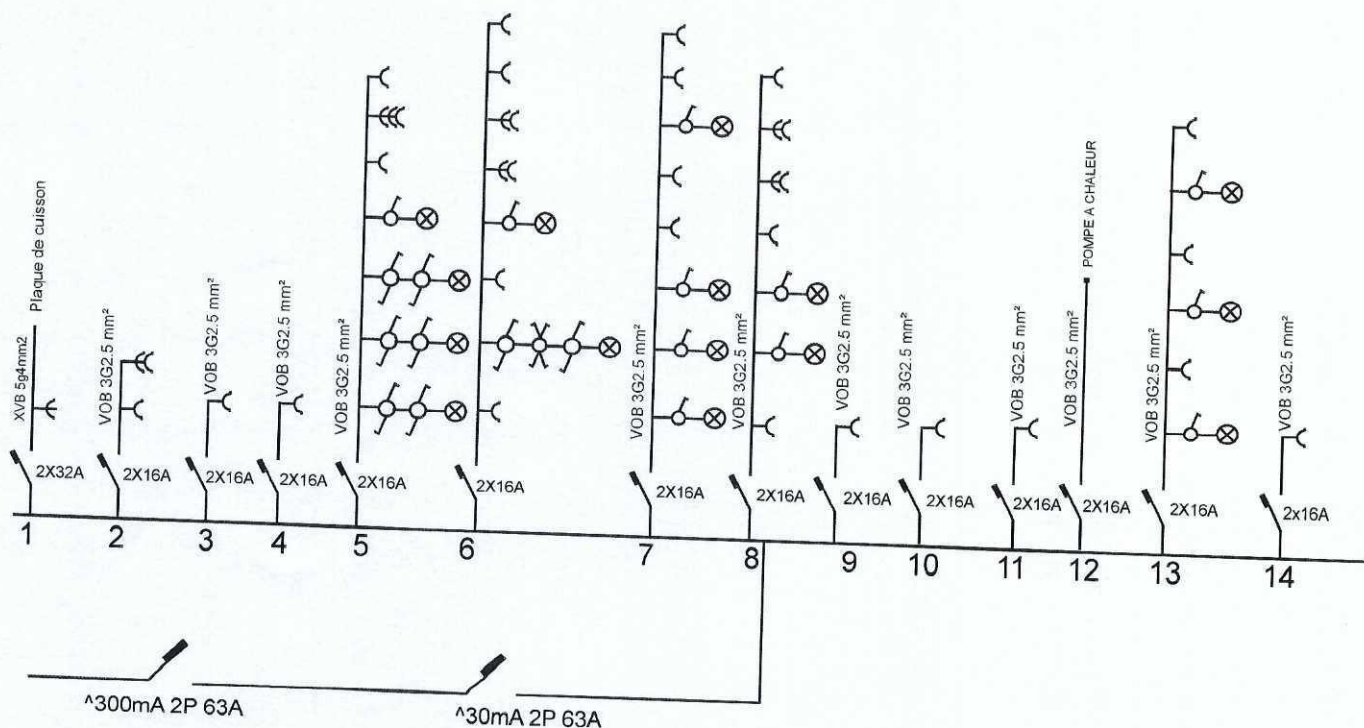

Cliant : TERATERRE
Rue du Monument, 29a
1340 OTTIGNIES

Chantier : Rue de Bruxelles, 221/1
1472 VIEUX-GENAPPE
APPARTEMENT 2.1

ENTREPRISE D ELECTRICITE

Tél : 019/69.72.57.
Fax : 019/69.73.21.
TVA : BE 888.692.224.

**KEMPINAIRE
S.P.R.L.**



RUE DE LANTREMANGE, 37 - 4350 POUSSET
