



ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

0475/623096

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE : OUD DORP 26A, HELDREGEN

EIGENAAR : GEENS

Adres : LEBEKE 93, D'HOOTEN

OPDRACHTGEVER : idu

Adres : _____

INSTALLATEUR : idu

Adres : _____

BTW of IK : _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index : _____

Datum van het onderzoek : 22/2/2010 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens : (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art.262) (K.B.2.6.2008) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie : Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid: Type der lokalen : woning

Begin werken : Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.03 AREI art.86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting (cont. max 40 A)

Voedingskabel hoofdbord : 2 x 10 mm² Alg. schakelaar : type different

Type van de aardelektrode : lus - baren - permen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 16 ; RA : 2,8 Ohm; RI tot 770 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING : _____

zie schema's (in bijlage)

UITGEVOERDE CONTROLES : zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S : _____

Geen

Table with 2 columns: PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK, gezien op, de aangestelde van de stroomverdelers naam, handtekening

Plicht van de eigenaars, beheerders of huurders : Zie keerzijde.


BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 22/2/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. 2. De installatie is niet conform. 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER : [Signature]

De directeur,



- A: CENTRALE VERWARMING
- B: VERLICHTING + STOPKONTAKTEN IN DE BADKAMER
- C: WASMACHINE
- D: DROOGKAST
- E: VAATWAS + WATERPOMP
- F: STOPKONTAKTEN ZOLDER
- G: STOPKONTAKTEN SLAAPKAMER 1 + SLAAPKAMER 2 + 1 OP HAL 1E VERDIEP
- H: STOPKONTAKTEN LIVING LINKS
- I: STOPKONTAKT LIVING RECHTS + 1 IN HAL GELIJKVLOER
- J: STOPKONTAKTEN KEUKEN + GARAGEPOORT + TV VERSTERKER
- K: OVEN
- L: ELEKTRISCH VUUR
- M: PARLEFOON
- N: VERLICHTING GELIJKVLOER
- O: VERLICHTING SLAAPKAMERS + BERGING ZOLDER
- P: VERLICHTING HALLEN + VERLICHTING AAN VOORDEUR

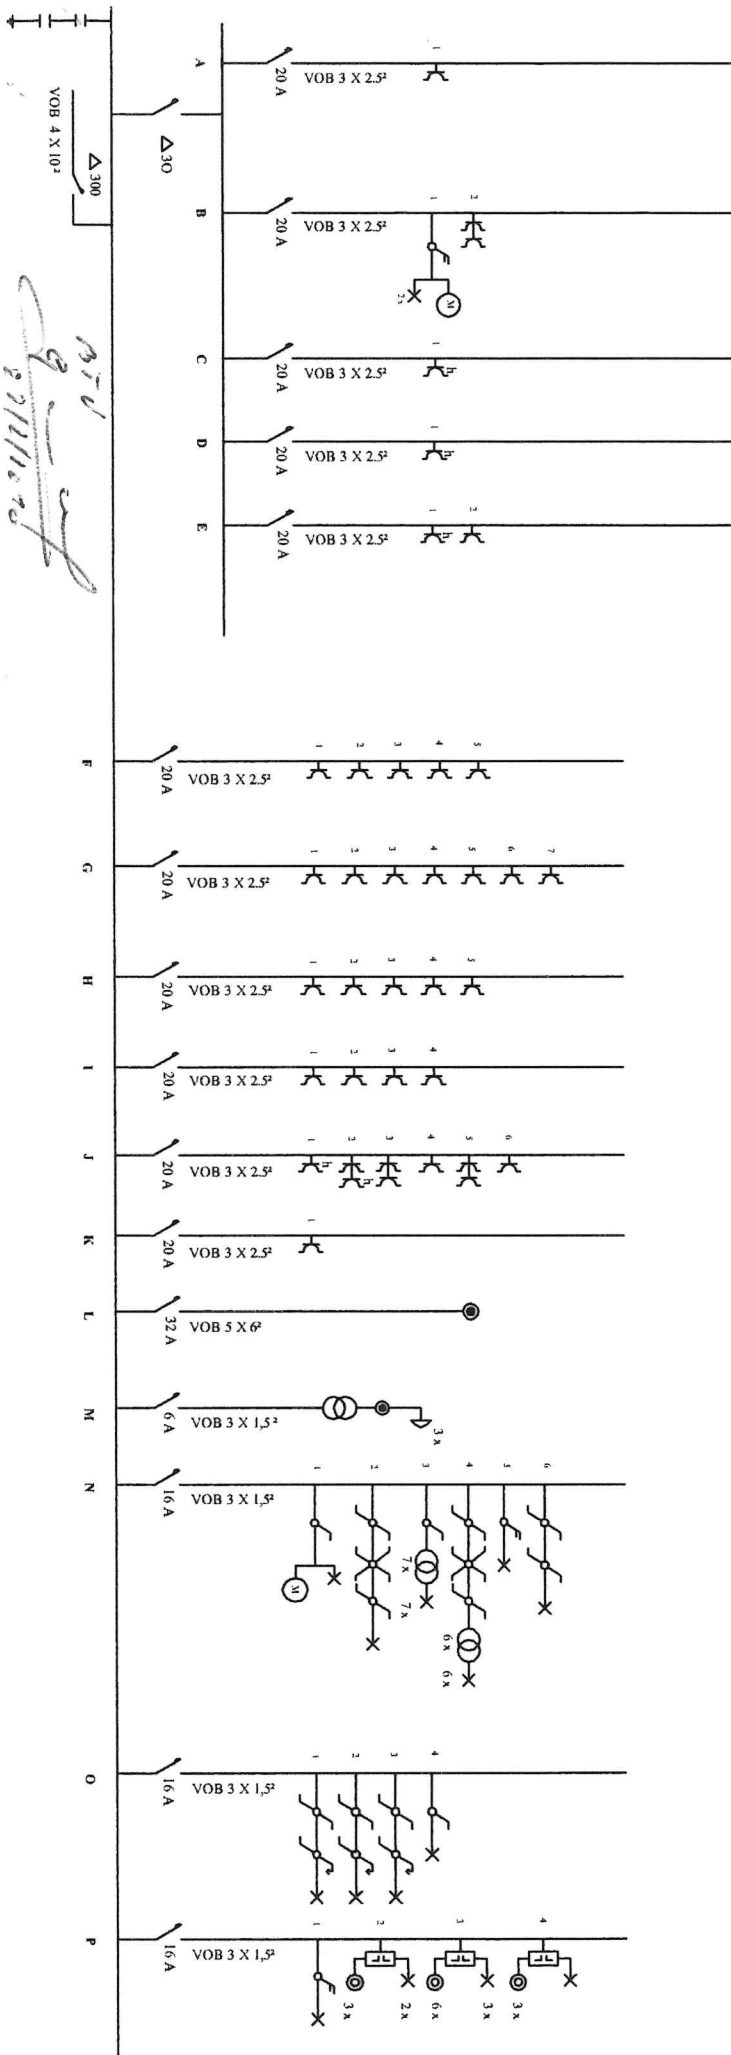

M.D.
 21/11/20

BT 1
02/12/2010

