

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2024/52368/G01:2

RÉF. 125/2024/52368/G01:3

DATE DU CONTRÔLE
ADRESSE DU CONTRÔLE

22/01/2024
Montagne Sainte-Walburge 147
4000 Liège

INSPECTEUR
TYPE DE CONTRÔLE

Tiago Ferreira
Contrôle périodique de
conformité



› DONNÉES GÉNÉRALES

Donneur d'ordre / client

Base du contrôle

› DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION

Type de gaz	gaz naturel H
GRD	RESA
Pression nominale (mbar)	20
Marque du compteur	Actaris
Index compteur	13344,51
Numéro de compteur	30132030
Classe Qmax	10
Type d'installation	nouvelle

Canalisations	1	2	Appareil	1	2
Matériau	PLT	Cu	Catégorie	I2E(S)	I2E(S)
Diamètre		Dn 22	Type	C33	C33
Longueur totale	16,9	7,8	Marque	Vaillant	Vaillant
Longueur visible	1,8	7,6	Puissance (kW)	24	24
			Autre		

› CONTRÔLE

Contrôle d'étanchéité

Pression du test (mbar)	150
Sur toute l'installation	Oui
Appareil utilisé	manomètre dont est titulaire l'inspecteur

Perte de pression (mbar) zéro

Contrôle sur les parties visibles et accessibles

Raccordement	OK
Amenée d'air	sans objet
Présence des schémas et correspondance avec l'installation	OK

Durée du test (minutes)	20
Sur les parties visibles et accessibles	Oui
Avec produit moussant	Oui

Ventilation des locaux	sans objet
Evacuation des produits de la combustion	OK
Contrôle visuel des canalisations et leurs accessoires	OK

Conclusion



Le test d'étanchéité a donné satisfaction.
L'installation, par rapport aux bases du contrôles, est conforme.
Fait à : Liège

Signature du technicien

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2024/52368/G01:2

RÉF. 125/2024/52368/G01:3

DATE DU CONTRÔLE

22/01/2024

INSPECTEUR

Tiago Ferreira

ADRESSE DU CONTRÔLE

Montagne Sainte-Walburge 147
4000 Liège

TYPE DE CONTRÔLE

Contrôle périodique de
conformité



REMARQUES

- Le conduit d'évacuation n'est pas accessible. Son placement reste la responsabilité de l'installateur.

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ


EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2024/52368/G01:2

RÉF. 125/2024/52368/G01:3

› ANNEXES

Autre

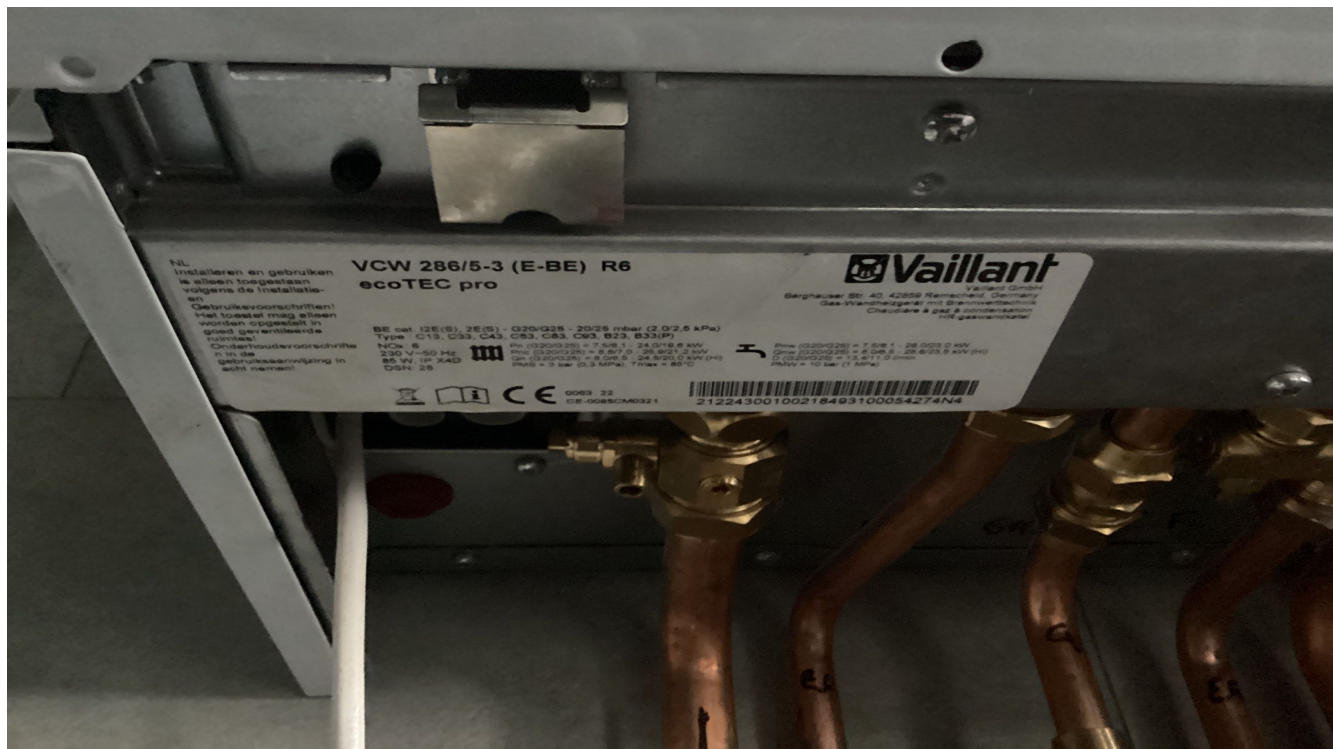

CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION DE GAZ

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 125/2024/52368/G01:2

RÉF. 125/2024/52368/G01:3

› ANNEXES

Autre



Schéma isométrique

