

N° 21782

Contrôle Industriel Belge

a.s.b.l.



Bruxelles : 126, b° 12 - Avenue des Croix de Guerre - 1120 Bruxelles
Mons : Parc Initialis - 2 - Avenue Descartes - 7000 Mons
Liège : 61/63 - Rue Grand-Vinâve - 4101 Jemeppe

Tél : 02/245.46.95
Tél : 065/32.15.51
Tél : 04/234.17.00

Fax : 02/215.12.78
Fax : 065/32.15.77
Fax : 04/234.17.80

Compte Bancaire : 340-0298168-28 T.V.A. BE 0406.671.312

- CONFIDENTIEL -

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BT ET TBT

(Contrôle effectué selon la procédure interne PRO-INS-E-01).

Rapport N° : 16/070220/05
Date du Contrôle : 20.02.2007
Propriétaire Nom-Prénom : M. M. Constantin
Adresse : Rue de la Paix n° 4 4800 Sfo.
Personne responsable de l'exécution du travail : Eurochemiel Centre
Nom-Prénom :
N°TVA/N°C.Ident :
Adresse de l'installation : Rue des 2 Toits 1001 P'de Durbuy Affair 1001 C 6940 Barvaux

TYPE DE CONTROLE :

- A) Examen de conformité d'une installation électrique BT et TBT domestique effectué sur base des prescriptions du RGIE :
☒ Contrôle avant mise sous tension - ☐ Contrôle d'une installation existante avant remise en service.
 B) Examen de contrôle d'une installation électrique BT et TBT domestique en vue d'un renforcement de puissance de raccordement au réseau public de distribution, effectué sur base des prescriptions du RGIE.

TYPE D'INSTALLATION :

☒ Unité d'habitation ☐ Parties communes ☐ Autres :
 Distributeur : Raccordement suivant câblage tableau : Tension : 230/400 V.
 Alimentation tableau principal : 4 X 10 mm². Protection raccordement : 40 A. (☒ In max. à prévoir)
 Colonne d'alimentation : 4 X 150 mm². Interr-Sect.Général : diff 40 A.
 Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 16 $R_E = 6,2 \Omega$ $R_{IGEN} = 15 M\Omega$
 Type prise de terre : ☒ boucle ☐ piquets

Différentiels	I_n en A	I_{cc} en kA	I_{Δ} en A	Circuits protégés	I_n en A	I_{cc} en kA	I_{Δ} en A	Circuits protégés	I_n en A	I_{cc} en kA	I_{Δ} en A	Circuits protégés
40	3	0,3	100	1								
40	3	0,03	6	6								

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION :

Circuits	Protections	Sections	Circuits	Protections	Sections
2	diff II 16A	2,5-1	1	diff II 4A	1,5-1
4	- V II 20A	2,5-2	1	- II 16A	1,5-1
1	- IV 25A	4-2	1	- II 16A	2,5-2
1	- IV 16A	2,5-2	8	- II 20A	2,5-2

MANQUEMENTS (INFRACTIONS / REMARQUES) :

Infractions : Absence de marquage des câbles de liaison, raccordement des liaisons équipées à la terre. Eclairage, chauffage et boiler non installés. Pas de notice jointe.

NOTES :


- Le différentiel général : ☐ était plombé ☐ n'a pu être plombé ☒ a été plombé ☐ n'est pas plombable
 - Les schémas ☐ ont été signés ☐ n'ont pas été signés ☐ absence de schémas

CONCLUSIONS :

- ☒ - L'installation est conforme. La prochaine visite est à prévoir avant le : 20.03.07
☐ - L'installation n'est pas conforme. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements (i/r) constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
☐ - Dans le délai d'un an à dater de ce jour, en cas de refus d'une seconde visite ou au cas où des infractions subsisteraient, une copie du procès verbal sera envoyée conformément à l'Art. 276.02 du RGIE à l'Administration de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.
☐ - Les résultats du contrôle ne permettent pas de déclarer l'installation conforme. Un examen supplémentaire est à exécuter par le même organisme avant la (re) mise en usage de l'installation.


L'inspecteur (Nom+signature)
Pour CIB-asbl

Le demandeur (Nom+signature)



18013
Haupt
100207

C. 1

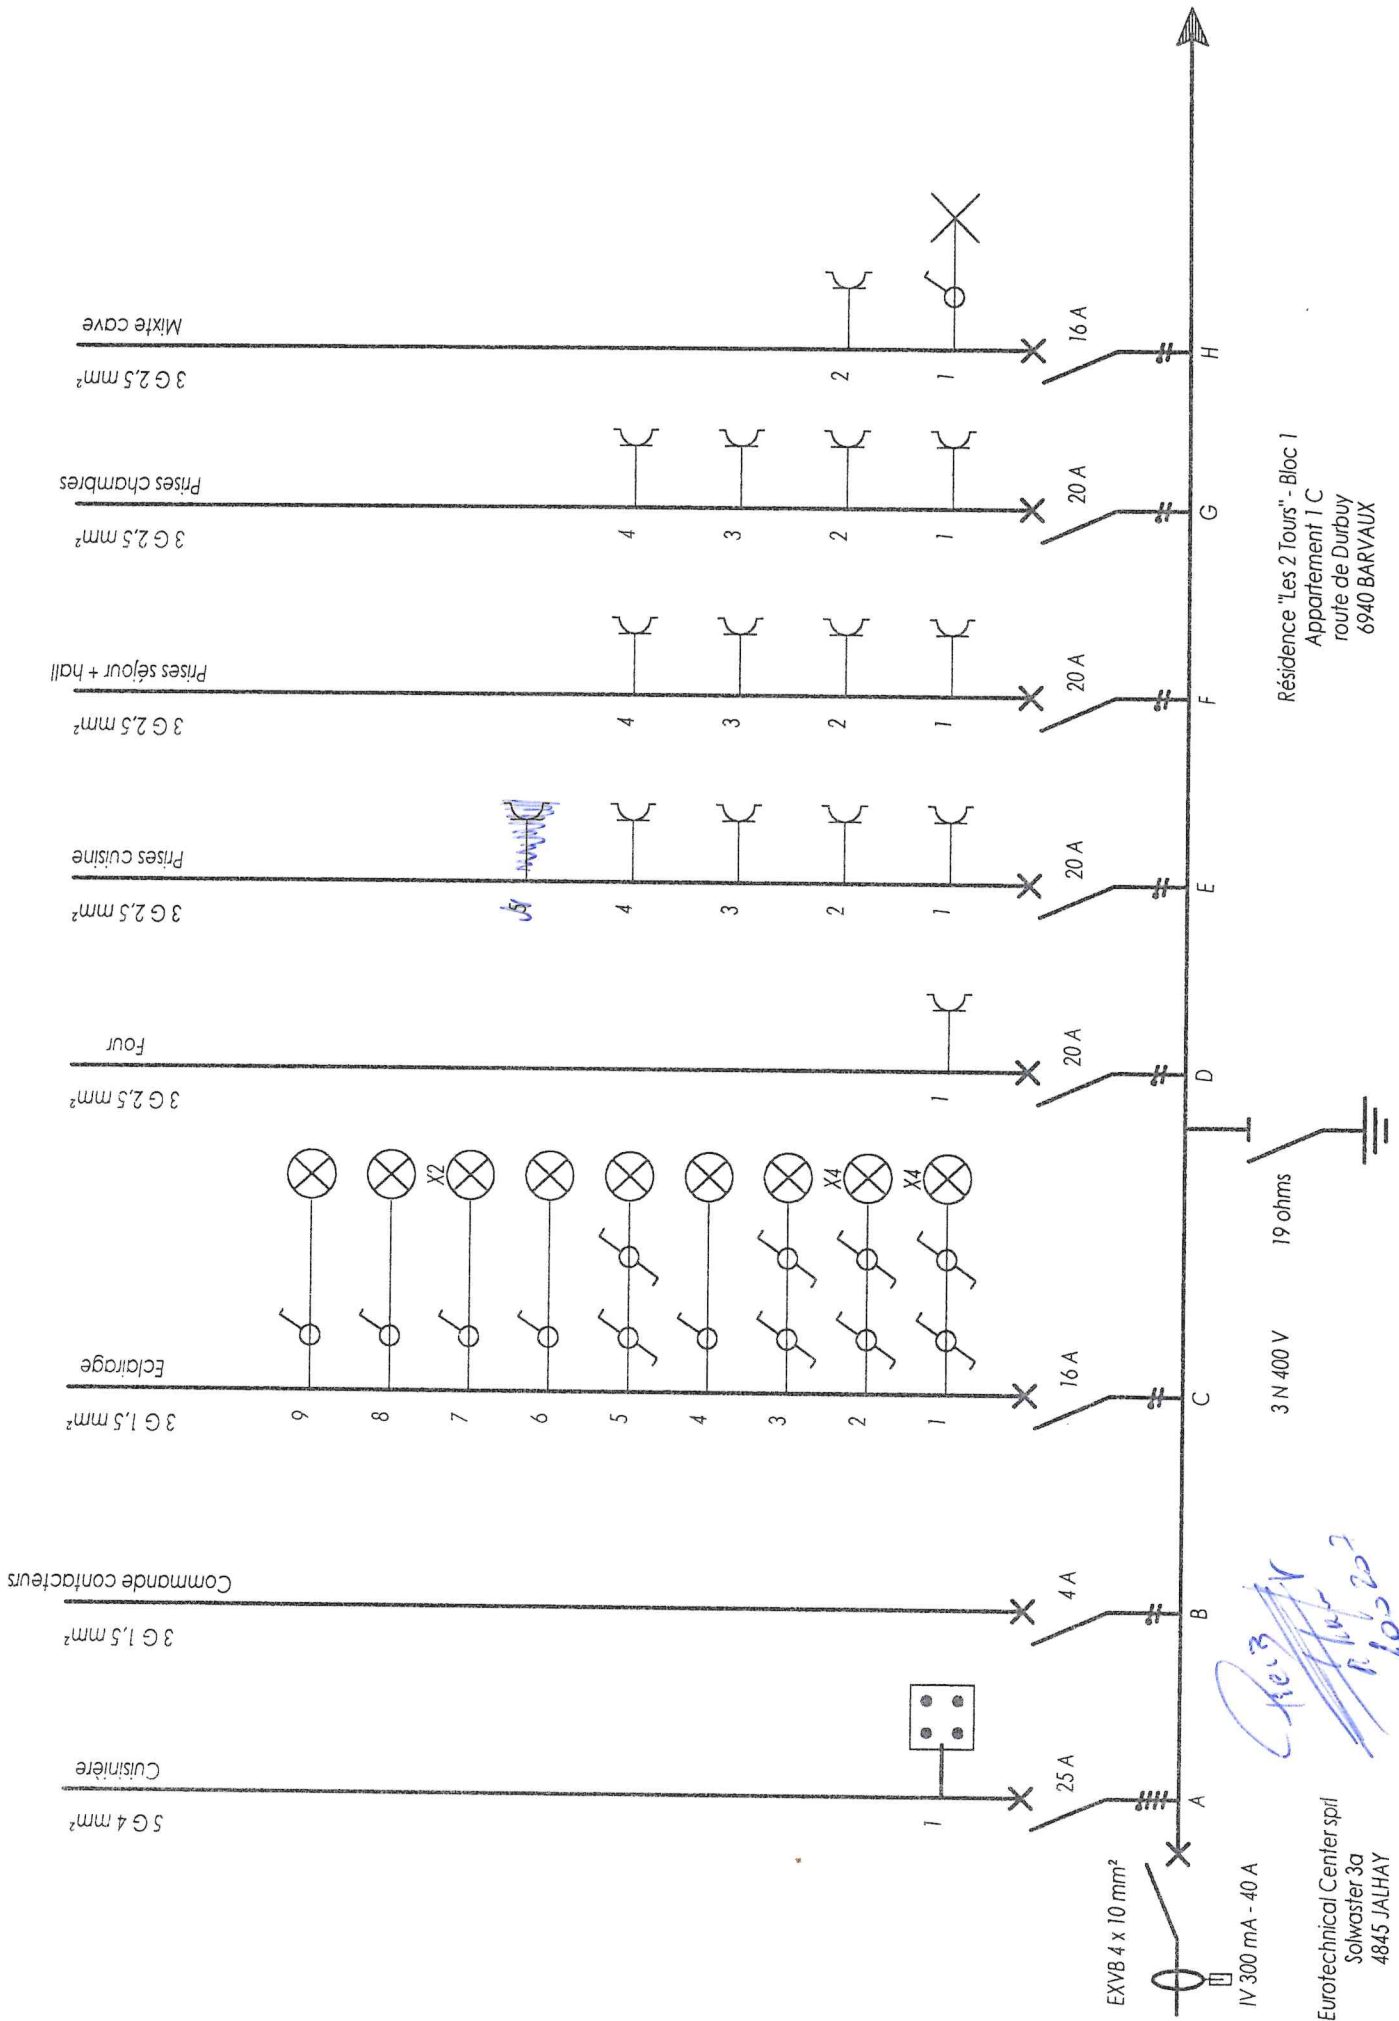

Résidence "Les 2 Tours" - Bloc 1
 Appartement 1 C
 route de Durbuy
 6940 BARVAUX

Eurotechnical Center sprl
 Solwaster 3a
 4845 JALHAY

