



Gewestelijk kantoor
VLAAMS BRABANT
Leuvensesteenweg 383 b1
3200 GELRODE
Tel: 016 / 63.47.45
Fax: 016 / 63.12.21

GEUKENS ELEKTRO
BEVRIJDINGSSTRAAT 22
3945 HAM

O/Ref. :
U/Ref. : HHIgeukens311
Tel. : 011 / 34.33.27.
Fax. : 011 / 34.73.45.
Verslagnr. : 4609122411

VERSLAG VAN HET ONDERZOEK VAN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIES

Gelijkvormigheidonderzoek A.R.E.I. art.270

- Datum van het onderzoek : 24/12/2009
- Plaats van het onderzoek : Lokerenstraat, Turnhout
- Opdrachtgever : C.B.O.
- Eigenaar van het gebouw : idem
- Gebruiker v.d. installatie : idem
- Installateur : Geukens Elektro, Ham
- Stroomleverende maatschappij : Eandis
- Aanwezige personen : Mr. Geukens

1- ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN

- Aard van de lokalen : H.H.I. : appartement : nr. A 1.7 SOLDATENPAD 5 bus 5
- Aantal verdeelborden : 1
- Aantal eindstroombanen : 13
- Type van de aardelectrode : lus
- Fundering voor na 01.10.1981 : na
- Spanning : 230 V
- Stroom : aut 40 A max.
- Differentieel : 40A/300mA/2P
- Voeding : 4 x 10 mm²

- Reglementen en voorschriften van toepassing: A

A.- Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties A.R.E.I.

B.- Algemeen Reglement v.d. Arbeidsbescherming A.R.A.B.

C.- Technisch Reglement T.R.

D.- Voorschriften van de stroomleverende maatschappij

E.- Bijzondere voorschriften voor :

2- HET ONDERZOEK HEEFT ONDER ANDERE BETREKKING OP :

- Algemene toestand van de elektrische installatie;
- Conformiteit met de onder punt 2 vermelde reglementen ;
- Bescherming tegen rechtstreekse aanraking ;
- Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking ;
- Bescherming tegen kortsluiting en overstroom.



Verslag nummer: 4609122411

2../2

3.- MEETRESULTATEN

- a.- Verspreidingsweerstand van de aardinrichting : 4.5 Ohm
- b.- Algemeen isolatie niveau van de installatie : 100 MOhm
- c.- Isolatieniveau per stroombaan : /
- d.- Werking van de differentieelstroomschakelaars : o.k.

4. -VASTSTELLINGEN EN NOTA'S

4.1.- Vaststellingen :

Geen

4.2.- Nota's

De badkamer , de cv , de sanitaire installatie , de keuken en de verlichtingstoestellen zijn nog niet volledig geplaatst en aangesloten .

5.- BESLUIT. Alleen de hierna vermelde tekst van punt A is geldig


- A.- De installatie is conform de onder punt 2 vermelde voorschriften en mag in dienst gesteld worden -blijven.
De ADS werd verzegeld en de ééndraad - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/12/2034 conform de voorschriften van artikel 271 van het A.R.E.I. alsook voor de in gebruik name van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
- B.- Nadat er gevolg gegeven is aan de onder punt 4 vermelde opmerkingen mag de installatie in dienst blijven.
De wijzigingen dienen zonder vertraging uitgevoerd.
- C.- De installatie is niet conform en mag niet in dienst blijven of in dienst gesteld worden.

6.- MEDEDELINGEN

- 1.- Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.
- 2.- Kopieën: Dit verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden.
- 3.- Uitbesteding: Uitbestede objecten / keuringsmethoden, gekenmerkt met (*), zijn uitgevoerd:
(naam van de onderaannemers)

De agentonderzoeker,
nr.46
VAES PETER

vr. De Directeur
Nico Mantels

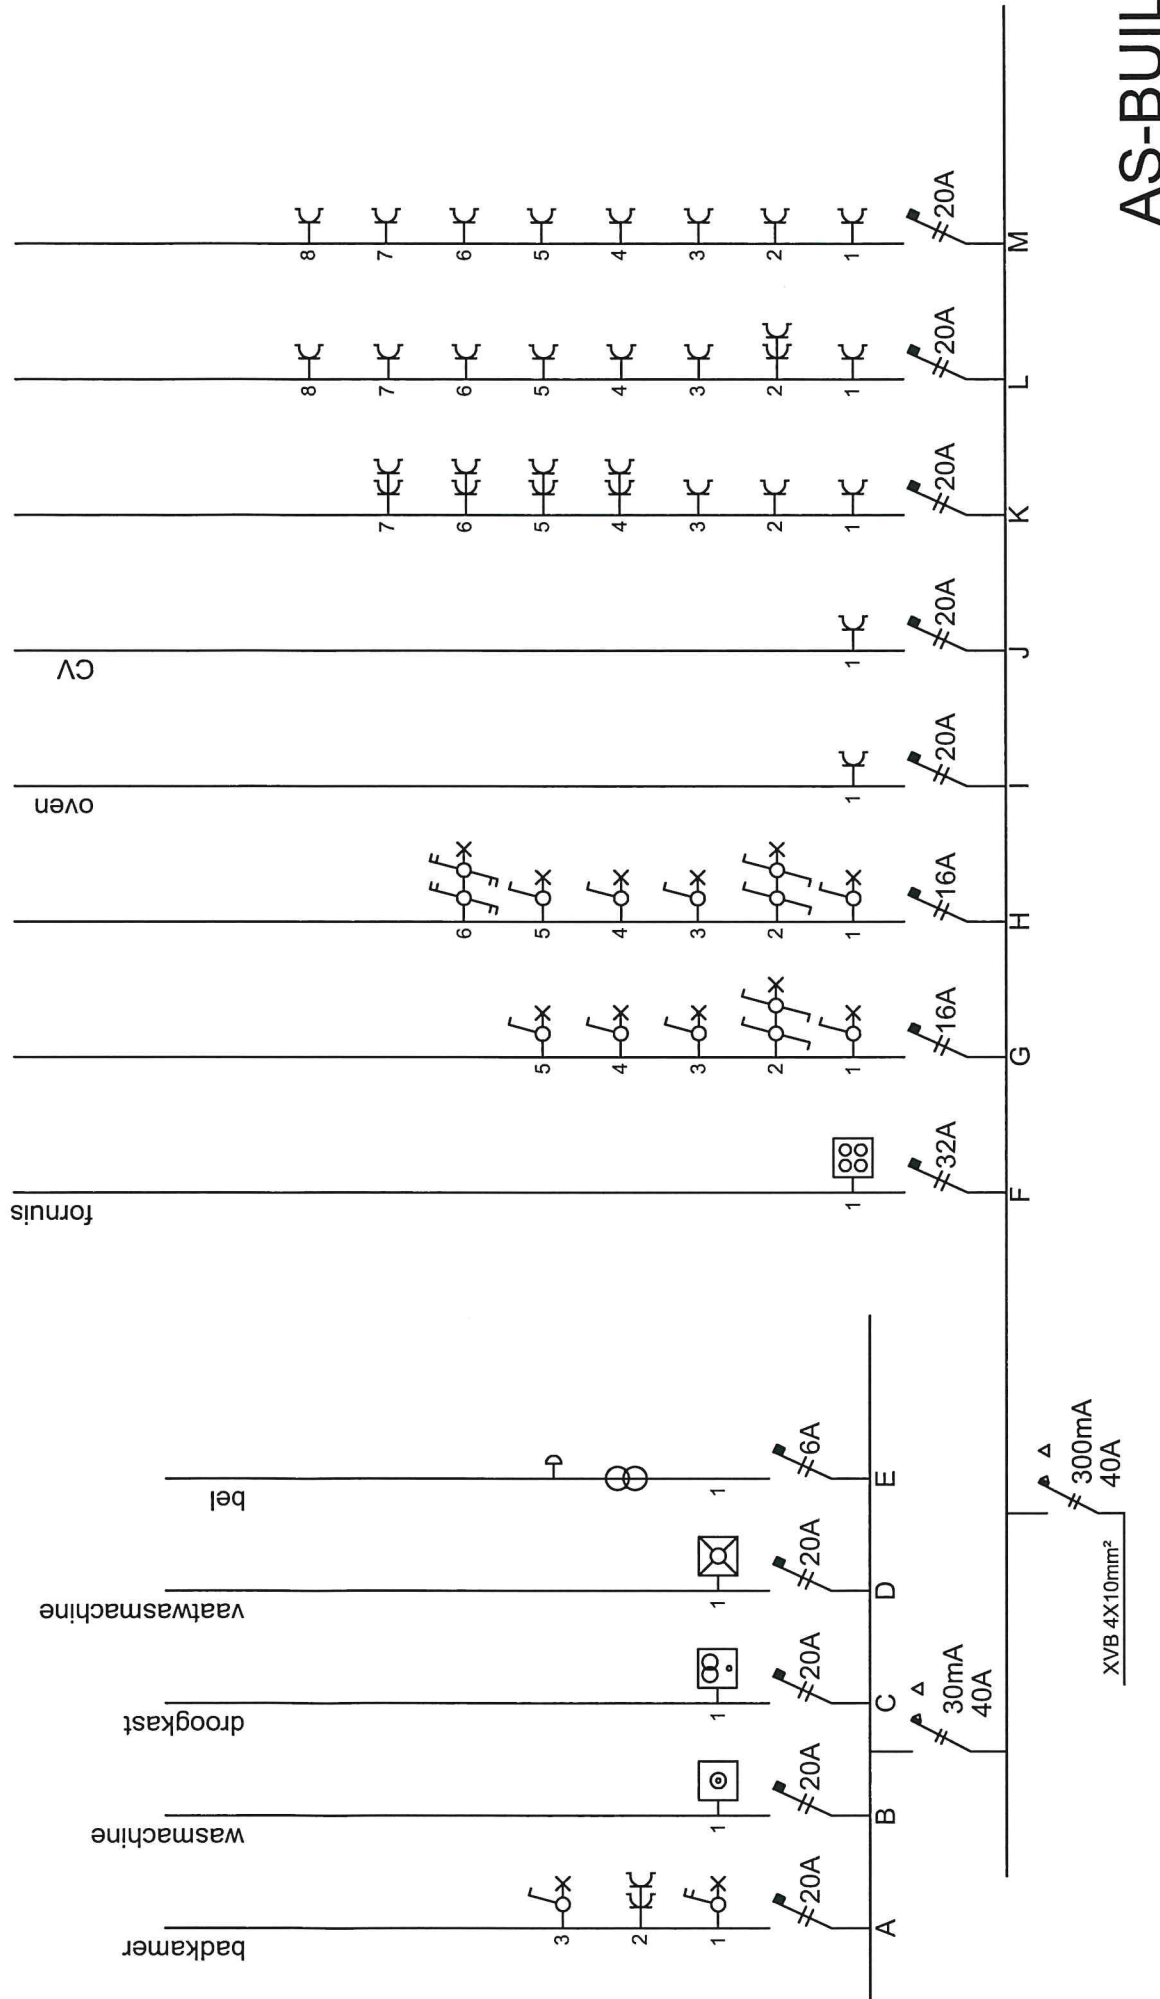

AS-BUILT



Elektricitetswerken
Elektrisch materiaal
Alarminstallaties
Binnen - en buitenverlichting

ELEKTRO Geukens n.v.
Bevrijdingsstraat 22 3945 HAM
Tel: 011/343327 Fax: 011/347345 e-mail: geukens@electrogeukens.be

CBO Lokerenstraat te Turnhout
Van Roey nv
Soldatenpad 5/5
Appartement A1.7
16/12/2009

A1.7
3/6
pt3450: Soldatenpad
nr. 463,
5/5

