

Atlas Controle
Boulevard Lambermont 127
1030 Bruxelles

RAPPORT DE VISITE D'INSTALLATION GAZ

Numéro de rapport:

11.056

Date du contrôle

31/10/2023

Lieu du contrôle

Rpe de Renoupré 8, 4821 Dison, Belgique

Testeur d'installation

Agent-visiteur

Ludovic Morelli

Nature du contrôle de l'installation:

Avant la mise en service

TE312-019/063667145

Conclusion:

L'installation est conforme

Date d'émission:

V1 14/03/2024 18:07:04

Données générales

Adresse de l'installation

Rpe de Renoupré 8, 4821 Dison, Belgique

Propriétaire

Maquinay

Adresse du propriétaire

Rpe de Renoupré 8, 4821 Dison, Belgique

Installateur

Crogge srl

0778253269

Concerne

Compteur

Etat du compteur

Fermé

Numéro de compteur

42164775

Description générale et caractéristiques

Type de gaz

Gaz naturel

Pression de service

20 mbar

Plans de l'installation

A été signé pour vu

Longueur des canalisations (m)

14

Canalisation

Cuivre (A sertir)

PLT

Appareils

Marque	Modèle	Pn (kW)	Catégorie gaz
Vaillant	ecoTEC pro VCW 286 (C33)	24	I2E(S)B

Examen

Contrôle visuel des parties visibles

OK

Essai d'étanchéité

OK

Test avec

Manomètre de précision : TE312-019/063667145

Gaz d'essai

Air

Pression d'essai

150 mbar

Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Conclusion

Conclusion : conforme

Suite à l'examen, l'installation est déclarée **conforme** aux normes NBN B61-001, NBN B61-002 et NBN D51-003

Le prochain contrôle périodique est à exécuter avant: Date du contrôle + 5 ans

Rapports d'ouverture

A 1649329

ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom : Prénom :
Représentant de l'entreprise: C. ROGGE N° de T.V.A. : BE 0773.253.263
Rue : DE BALEN N° : 8 Boîte :
Code postal : 4840 Localité : WILKENRAEDT Tél : Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :)
Adresse + Tél. :
atteste formellement et garantis par la présente
installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après
dans l'immeuble situé à : Rue : RANDE DE NAMOURE N° : 8 Boîte : Étage :
Code postal : 4840 Commune : DISON
Marque compteur : WILL N° du compteur : 41769775
pour le compte de : Nom : Prénom :
Rue : N° : Boîte :
Code postal : Commune :

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
- avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réserve à l'installateur : Je déclare avoir suivi « Cerga-Installateur gaz professionnel ». ☐ oui ☒ non 02/726.64.04 Si oui : n° Cerga : Atlas Contrôle : 663-INSP Annexe :	Réserve au GRD : Date : <u>31.10.2012</u> Signature + nom : <u>[Signature] ROGGE</u>
--	---


SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).
Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

Annotations manuscrites :

- * VALCANT 24 kW c 33
- A-B = 1m PTFE 25
- B-C = 0,5m PTFE 25
- C-D = 12m ENCASTRE
- D-E = 0,5m PTFE 25
- E-F = 0,5m CORRE

Diagramme isométrique :

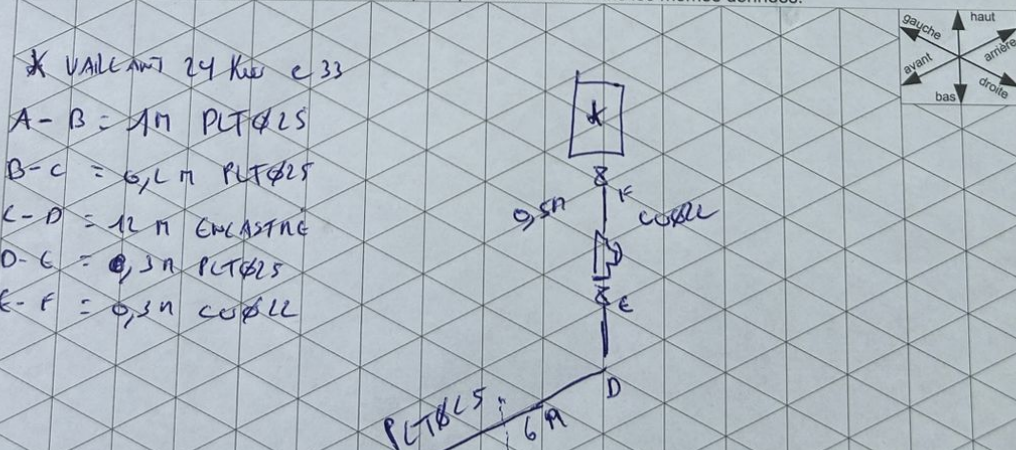

Orientation :


- Gauche / droite
- Haut / bas
- Avant / arrière

Atlas Contrôle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

Blanc: GRD - Rose: Client - Vert:



Modèle 710628/15



A 0727054

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : C. ROGGE
Adresse : Ave. de boelen 2 4840 Welkenraedt

Organisme de contrôle : Atlas contrôle
Référence : 557684
Inspecteur : H. Balle
Tél :

Installation contrôlée : Adresse : Ave. Rampe de rempage 4841 Dison

Date du contrôle : 31.10.2013

L'habitant est : ☒ propriétaire ☐ locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 » : ☒ est présente N° : 1649329 ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Honeywell N° : 42164775 Index : 0,173 m³

Pression de service de l'installation intérieure : 20 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : 1	1 C 33	VAILLANT	24 kw
2			
3			
...			

Conclusion :

L'installation neuve :

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

Atlas Controle

Boulevard Lambermont 127

1030 Bruxelles

L'installation existante :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.


(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées NBN D 51-503


Date: 31/10/2013

HAF1001FR-v6
EXEMPLAIRE : Blanc – GRD Rose – client Jaune – organisme de contrôle

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle



Signature de l'agent-visiteur:



Annexes

Name	Photos
------	--------

1,75 x pression de service
