



AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270
Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	27/11/2018	Verslag N°	NB 2018-1304
Adres installatie	Pastoor Verwilghenplein 20bus103, 3053 Haasrode		
* Eigenaar of DNG	/		
* Opdrachtgever	AEW Van Gestel bvba, Nieuwstraat 80, 3140 Keerbergen	Contact	0498/66-05-39
* Installateur	AEW Van Gestel bvba, Nieuwstraat 80, 3140 Keerbergen	BTW	BE 08940.883.316
* DNB	Infrax	EAN Ref.	/
* Teller N°	/	Index dag	/ KWh
		Index nacht	/ KWh
* ID meettoestel	METREL type 3102		

1.- KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE				
Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode	
230 V	1.3 Ohm	10.2 MOhm	Lus	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eind - stroombanen
40A/GI/2P Max.	40A/300mA/2P	XGB 4X10 mm ²	1	13

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE			
Begin der werken	Funderingen	Na	01/10/1981
	Installatie	Na	01/10/1981
Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB		
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie. Zie schema's in bijlage – App.1.06 -		
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid.		
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden		

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN	
Geen	

4.- BESLUIT
1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn, uiterlijk op 27/11/2043 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum. De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling - Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geïnviseerd .

De inspecteur
NIKI BYNENS - NB

Vr. De directeur,

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties

5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goeder
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.	

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

6.a.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.b.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.c.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.d.	Kopieën : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C

7.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB

Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening


Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. gelijkvormigheidsonderzoek en voor geen enkel ander doel.

Nota: Dit betreft een keuring van een nieuwbouw appartement.

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

Autonome Security Controle VZW – Maatschappelijke zetel – Ketelstraat, 111, 3454 Rummen
 BTW : BE 0826-131-776 – Tel. 0472/663700 – Fax. 011/582961 – lassaut@telenet.be – IBAN BE 32 7512 0493 7802
 Secretariaat : Thor Park 8300, 3600 Genk – Tel. 0483/42.98.30 – Mail : bureel@asc-controle.be

A"S"C Document 112: E006 / 10 - L.S. HHI gelijkvormigheidsonderzoek Rev. 05 – 03/02/2017 Pag. 2 van 2

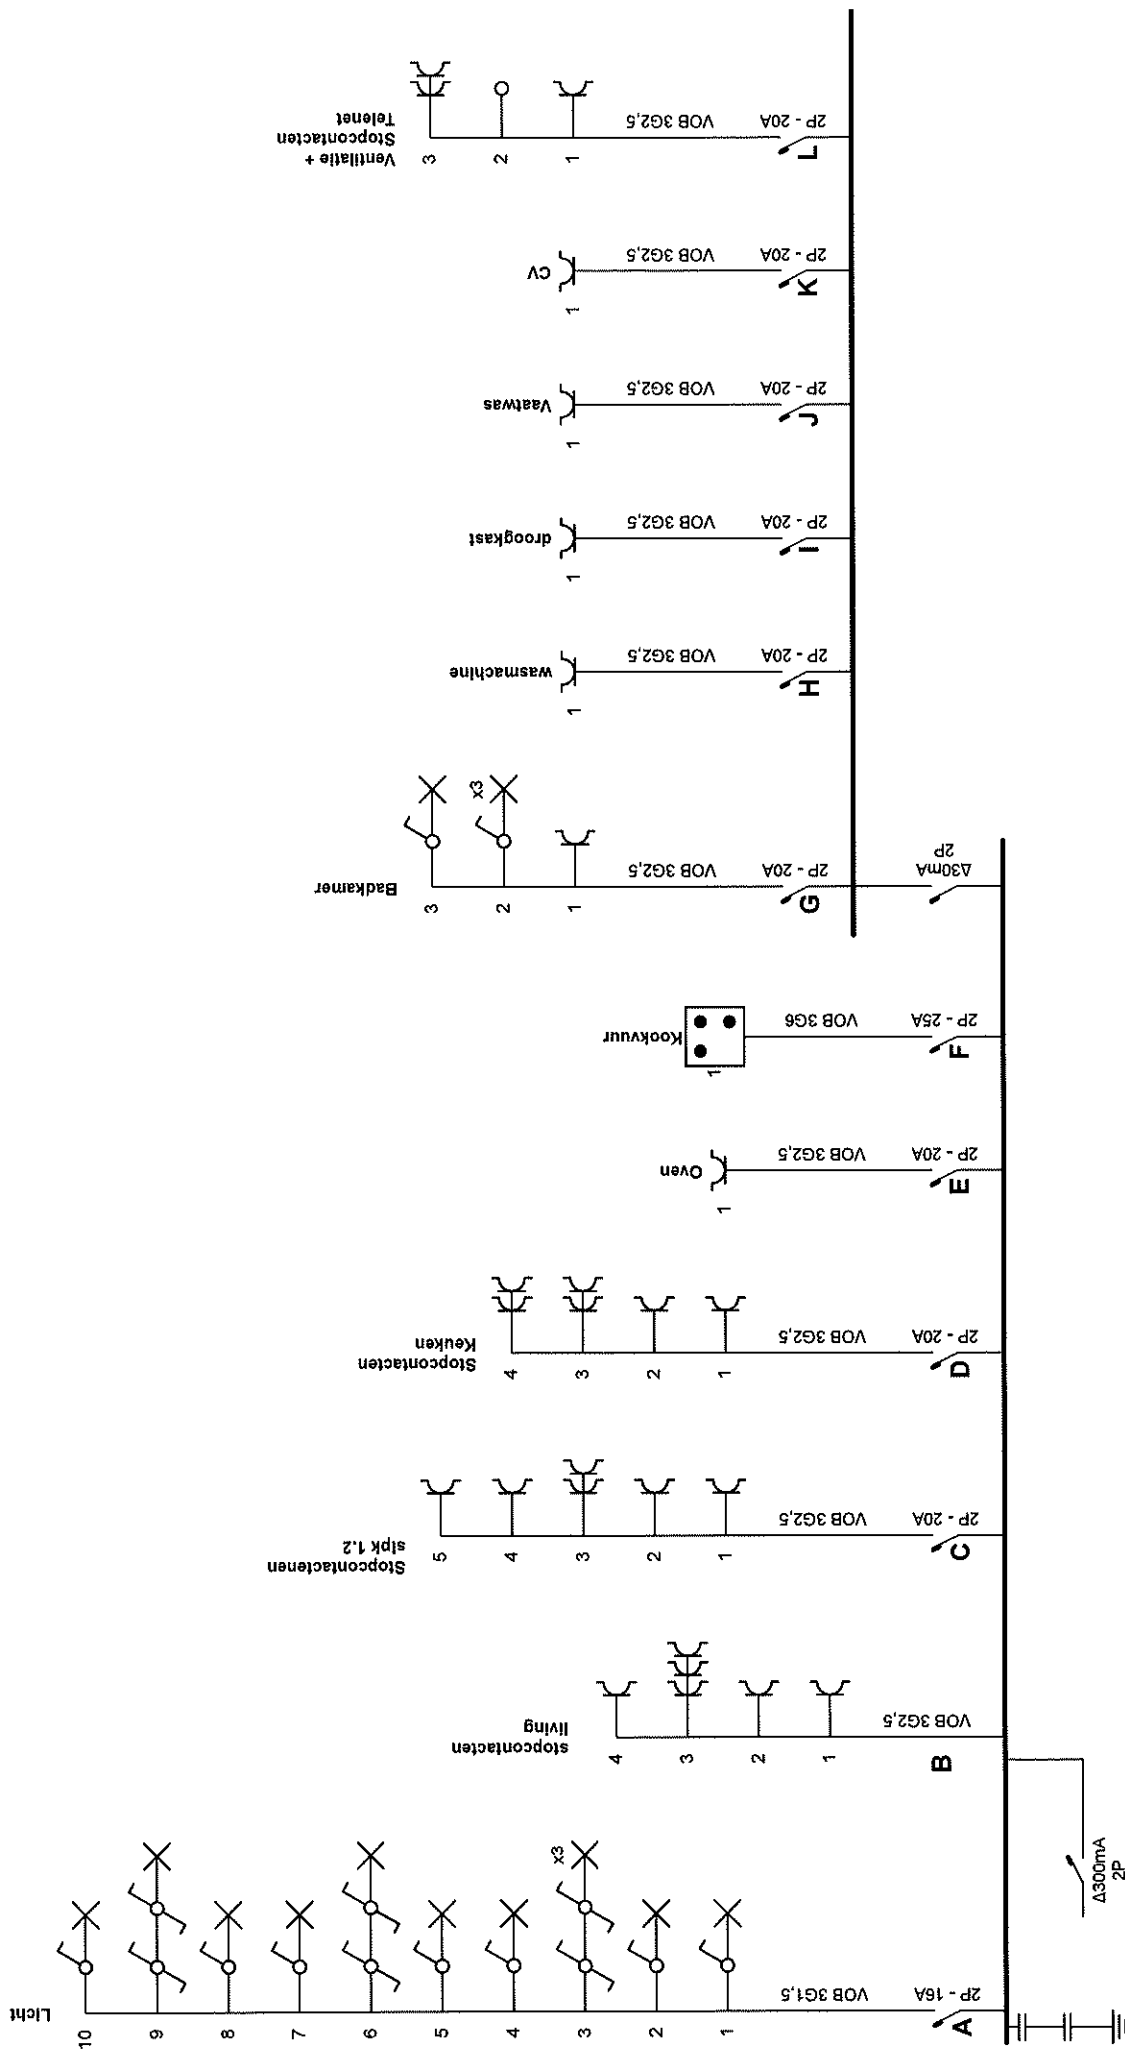


Erkend Organisme
 A.S.C.
 Singellaan 16A
 3545 Halen
 GSM: 0483 42 98 30
 Fax: 011 58 29 61
 e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
 Taxandria
 Pastoor verwilgen plein 20 Bus 103
 9120 Haasdonk

Installateur
 AEW Van Gestel bvba
 Nieuwstraat 80
 3140 Keerbergen
 GSM: 0498 66 05 39
 e-mail: info@aeewvangel.be
 BTW BE 0849.883.316

p. 1/4
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz



Erkend Organisme
 A'S'C.
 Singellaan 16A
 3545 Halen
 GSM: 0483 42 98 30
 Fax: 011 58 29 61
 e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
 Taxandria
 Pastoor verwilgen plein 20 Bus 103
 9120 Haasdonk

Installateur
 AEW Van Gestel bvba
 Nieuwstraat 80
 3140 Keerbergen
 GSM: 0498 66 05 39
 e-mail: info@aewvangestel.be
 BTW BE 0849.883.316

p. 2/4
Eendraadschema
 2 x 230V ~ 50Hz

- A** Licht
- B** stopcontacten living
- C** Stopcontacten slpk 1.2
- D** Stopcontacten Keuken
- E** Oven
- F** Kookvuur
- G** Badkamer
- H** wasmachine
- I** droogkast
- J** Vaatwas
- K** CV
- L** Ventilatie + Stopcontacten Telenet
- M** Kelder

Erkend Organisme
A"S"C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
Taxandria
Pastoor verwilgen plein 20 Bus 103
9120 Haasdonk

Installateur
AEW Van Gestel bvba
Nieuwstraat 80
3140 Keerbergen
GSM: 0498 66 05 39
e-mail: info@aeewvangel.be
BTW BE 0849.883.316

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz
