

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME
Date inspection: 07/03/2022

Inspecteur: Vincent Draye

Mentor:
Installateur: B & M elec sprl

Étiquette d'identification:

N° TVA:BE 0628 747 169

Référence client:

 Marque et type d'appareil de mesure:
 Metrel Eurotest ET61557

Numéro de serie: 18460128

Adresse de l'installation

 Rue Rue Tine Briac
 Numéro 12
 Boîte
 Postcode 5001
 Commune Belgrade
 Pays Belgique

Propriétaire

 Nom B & M elec sprl
 Rue Rue Tine Briac
 Numéro 12
 Boîte
 Postcode 5001
 Commune Belgrade
 Pays Belgique

Installateur

 Nom B & M elec sprl
 N° TVA BE 0628 747 169
 Numéro de téléphone 0473716398 0488199279(Maxime)
 E-mail bmelecsprl@gmail.com


Type : maison

EAN : 54

☒ Non communiqué

N° compteur : 1SAG1100503764

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:


Type de contrôle:

Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm


Protection Max: 63 A

Nombres tableaux: 1

Nombre de circuits: 16

Ri général: 1,784 MΩ

OK



Prise de terre: Boucle

RE: 6,15 Ω

OK

**DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL**

$I\Delta$ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _t	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63		22,5kA2s (3000A)	A	Tout	NA	NA
30	63		22,5kA2s (3000A)	A	Voir schema	NA	NA

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
12	C	20		2	2,5
1	C	32		2	6
3	C	16		2	2,5

Contrôle visuel (général)	OK	Contact direct	OK	Contact indirect	OK
Raccordement	OK	schéma en annexe par Aceg asbl NA			
Liaisons équipotentielle	BON	Section des conducteurs	OK		
Continuité	OK	Éclairage / machines	NVT		

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

nota/note 27 Le code EAN de l'installation n'a pas pu nous être communiqué durant notre visite.

nota/note 5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.

nota/note 9 La salle de bain n'est pas complètement terminée . Baignoire et/ou douche doivent être placés .

nota/note 12: L'installation électrique n'est pas sous tension. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé

CONCLUSION

- ☒ **L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1.** La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 7/3/2047
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre annexe:

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Vincent Draye

Le travailleur,

[Signature]
du et opposé

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481


Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 7/3/2047	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

CHACCEG

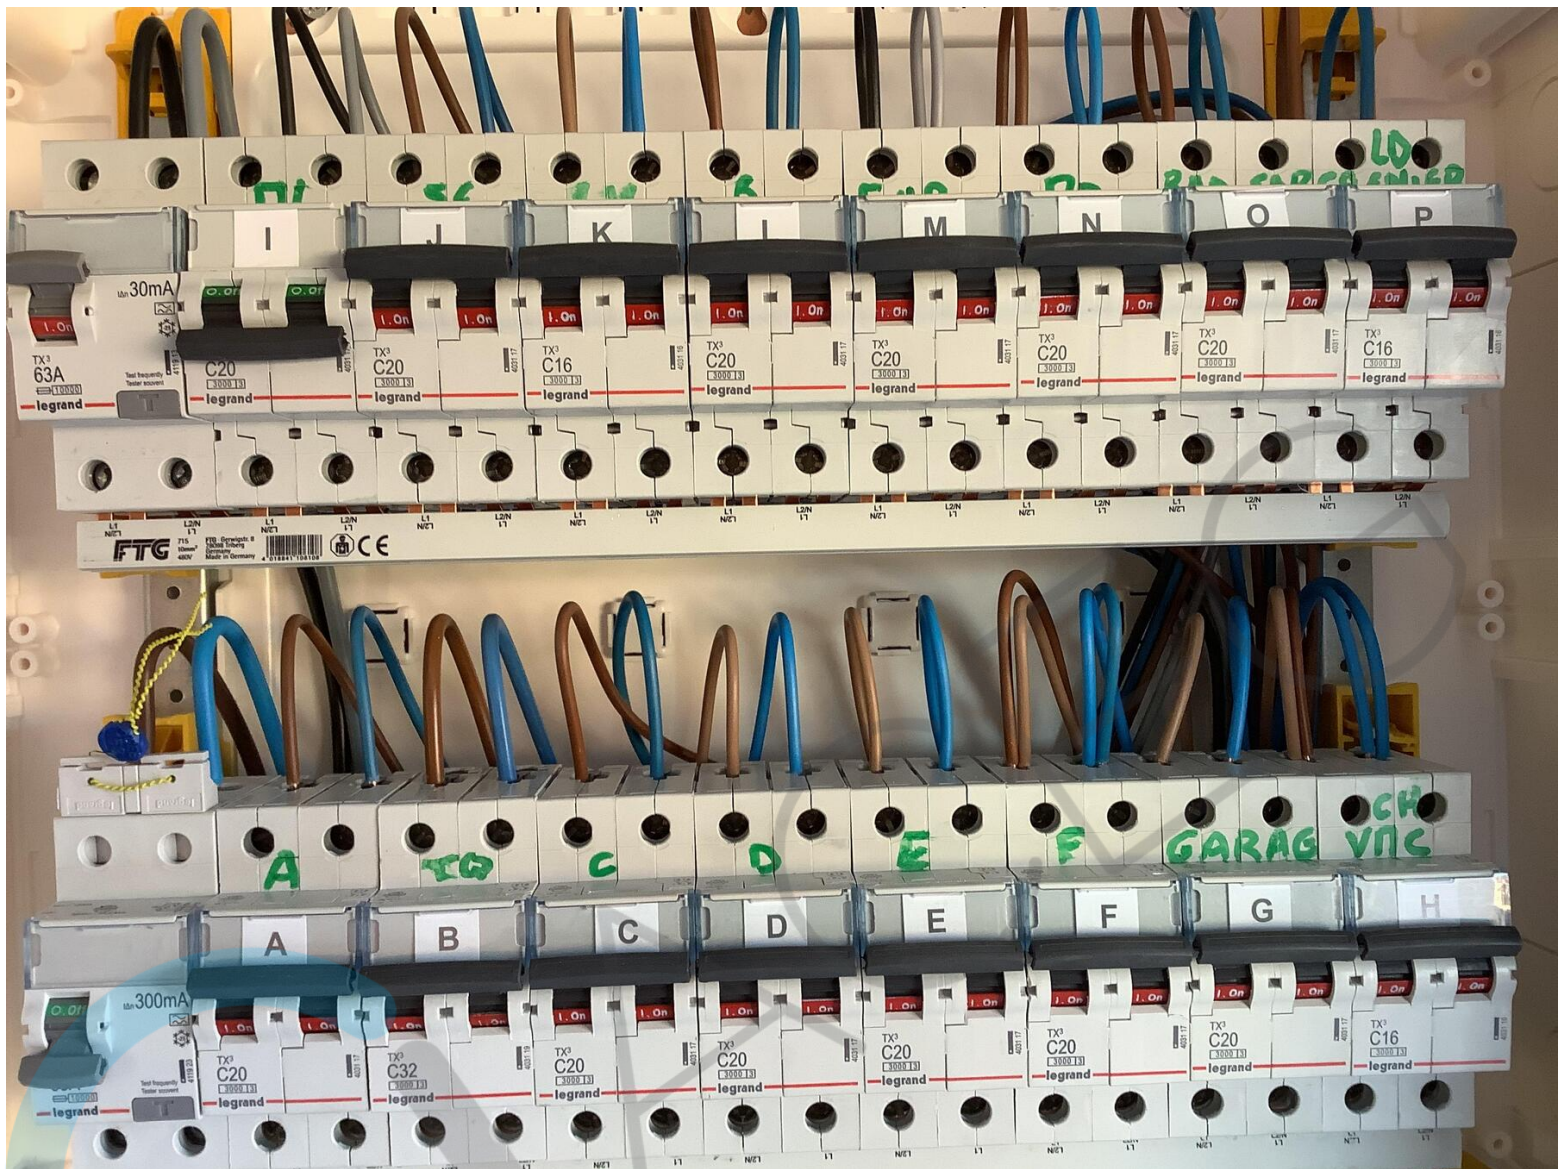





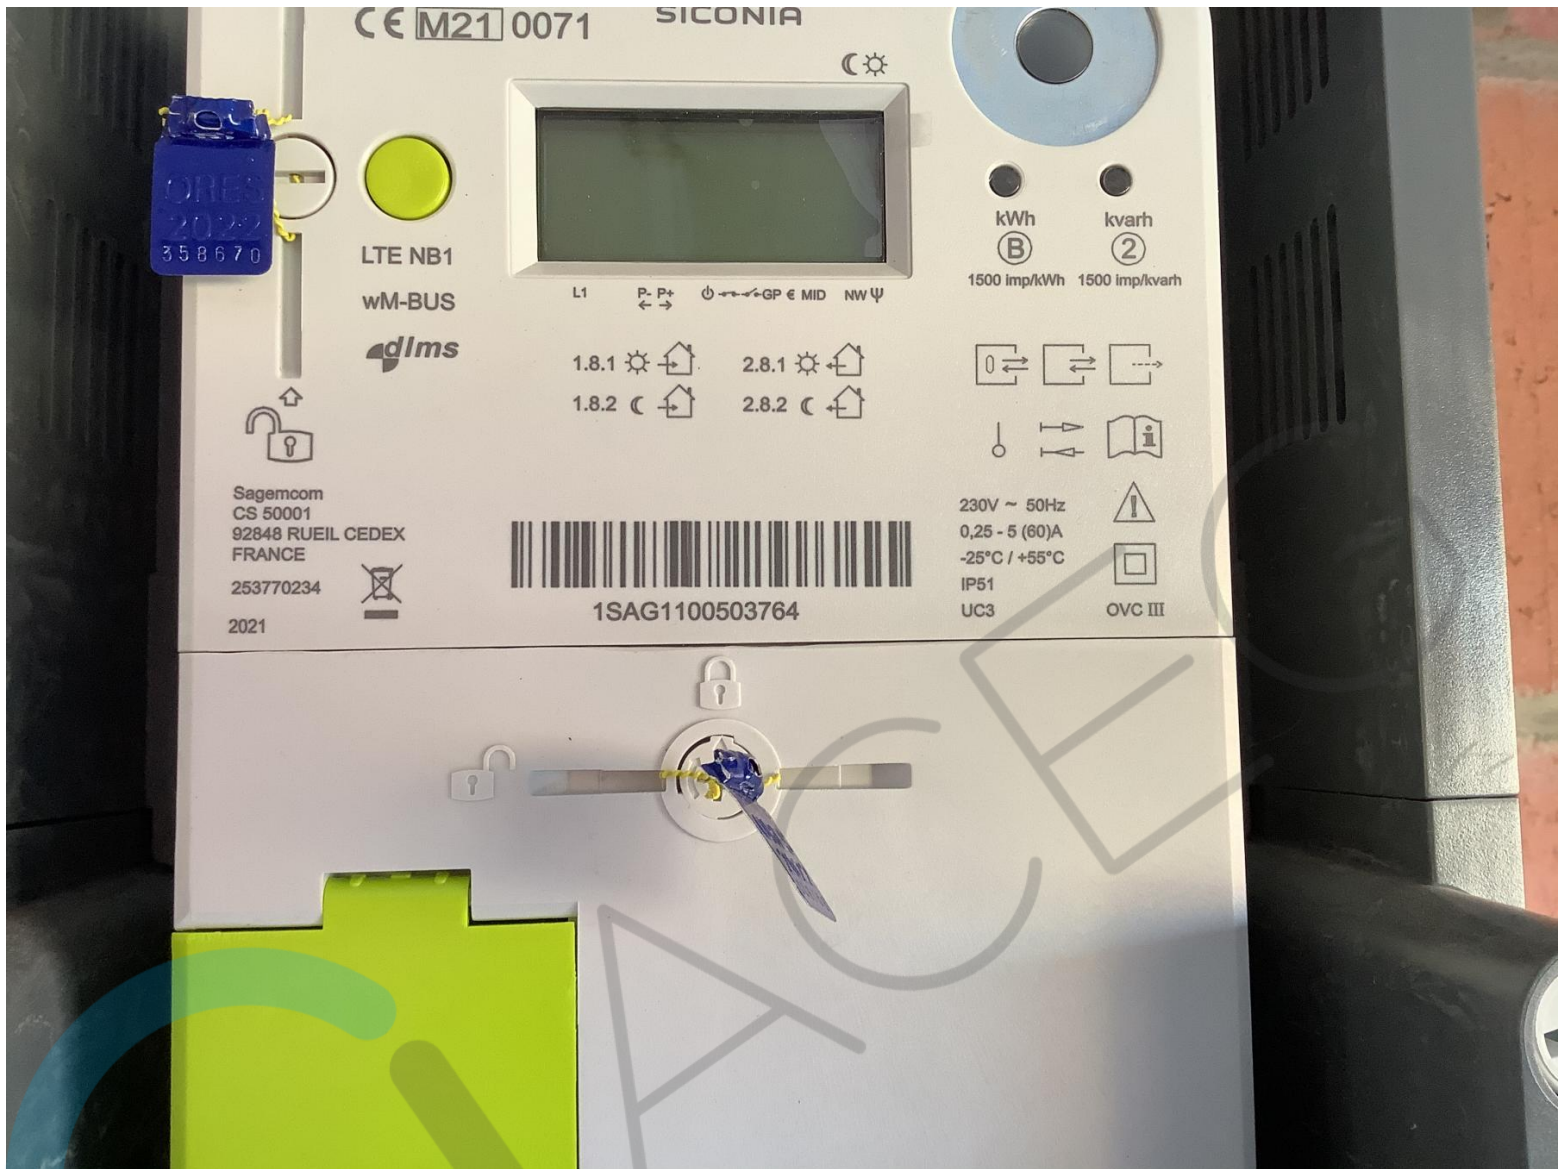

mars 7, Doc 1 5/5


Terminé

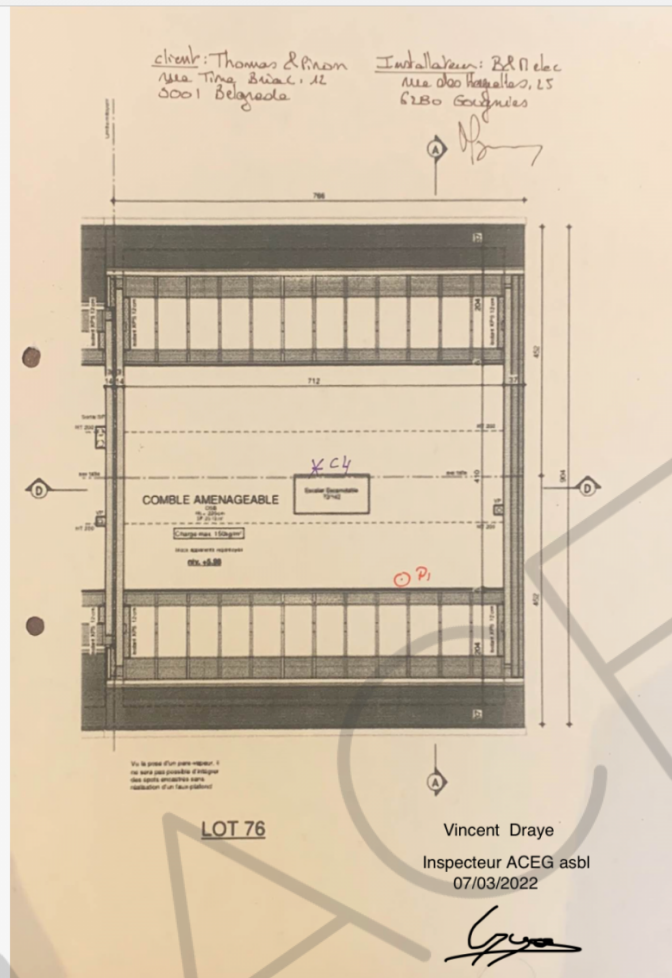


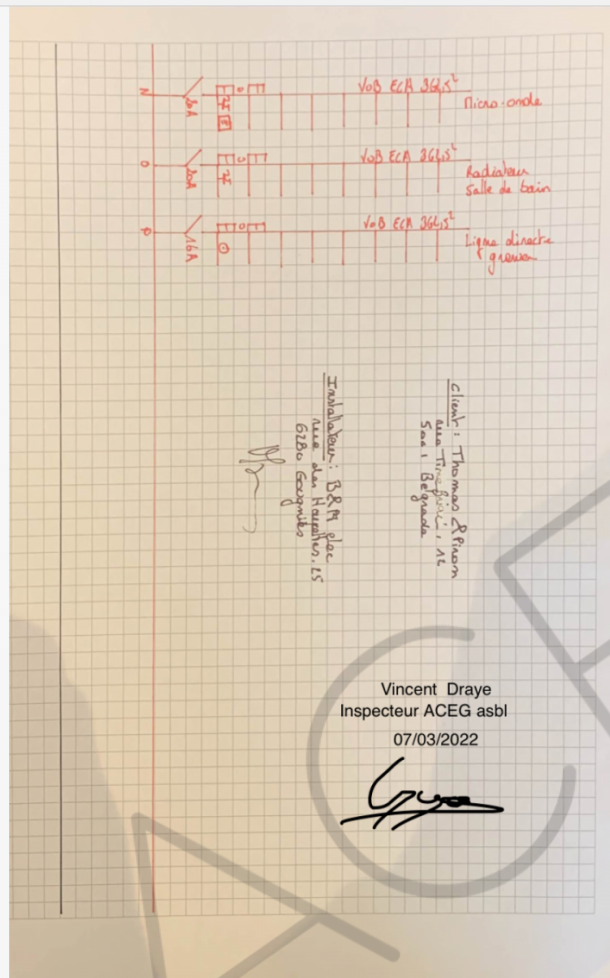

mars 7, Doc 1 3/5


Terminé

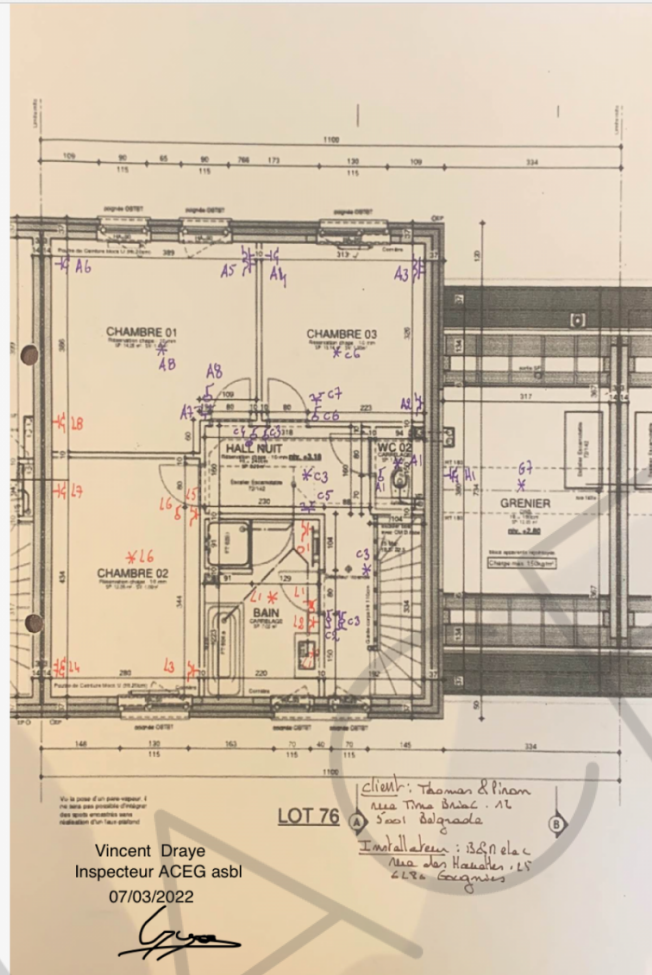

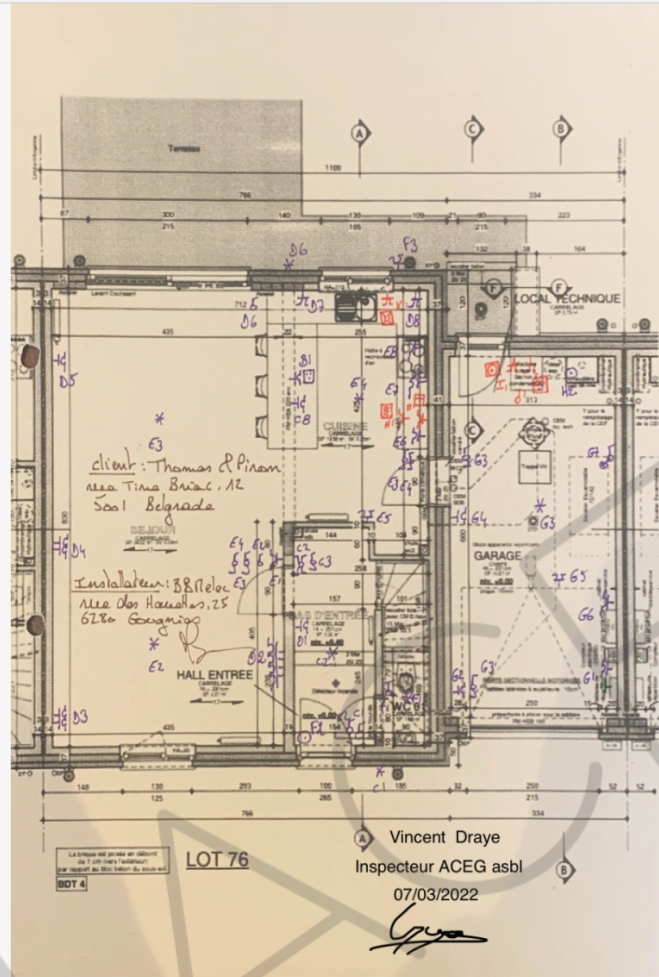

mars 7, Doc 1 1/5

Terminé

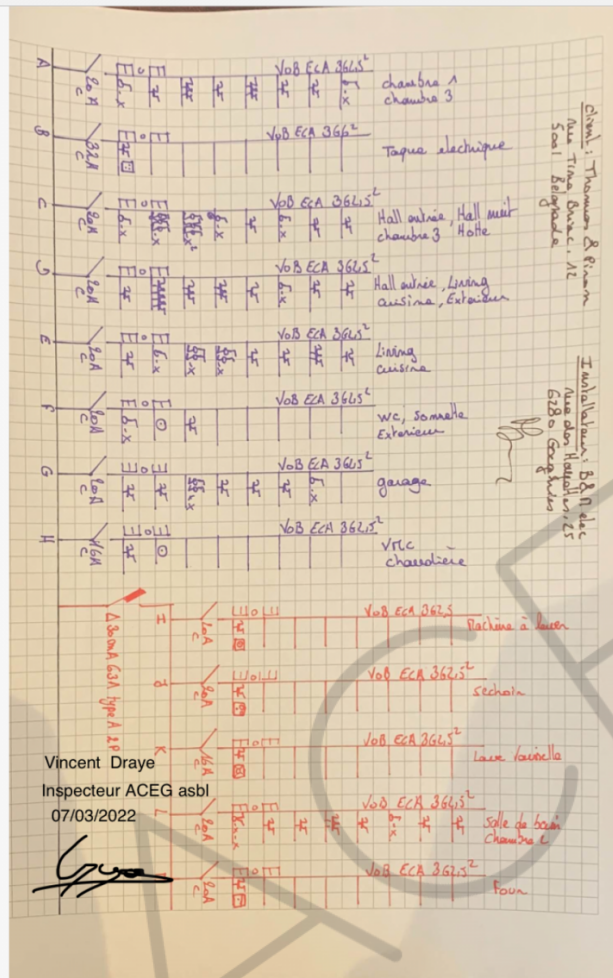







Client: Thomson & Piron
Ave Tine Buac. 12
5001 Belgrade


Installateur: B&N elec
Ave des Halles, 25
6280 Gerges

[Signature]

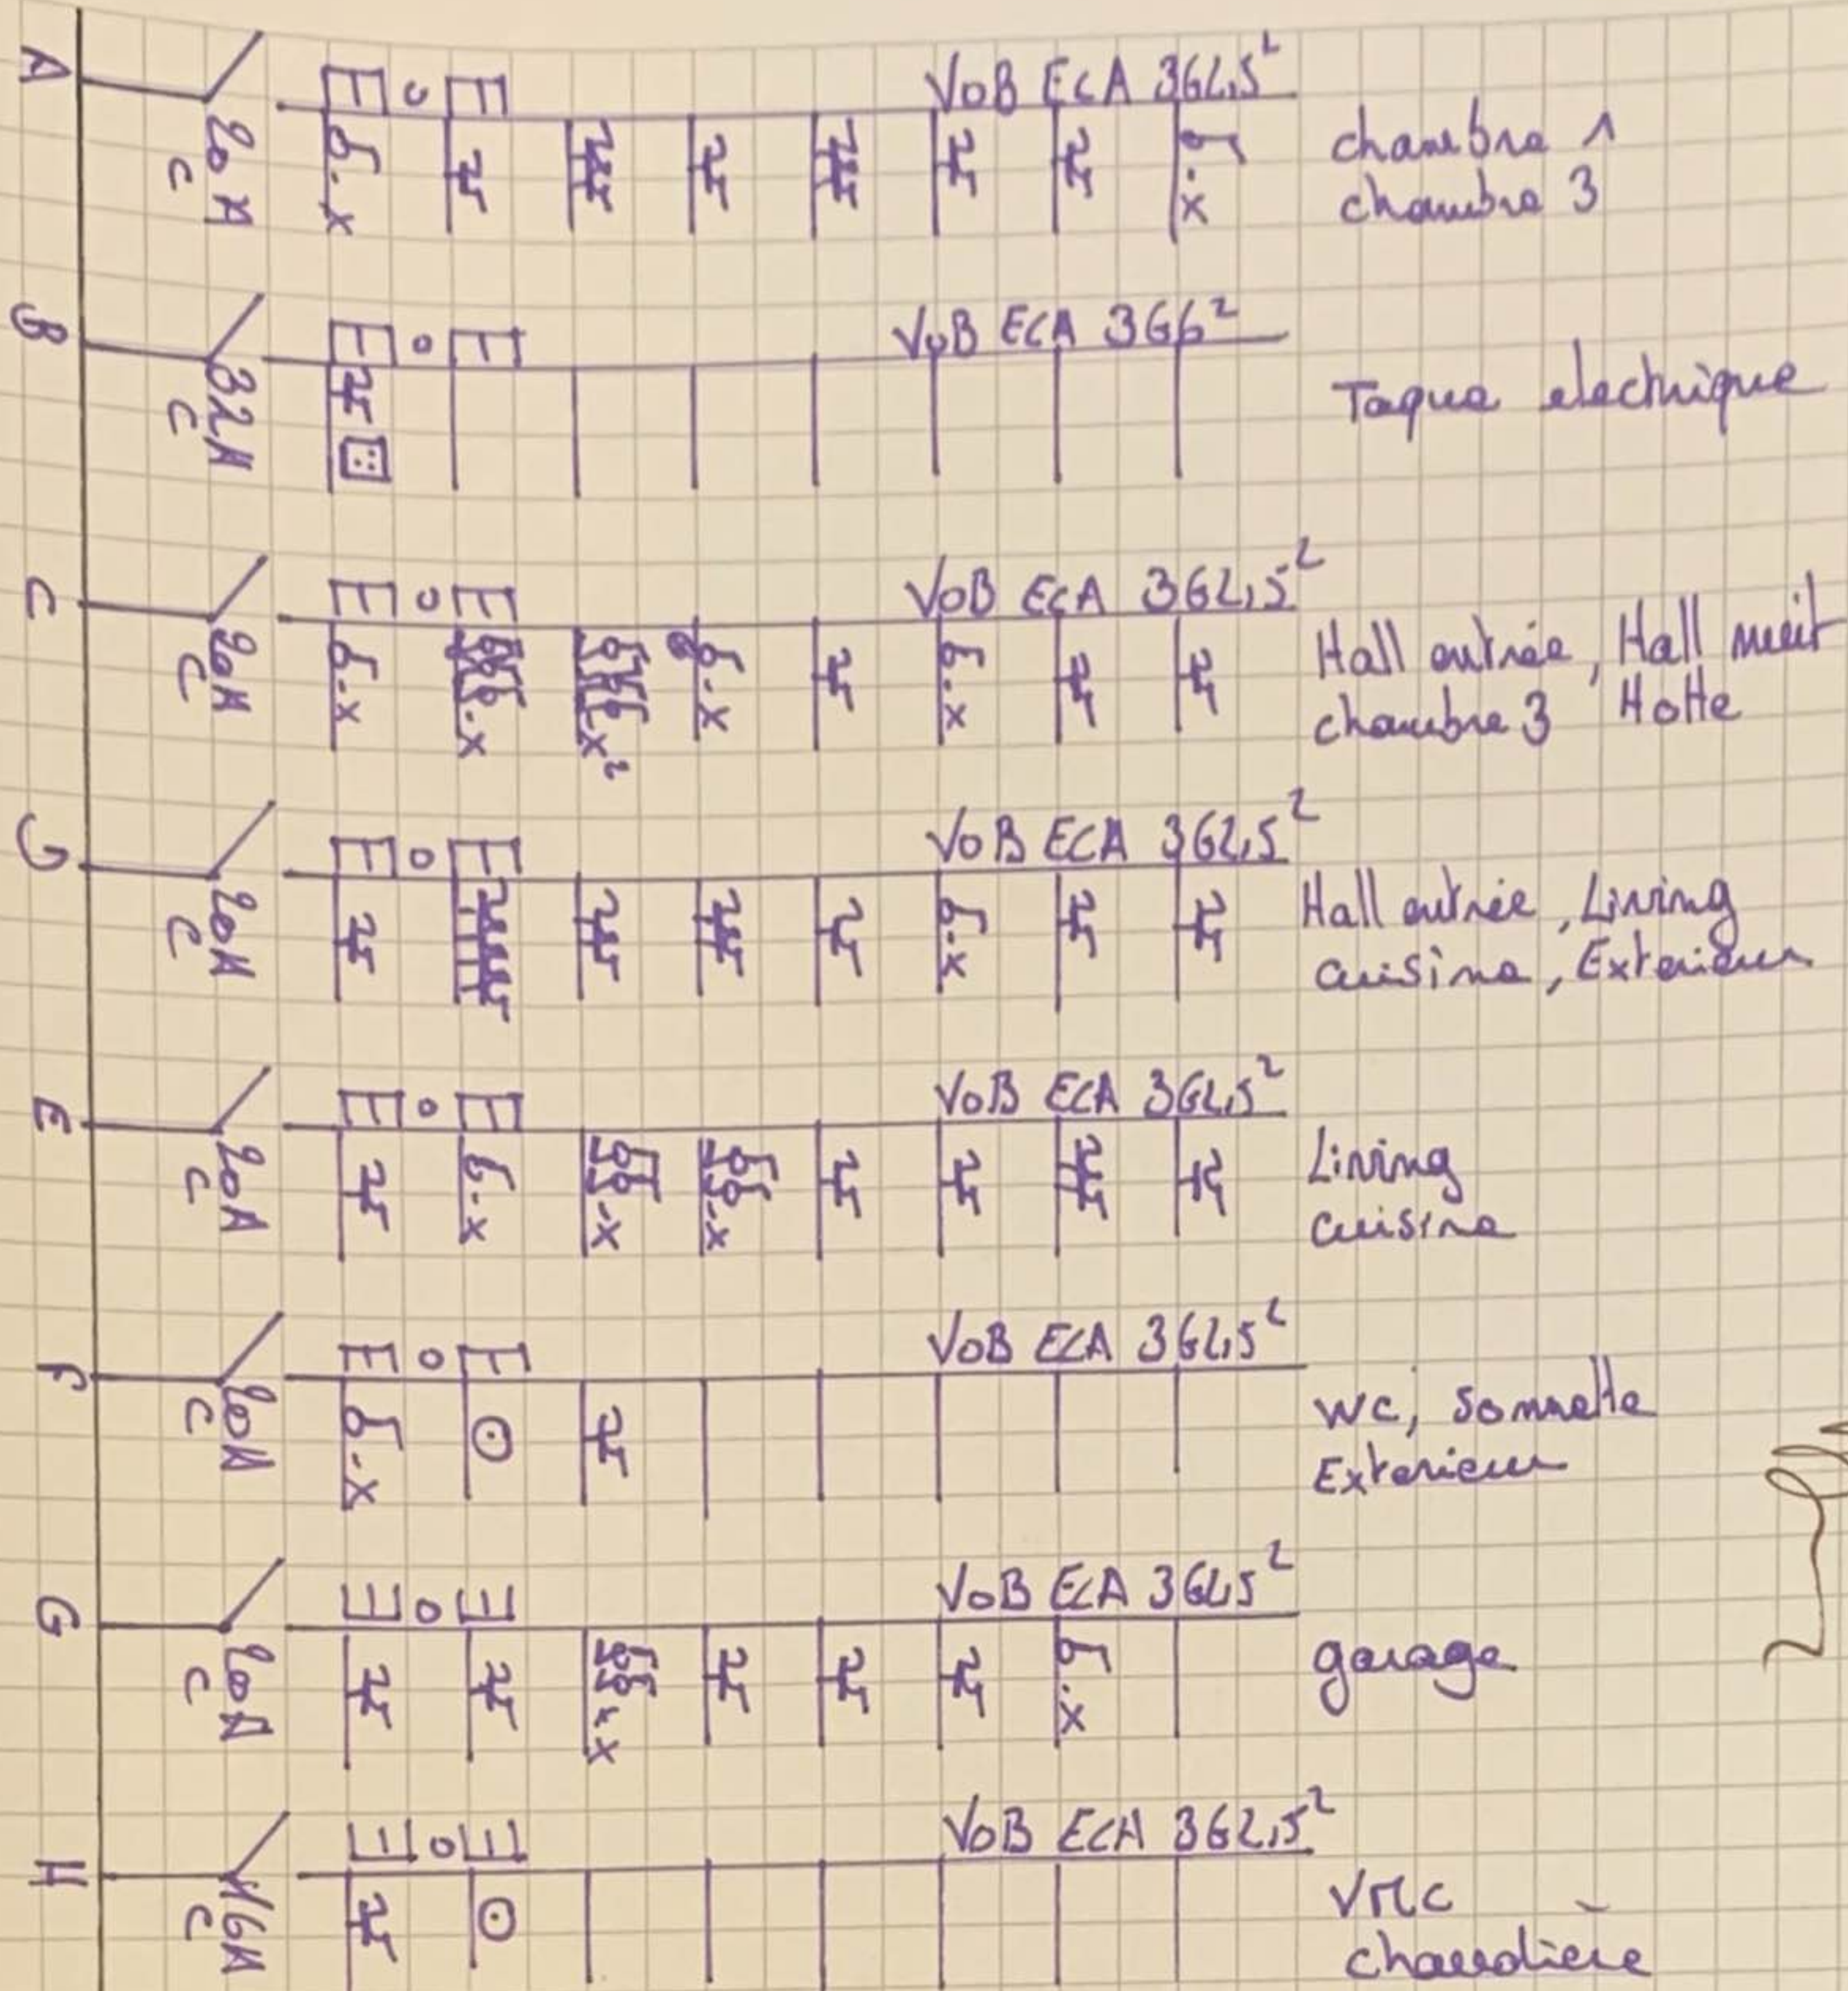

Δ 300mA 63A type A 2P

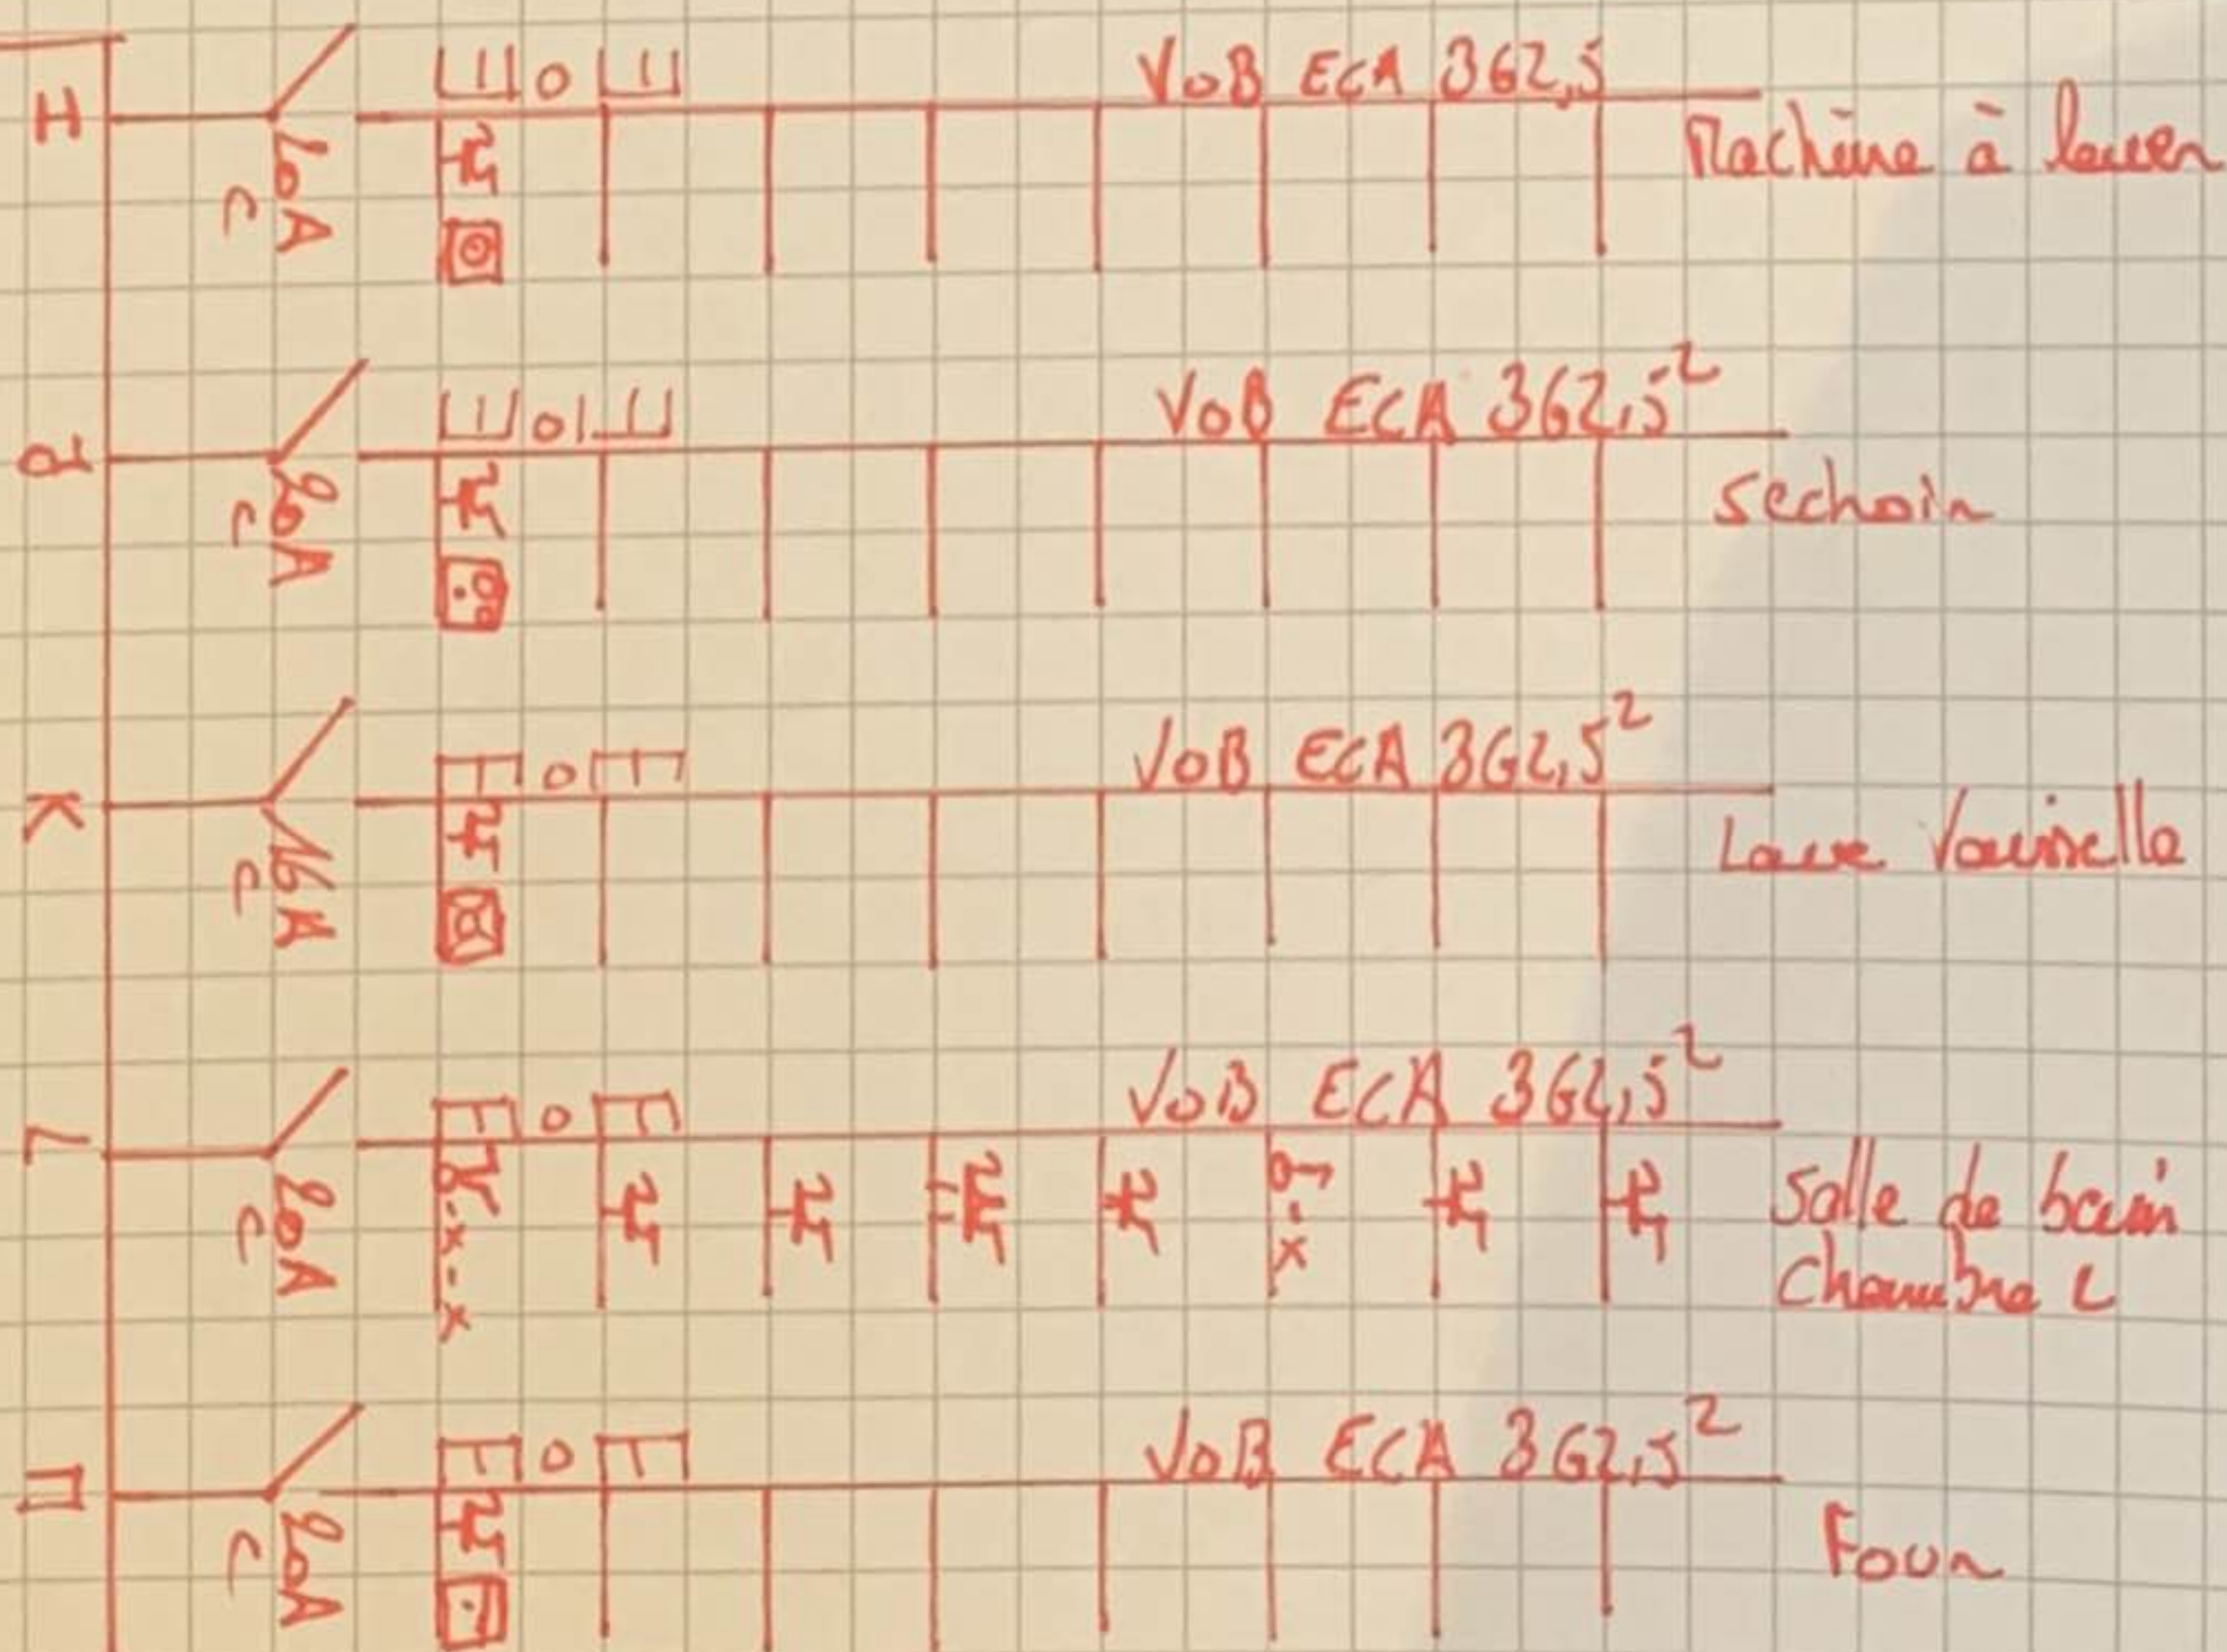


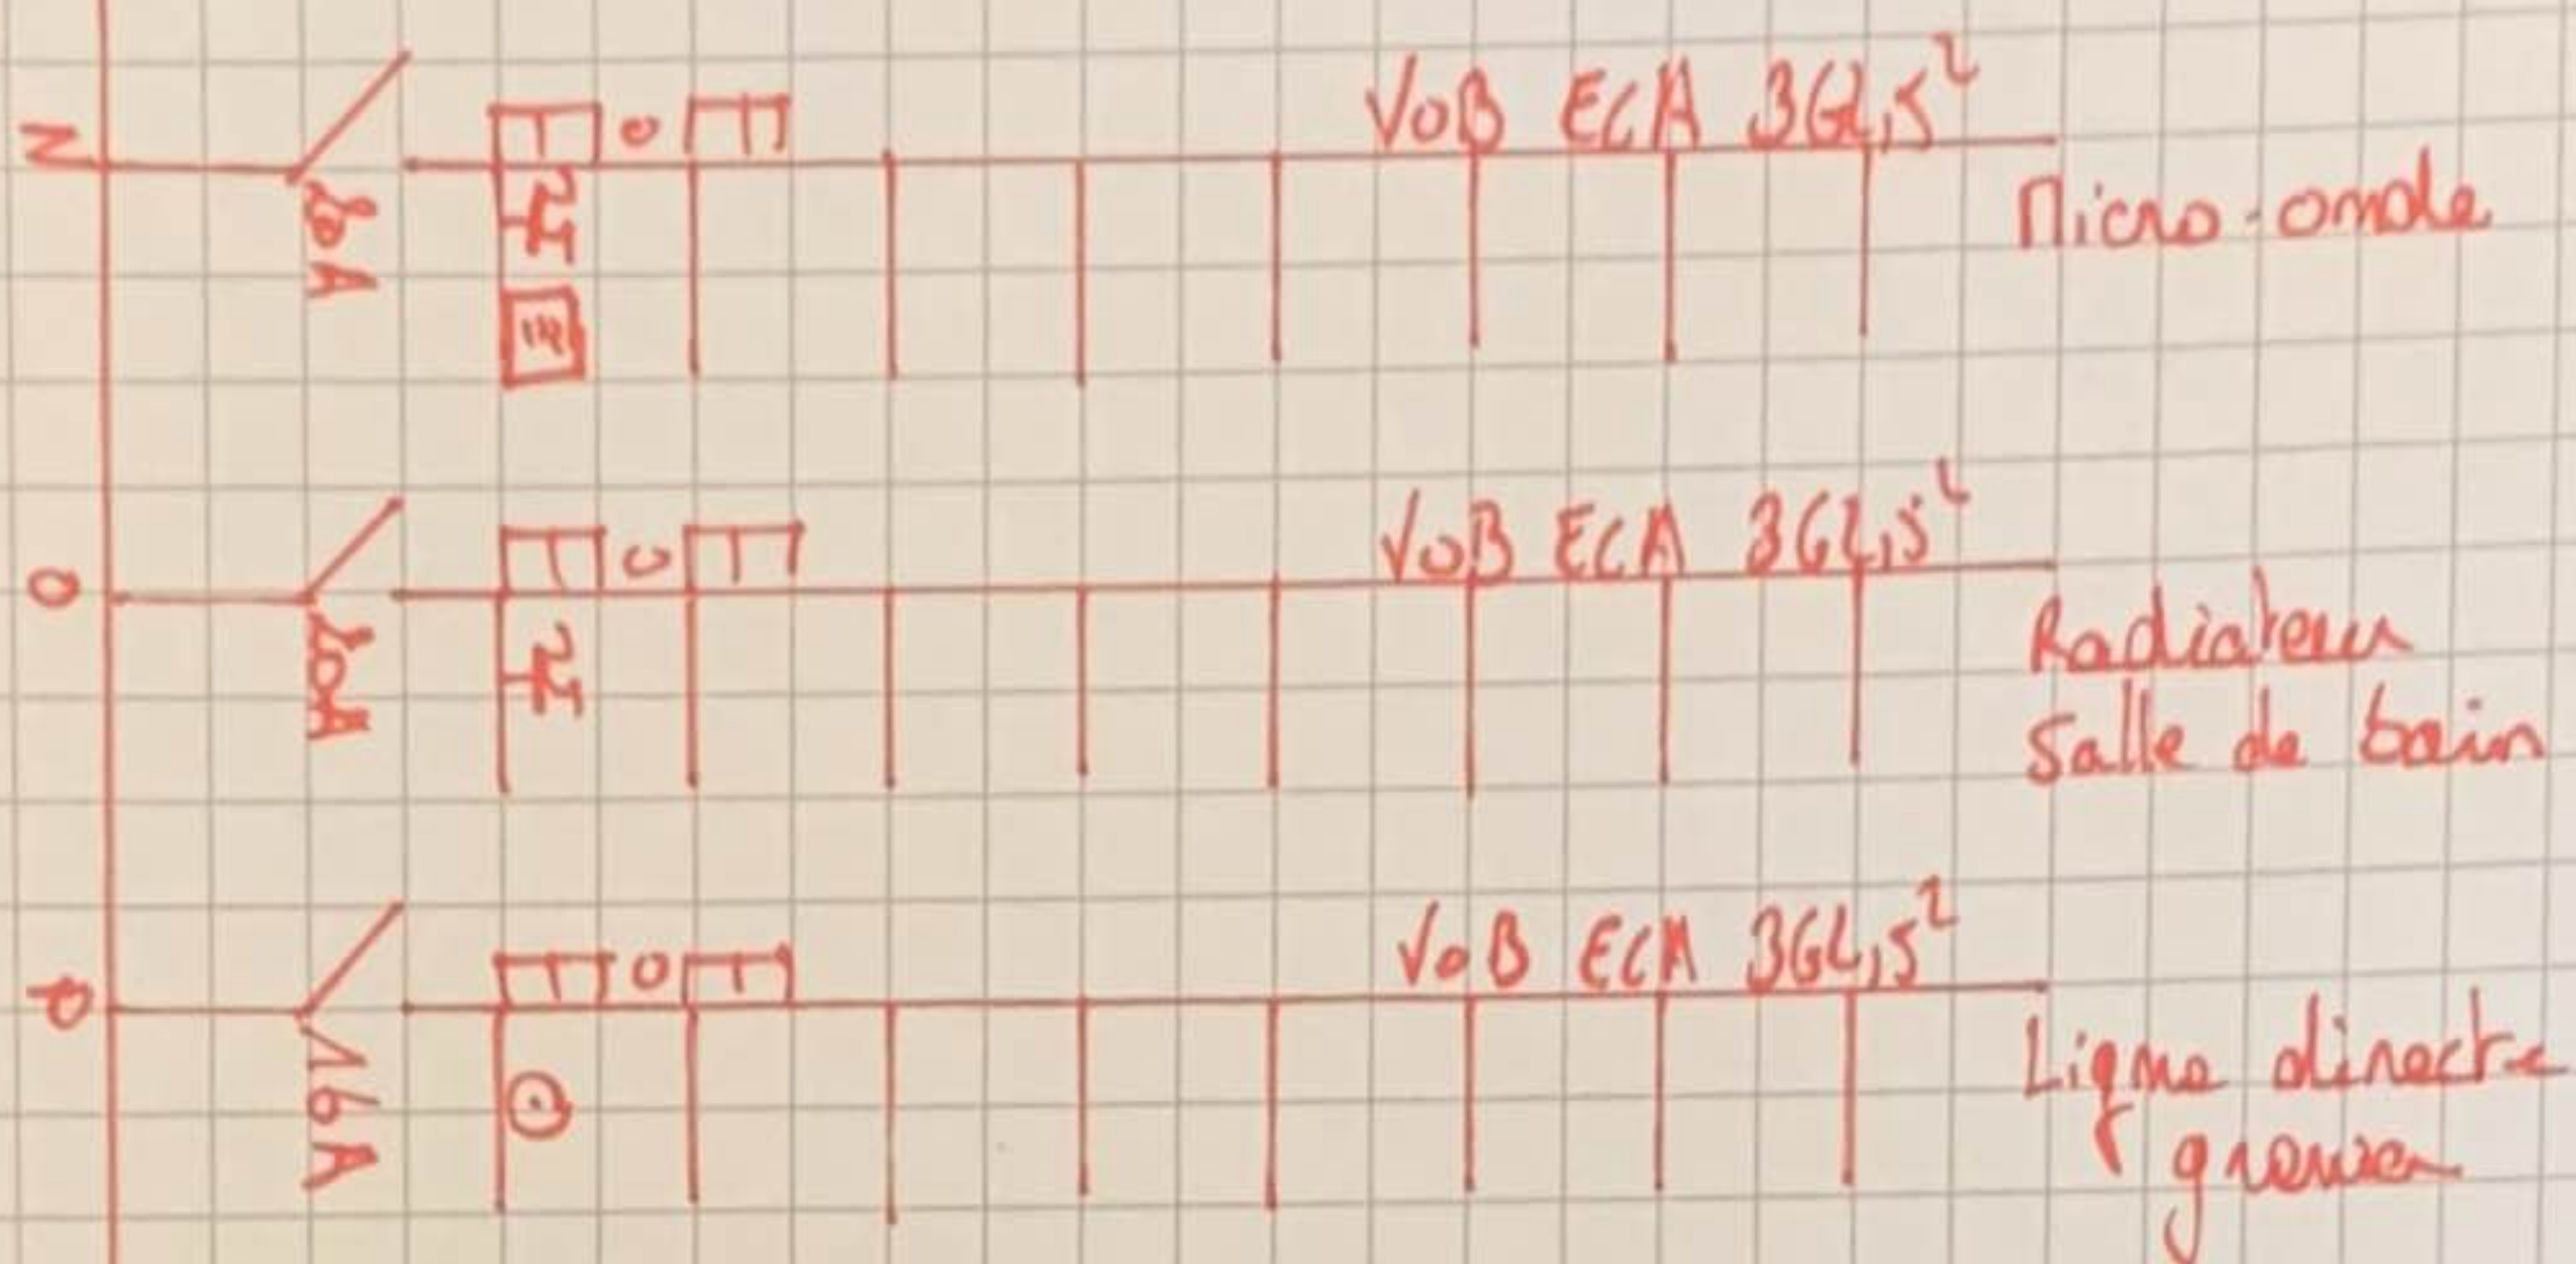

Cliant: Thomas & Rimon
 rue Timebucini, 12
 Soc 1 Belgique

Installateur: B&M elec
 rue des Harebiers, 15
 6280 Gosselies

[Signature]

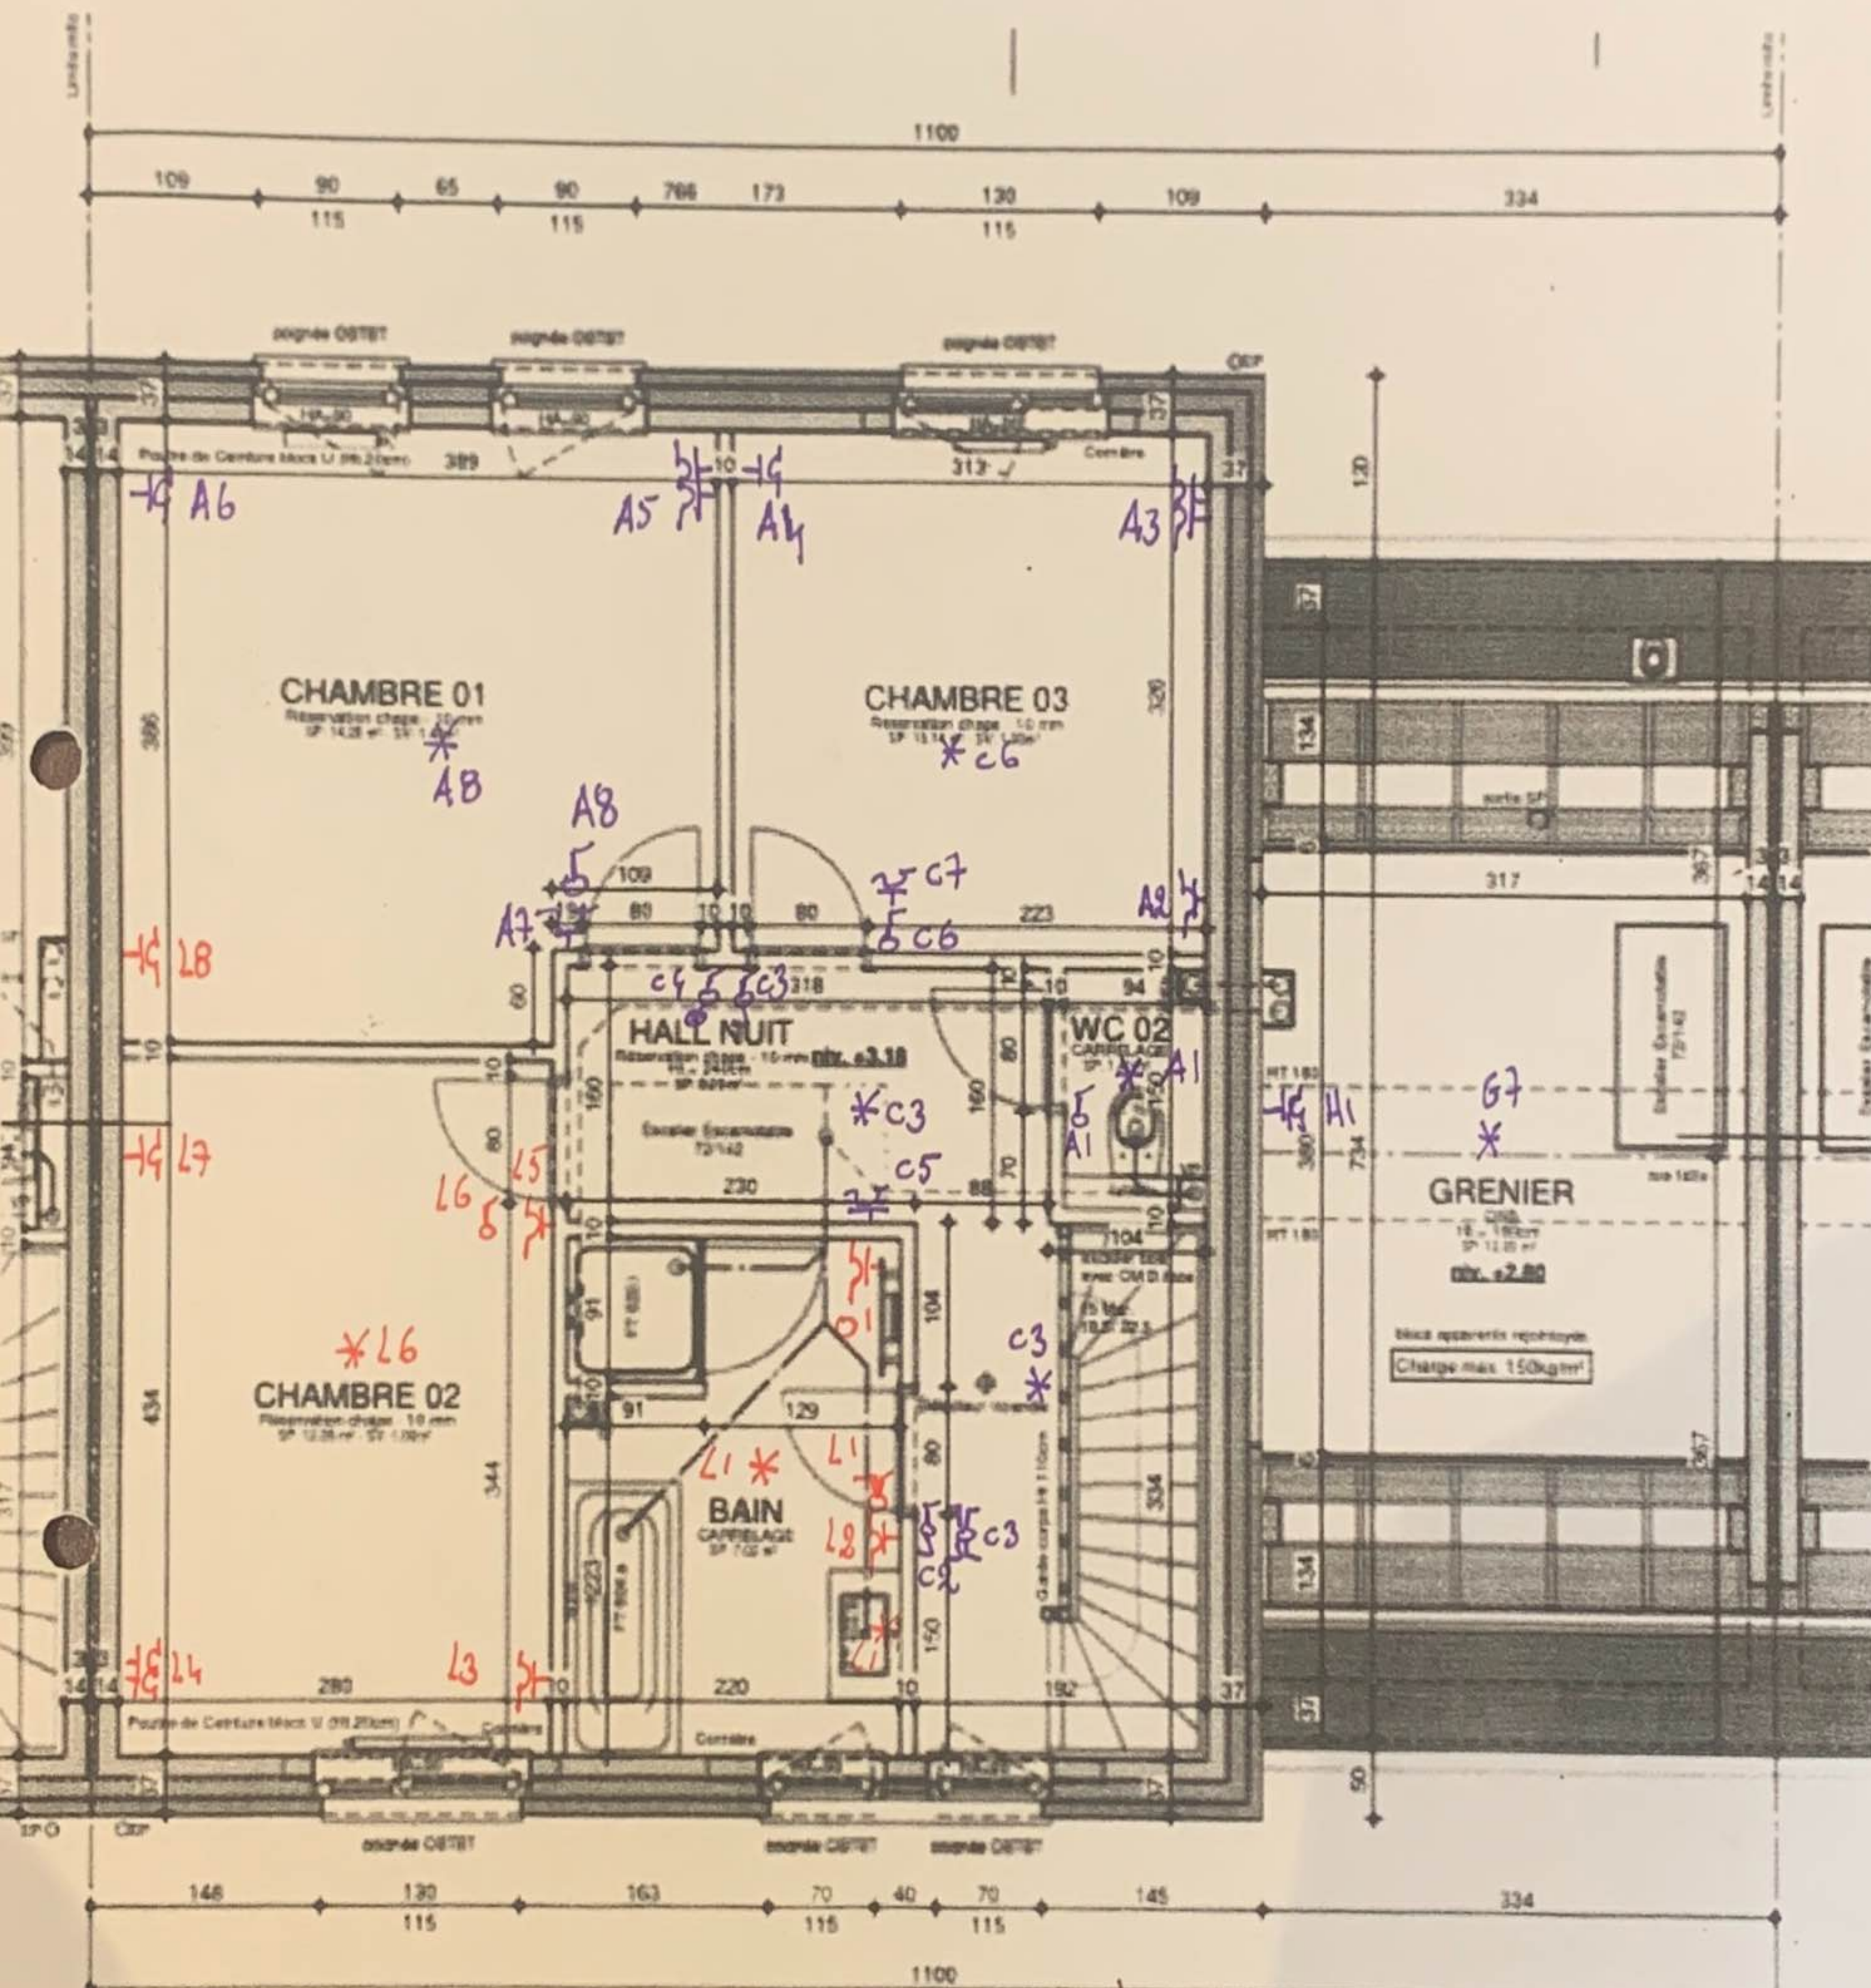


Voici la pose d'un pare-vapeur, il ne sera pas possible d'intégrer des spots encastrés sans réalisation d'un faux-plafond

LOT 76

Client: Thomas & Pinon
rue Time Briac . 12
5001 Belgrade

Installateur: B&N elec
rue des Hautes, 25
6186 Gagnies

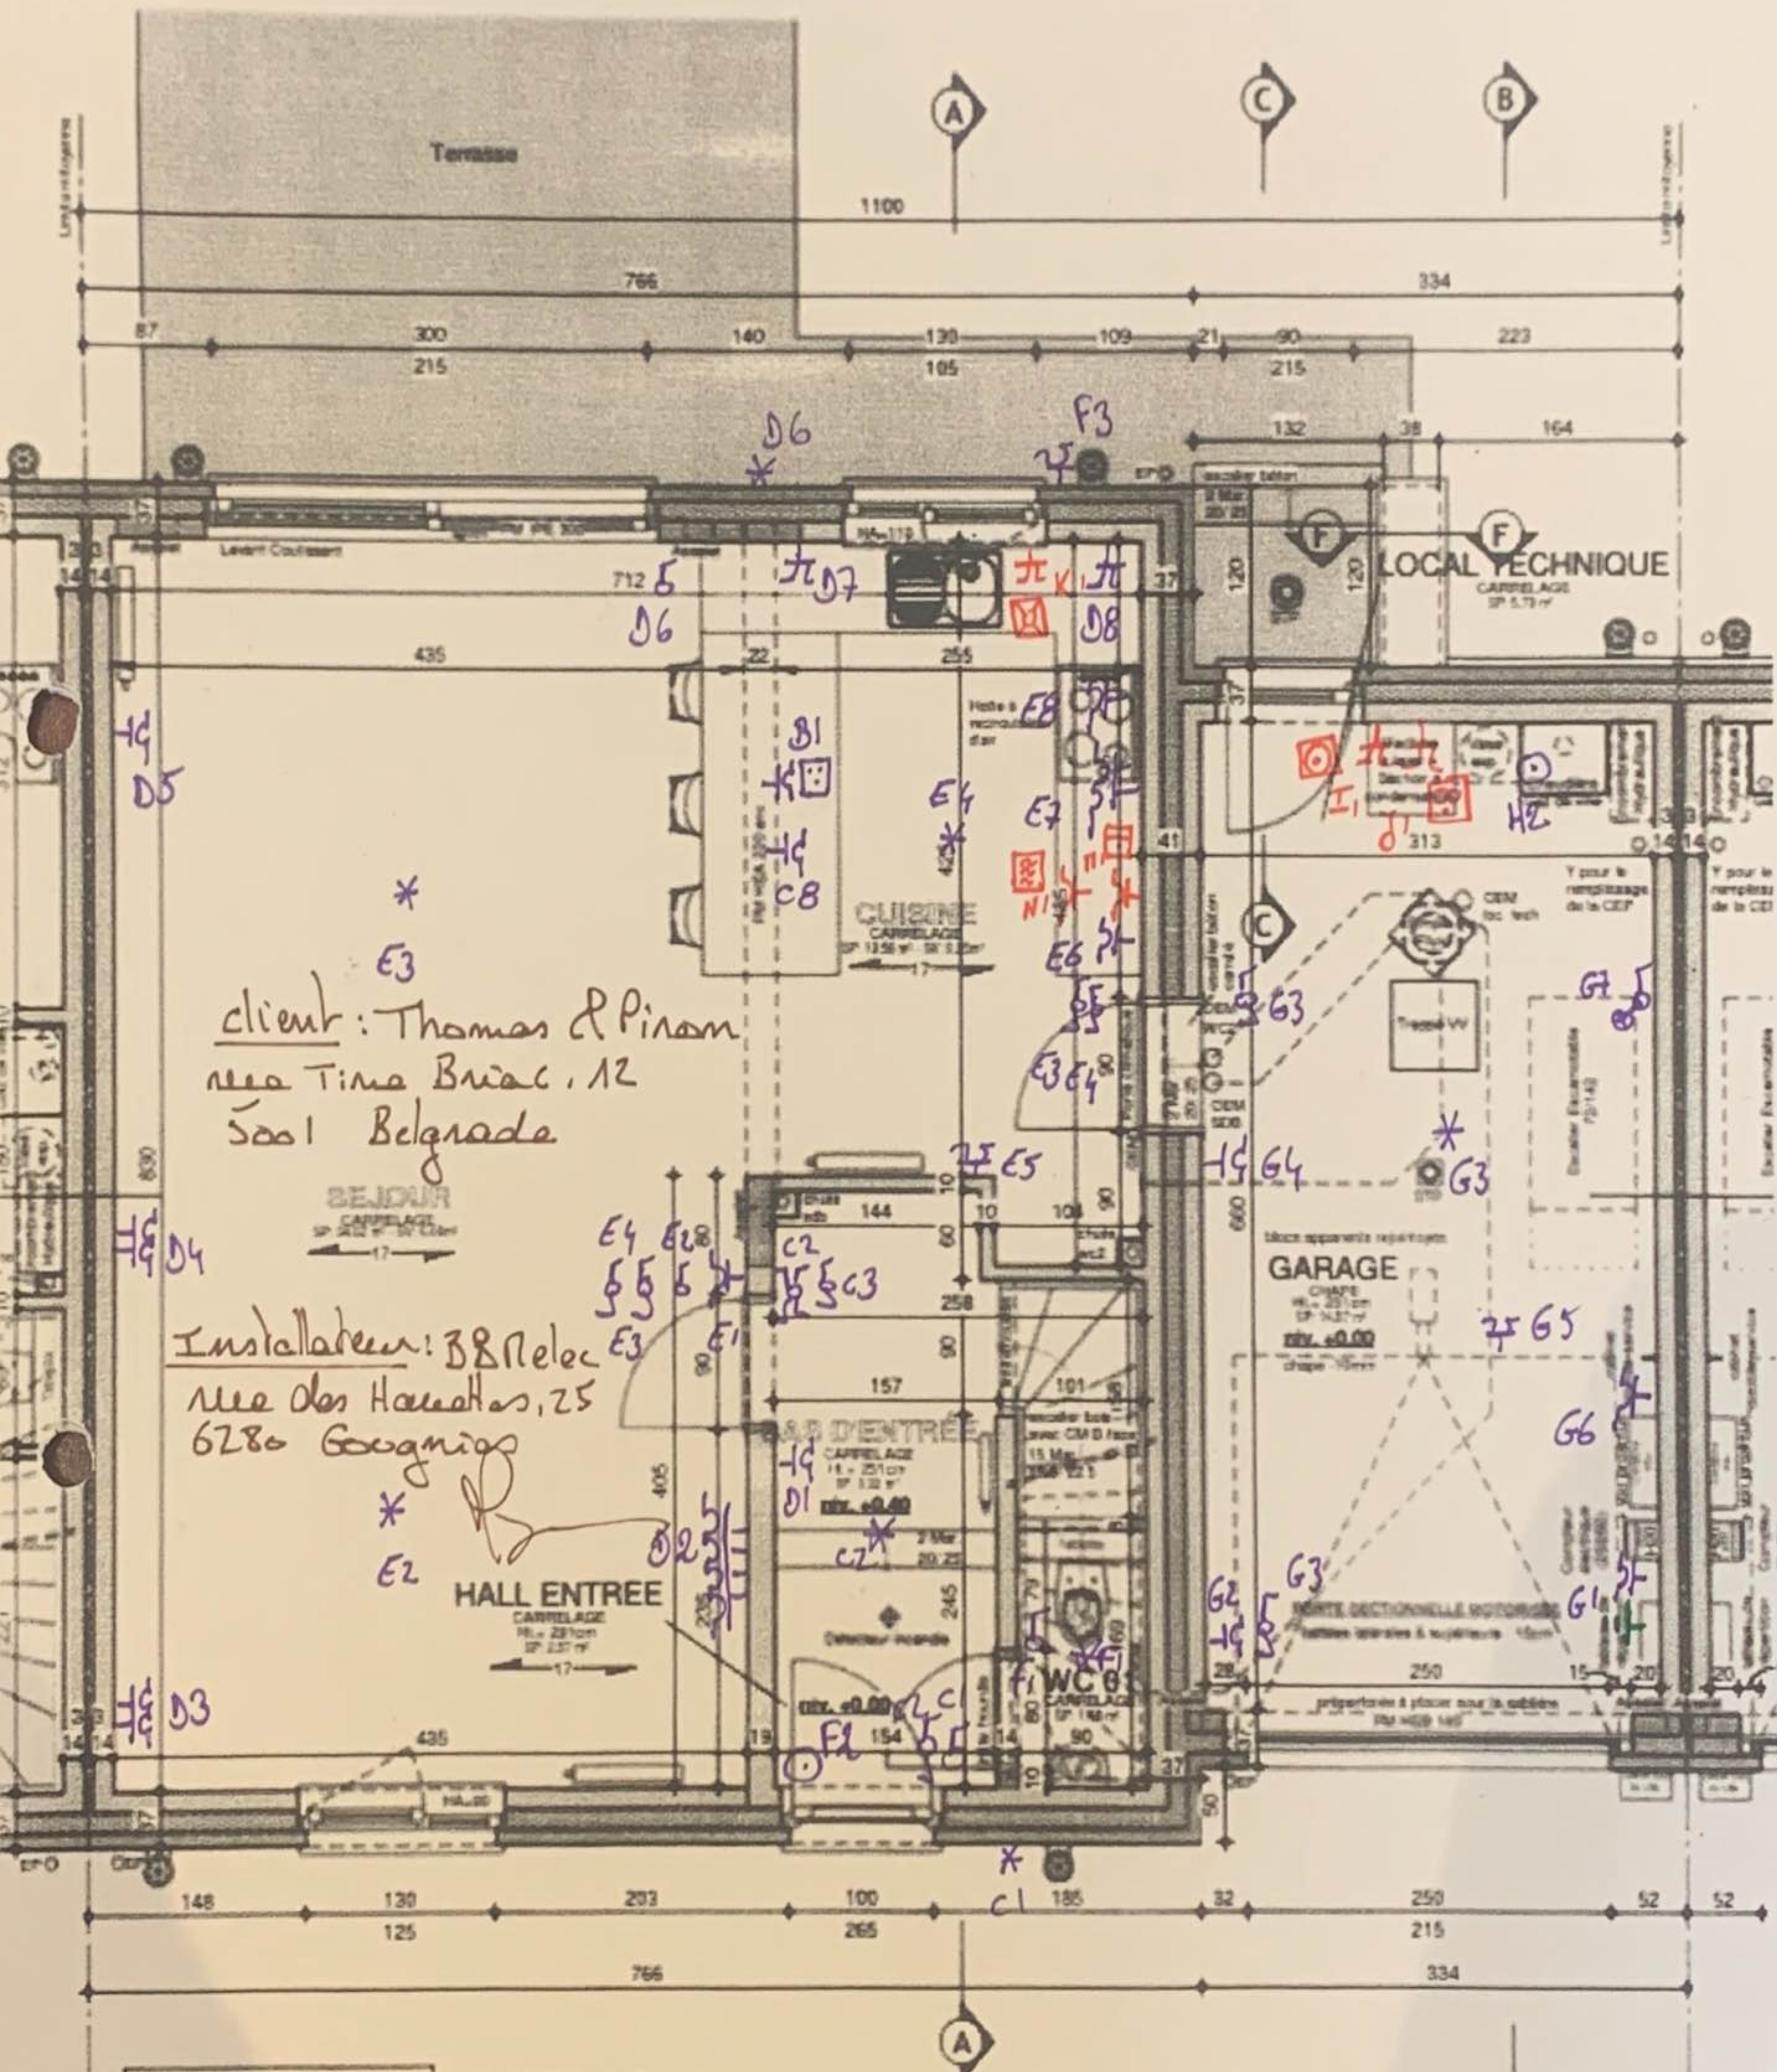

La brique est posée en débord de 1 cm (vers l'extérieur) par rapport au bloc béton du sous-sol.

LOT 76


BDT 4

client: Thomas & Pinon
 rue Time Buiac, 12
 5001 Belgrade

Installateur: B&N elec
 rue des Huguettes, 25
 6280 Gougnies

A

[Signature]

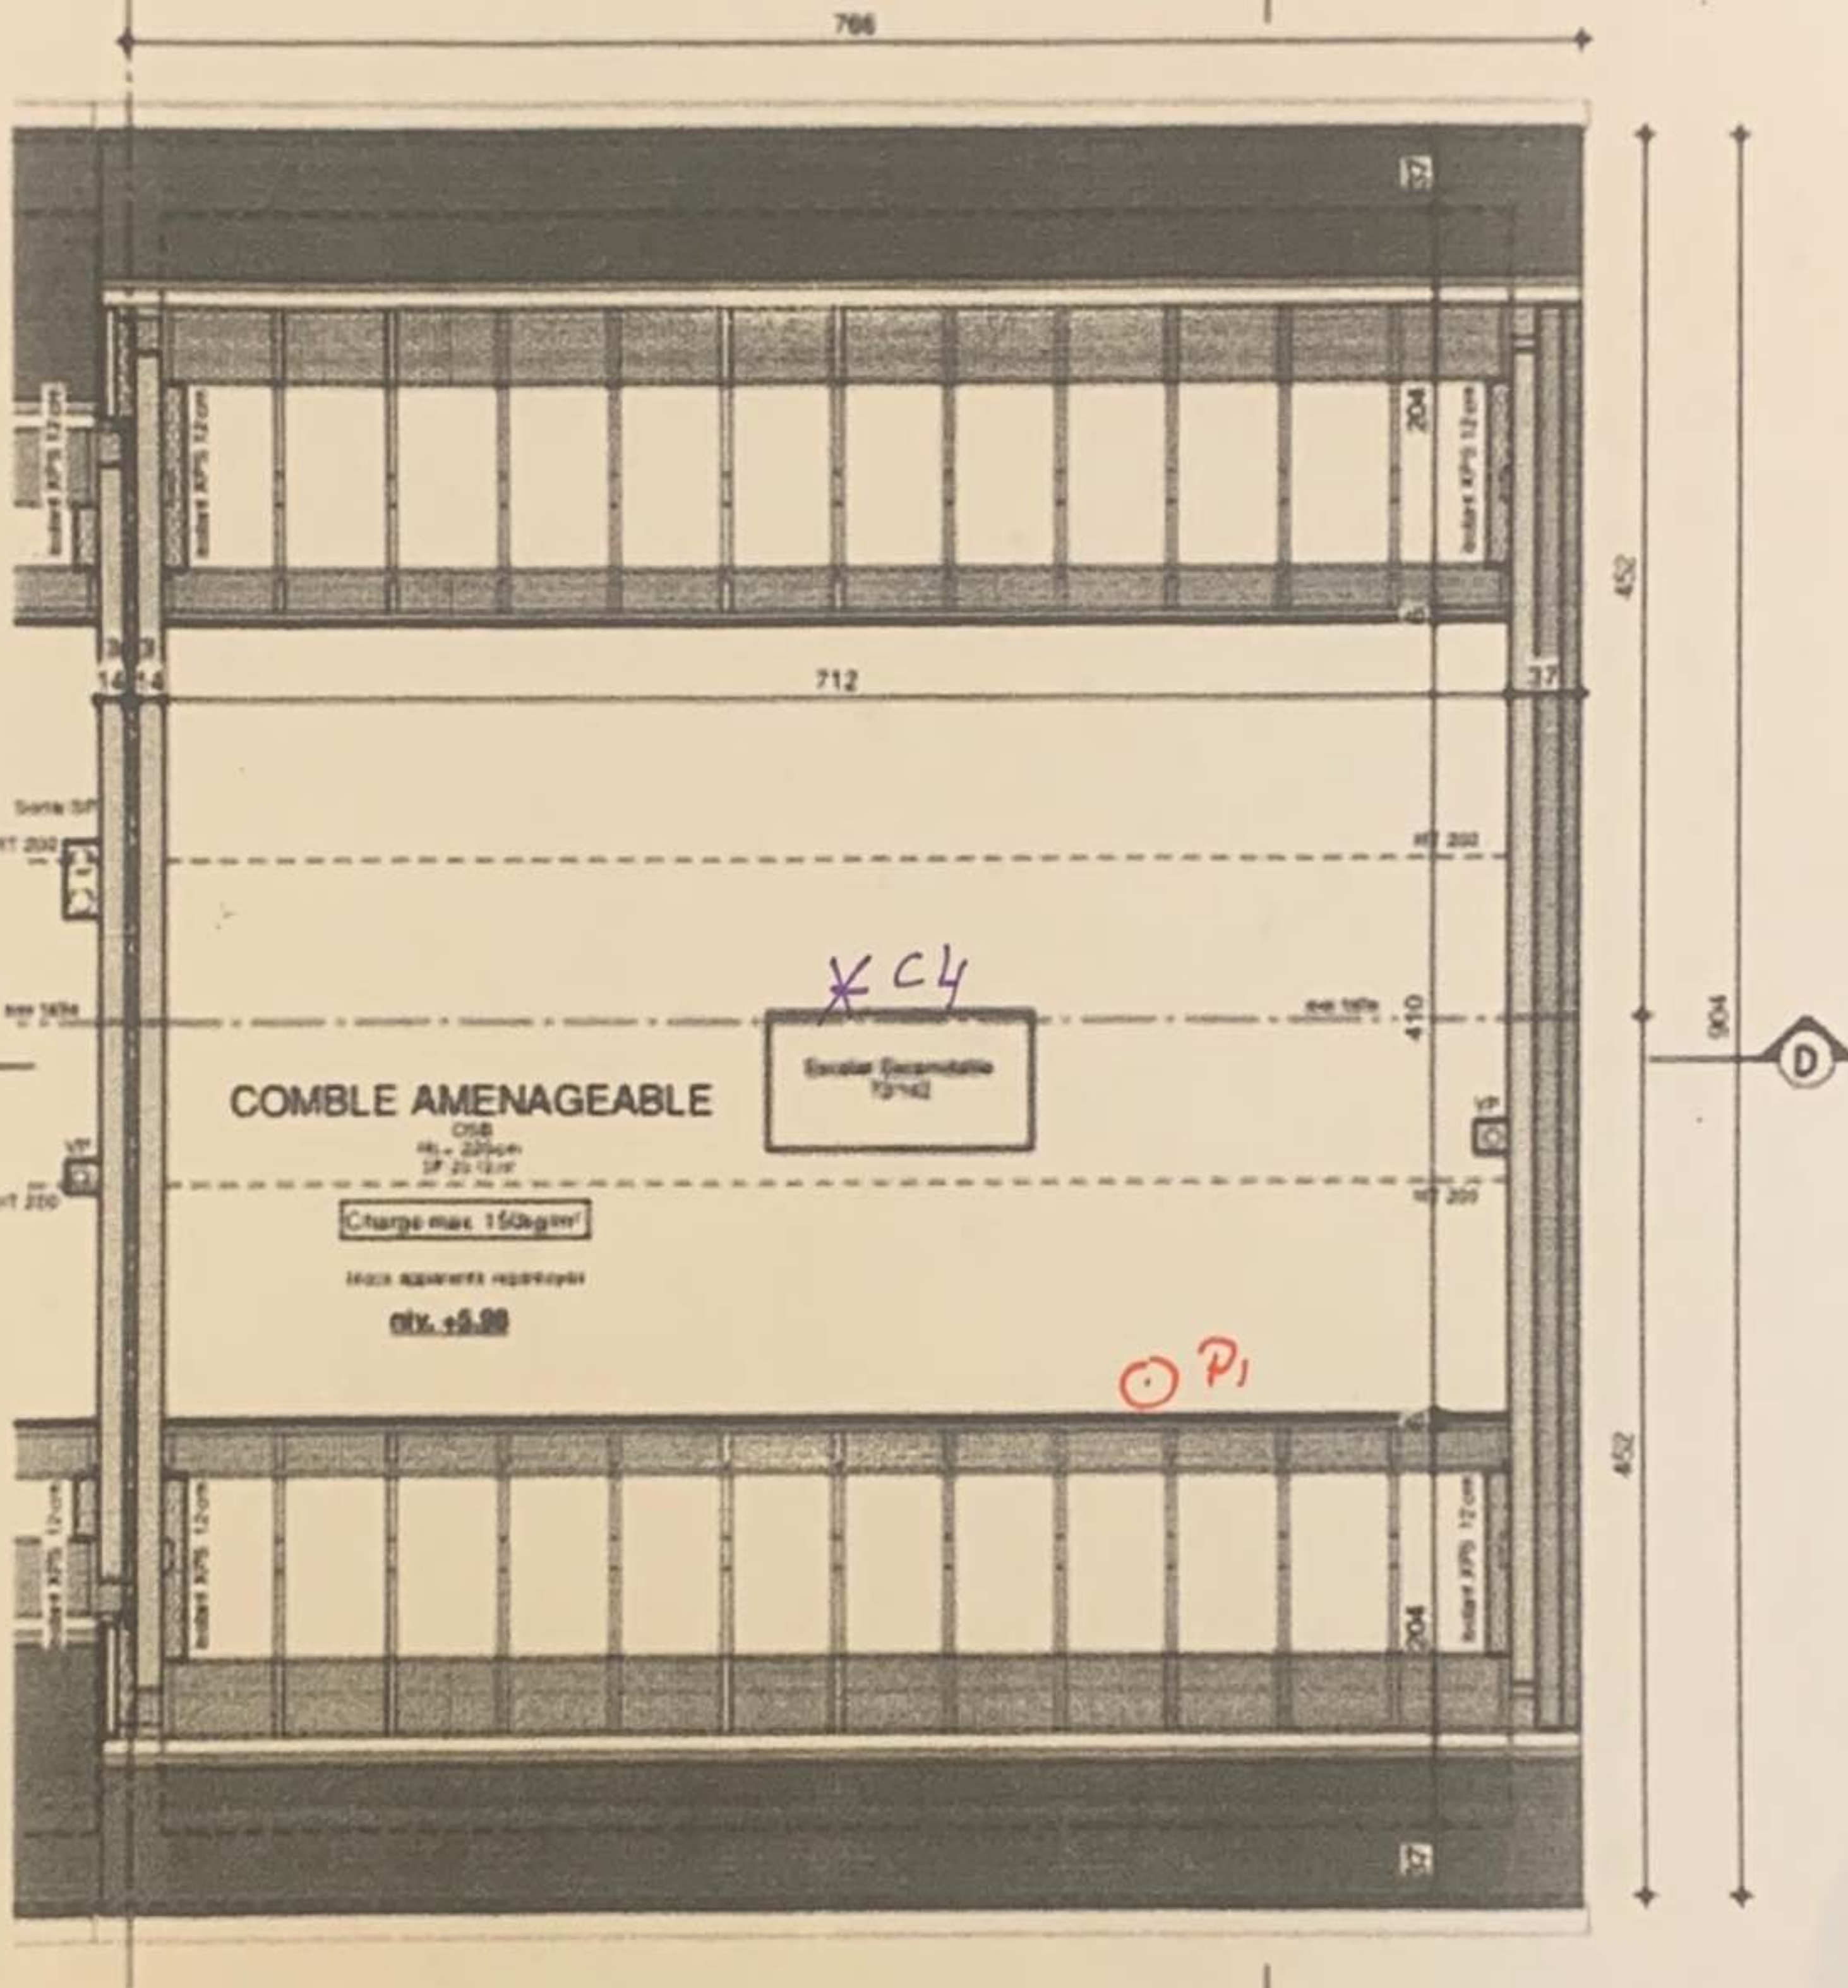

Vu la pose d'un pare-vapeur, il ne sera pas possible d'insérer des spots encastrés sans réalisation d'un faux-plafond

A

LOT 76
