



A 1665652

ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971

Je soussigné : Nom : OKTAM Prénom : DANIEL
Représentant de l'entreprise : Danitech365 N° de T.V.A. : B6071326569
Rue : Leuvensesteenweg N°181 Boîte :
Code postal : 1932 Localité : Zaventem Tél : 0465249265 Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :)
Adresse + Tél. :)

atteste formellement et garantis par la présente

installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue : Avenue Clemenceau N° : 52 Boîte : Étage : 2er
Code postal : 1020 Commune : BRUXELLES

Marque compteur : Ubi N° du compteur : 98335463

pour le compte de : Nom : Servicé du SPRL Prénom :
Rue : St Jean N° : 130 Boîte :
Code postal : 1480 Commune : Châteaufort

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
- avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réservé à l'installateur :

Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».

☒ oui ☐ non

Si oui : n° Cerga : 22-05090-W

Réservé au GRD :

Date : 25/11/2011

Signature + nom :


Daniel Okta

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique : le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

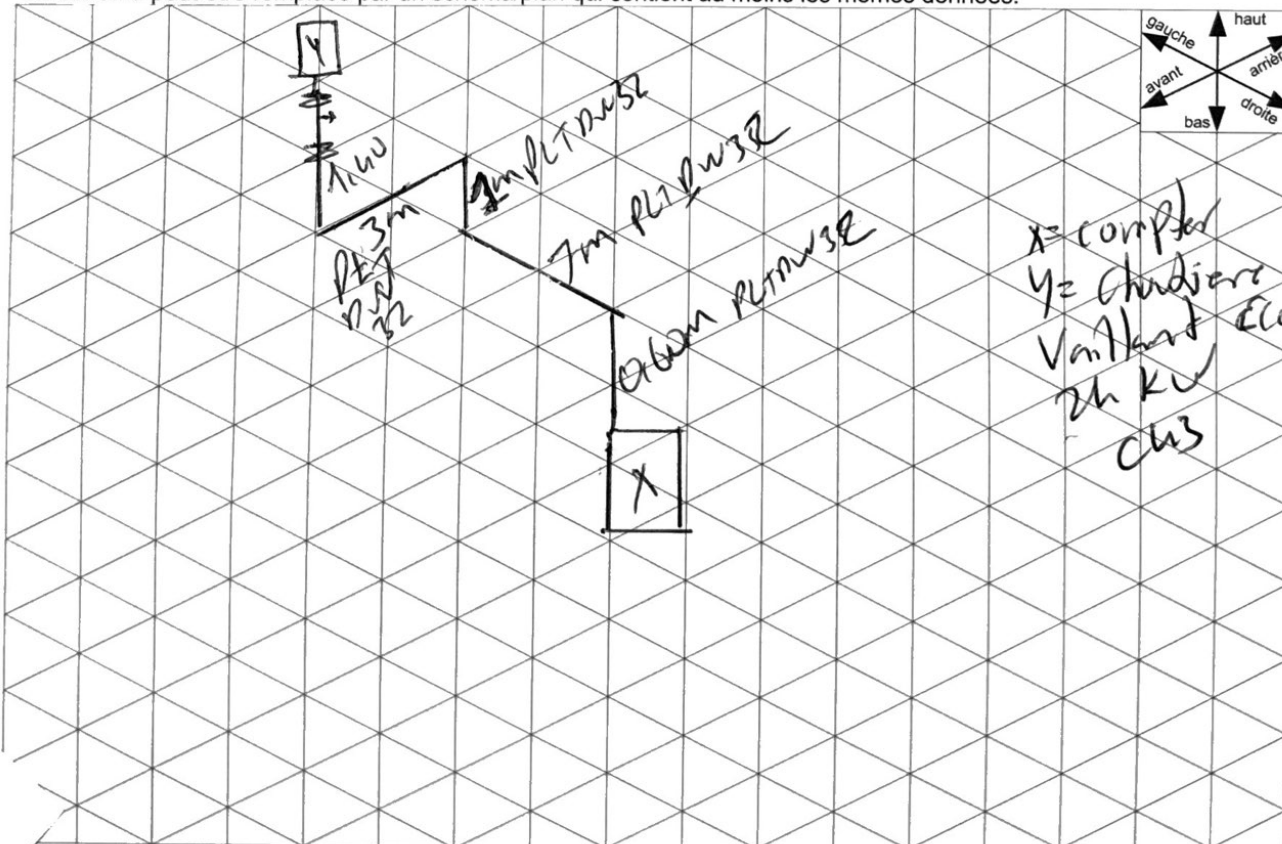

ORGANISME DE CONTROLE

IBAN:

http://www.inspectbelgium.be

Mission: 26810

Client / Entreprise: Claude Mauren

ID Externe:

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

TVA BE0647601296

Avenue Eiffel 8

No Client: 00037769

Adresse: Av. Clemenceau, 52, 1070

Anderlecht

Ref. PV précédent:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460

info@inspectbelgium.be

Contact:

TVA:

Date d'émission: 2022-04-28

INSPECT
BELGIUM

vzw JL

Num. rapport: 20220003999-V.1

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ : INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation

Lieu d'inspection: 1er étage / Av. Clemenceau, 52, 1070 Anderlecht, Belgique

Référence: Livre 1 Chapitre 6.4.

Date d'inspection: 27/04/2022

Inspecteur: Mohamed TAKADDOUNI

Propriétaire: Claude Mauren

Pers. Cont.:

NRN: /

Documents de référence:

Type de locaux: Appartement

Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage

Autres Règlements:

Prochain contrôle au plus tard le 27/04/2047 ou dans un délai de: 299 mois

Installateur: /

T.V.A.:

tel:

Date: 13/07/2021

Delivré a: /

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: SIBELGA

Numero EAN: Compteur: 34731181

Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Tension de serv.: 2x230V

Liaison comptage-coffre de repart.

I max. instal.: 40A

Type de câble: XVB

Marque:

Nature du courant: Alternatif

Index I: 008256,9

Index II: 008516,6

Prot. princ. branchement: aut. 2p 10A

Nombre de cond.: 2

Section: 10 mm²

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI

Description Installation:

☒ voir les schemas en annexe

Installation executée conformément aux schemas: en ordre

Inventaire des influences externes present et signé: p.a

Protection contre les chocs electriques:

Différentiels essai par bouton test: en

ordre

Contrôle des boucles de défaut: en ordre

Electrode de terre:

type: piquets

Continuité PE et liaison equipotentielle: en ordre

Inter.Diff. General: 2p 40A/300mA

Pas encore places: cuisine,

Nombre de tableaux: 1

Adéquation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre

Adéquation entre le différentiel et la valeur de la resistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schema unifilaire et schema de position ont ete signes pour approbation

Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre

Contact direct: en ordre

Resist. d'isolement general: 29,7 Mohm

Contact indirect: en ordre

Section: 16 mm²

Resistance de dispersion: 10,78 Ohm

Matériel et influences externes: en ordre

Diff. supplém.: 2p 40A/30mA

Nombre de circuits terminaux: 15

CONCLUSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).



Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.

N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

ORGANISME DE CONTROLE

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

+32 10 280 577 - +32 15 860 460

1 / 5
