



A 1665655

**ATTESTATION À DÉLIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION
DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN
APPLICATION DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971**

Je soussigné : Nom : Dutay Prénom : Daniel
Représentant de l'entreprise : Daniel Dutay N° de T.V.A. : B507176563
Rue : Levenssteden N° : 187 Boîte :
Code postal : 1431 Localité : Zaventem Tél : 0465 449161 Fax :
(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :)
Adresse + Tél. :)

atteste formellement et garantis par la présente

installation neuve / partie neuve d'installation (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue : Avenue Clemenceau N° : 52 Boîte : Étage : 3
Code postal : 1010 Commune : BXL
Marque compteur : UGF N° du compteur : 27436466
pour le compte de : Nom : Soncellist sp 26 Prénom :
Rue : St Jean N° : 130 Boîte :
Code postal : 1080 Commune : Clabegge

- avoir réalisé l'installation gaz conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion. Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.
- avoir testé l'étanchéité de l'installation gaz.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci.

Réservé à l'installateur :

Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».

☒ oui ☐ non

Si oui : n° Cerga : 22-05090-N

Réservé au GRD:

Date : 25/11/21

Signature + nom :


Daniel Dutay

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B, ..., sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

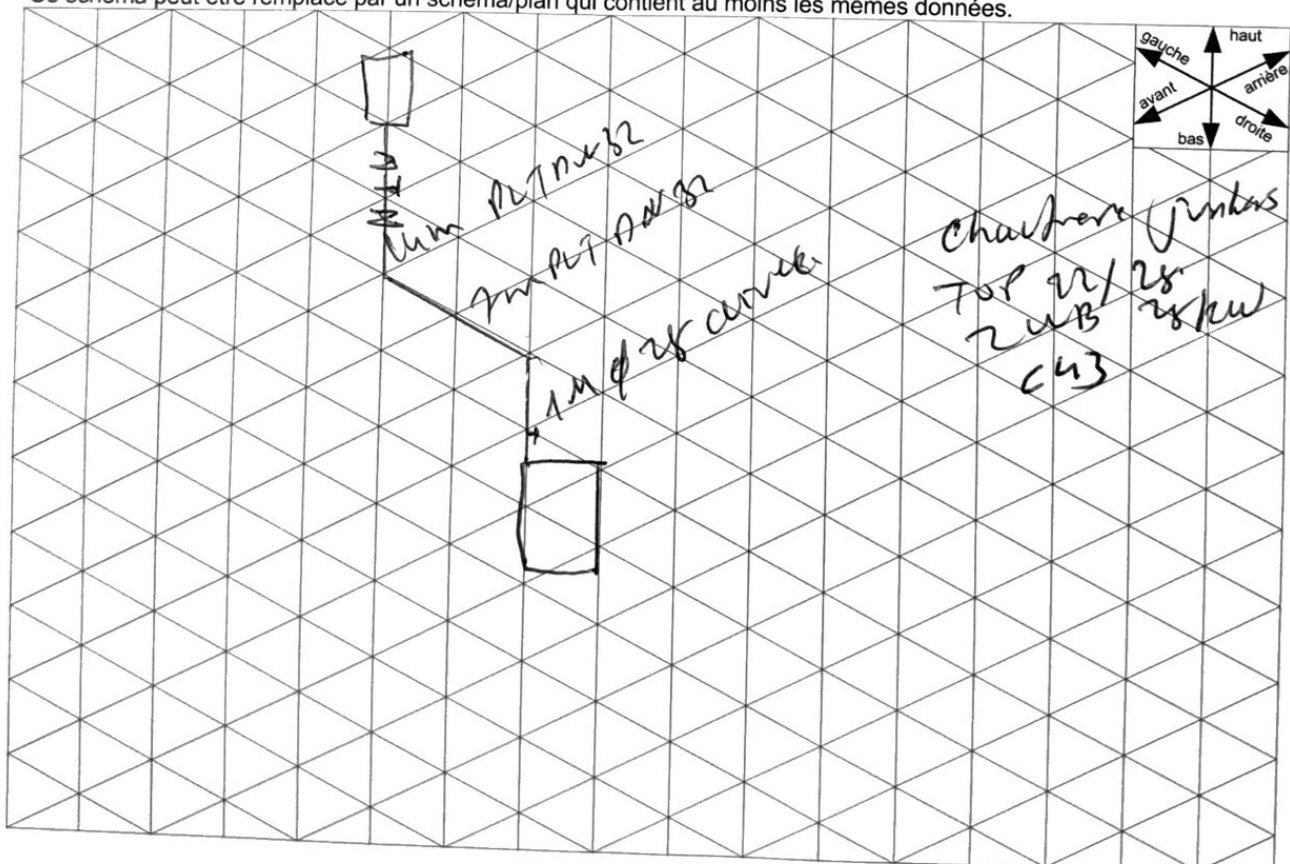

ORGANISME DE CONTROLE
IBAN:
Numéro 24810
Client: Entreprise Claude Mauren
ID Externe

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
TVA BE047 7441 296
Assurance: L'Esprit B
No Client: 000377A9
Adresse: Av. Clemenceau, 52, 1070
Anderlecht
Ref PV précédent:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be

**INSPECT
BELGIUM**

Contact:
TVA:
Date d'émission: 2022-04-28

EXEMPLAIRE ORIGINAL

Num rapport: 20220004001-V3

RAPPORT DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ: INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT & TBT DOMESTIQUE

GENERALITE

Type d'installation: Nouvelle installation
Lieu d'inspection: Duplex 3ème étage / Av. Clemenceau, 52, 1070 Anderlecht, Belgique
Référence: Livre 1 Chapitre 6.4
Date d'inspection: 27/04/2022
Inspecteur: Mohamed TAKADDOMI
Propriétaire: Claude Mauren
Pers. Cont.:
NRN: /
Documents de référence:

Delivré a: /

Type de locaux: Appartement
Type d'inspection: Contrôle de conformité avant mise en usage
Autres Règlements:
Prochain contrôle au plus tard le: 27/04/2027 ou dans un délai de 299 mois
Installateur: /
T.V.A.:
tel: Date: 13/07/2021

DETAILS DU POINT DE FOURNITURE

Nom de l'entreprise distributrice d'électricité: SIBELGA
Numéro EAN: Compte: 34731180
Raccordement: Souterrain ou aérien (Ondergrondse of bovengrondse)
Tension de serv.: 2x230V I max. instal.: 40A
Liaison comptage-coffre de repart. Type de câble: XVB

Marque:

Nature du courant: Alternatif Index I: 008080,0 Index II: 009304,2
Prot. princ. branchement: aut. 2p 40A Section: 10 mm²
Nombre de cond.: 2

CONTROLES VISUELS - MESURES - ESSAIS

Schémas conformes et signés: OUI
Description Installation: ☒ voir les schémas en annexe
Installation exécutée conformément aux schémas: en ordre
Inventaire des influences externes présent et signé: p.a
Protection contre les chocs électriques: Contrôle des boucles de défaut: en ordre
Différentiels essai par bouton test: en ordre
Electrode de terre: type: piquets
Continuité PE et liaison équipotentielle: en ordre Matériel et influences externes: en ordre
Inter.Diff.General: 2p 40A/300mA Scellé par plombage: en ordre
Pas encore places: cuisine, Appartement en travaux lors de notre passage.
Nombre de tableaux: 1
Adequation entre les dispositifs de protection et la section des conducteurs: En ordre
Adequation entre le différentiel et la valeur de la résistance de dispersion de terre: En ordre

☒ schéma unifilaire et schéma de position ont été signés pour approbation
Etat du matériel électrique (fixation, dégradation...): en ordre
Contact direct: en ordre Contact indirect: en ordre
Resist. d'isolement general: 200 Mohm
Section: 16 mm²
Diff. supplém.: 2p 40A/30mA
Nombre de circuits terminaux: 14
Resistance de dispersion: 10,78 Ohm

CONCLUSION



L'INSTALLATION EST CONFORME

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension et peut être mise en service. La prochaine visite de contrôle est à effectuer dans le délai prescrit par le Livre 1 (voir ci-dessus).

Pour le Directeur Technique,
L'inspecteur,

CONSTATATIONS

Note (N) - Remarque (O) - Infraction au Livre 1 (I) - Dérogation (D) - les numéros réfèrent aux infractions standardisées

- N11 - Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
N12 - Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.
N13 - Sauf stipulation contraire, l'examen porte exclusivement sur l'état et le bon fonctionnement de l'installation. Sa conception sort du cadre de la mission.

ORGANISME DE CONTROLE

INSPECT BELGIUM asbl/vzw

+32 10 280 577 - +32 15 860 460

1 / 6
