



Beter Zeker.
Bien Sûr.

PROCES VERBAAL DE CONTROLE TIJDE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

L'INSTALLATION EST CONFORME

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-dessous.

Votre contrôle a été effectué par BTV ASBL, bureau BTV Hainaut, Rue des Bureaux 1a, 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
T: 064 33 64 55, E: btv.hainaut@btvcontrol.be

Rapport N°:	0427-170706-04	Date du contrôle :	06/07/2017
		Extra date du contrôle:	APP D 3 3

DONNEES GENERALES:

ADRESSE DE L'INSTALLATION :	ILLOT SACRE RUE DILIGENCE APP D 3 3 1000 BRUXELLES	Visualisation de l'installation		
PROPRIETAIRE:	ILLOT SACRE CONSTRUCTION SPRL			
Adresse :	Joseph BENS 76 1180 BRUXELLES			
DEMANDEUR :	DEVOGELAERE			
Adresse :	RUE DE LA PISSELOTTE 20 6142 LEERNES			
INSTALLATEUR :	DEVOGELAERE			
Adresse :	RUE DE LA PISSELOTTE 20 6142 LEERNES			
I VA ou CI :				
EAN :		Compteur n°	A placer	Index :

DESCRIPTION GENERALE ET CARACTERISTIQUES:

Type d'installation :	Nouvelle installation /	Type des locaux :	Appartement
Début travaux fondations :	Après 01/10/81	Installation électrique :	Après 01/10/81
Raccordement tension :	Mono 230V	RGIE art. :	86
Câble aliment. tableau princ. :	2 x 10 mm²	Protection raccordement :	max 40 A
Type électrode de terre :	Boucle	Inter. gén. : type :	2p 40A/300mA
Nombre de tableaux :	1	Nombre de circuits term. :	11
Facteurs d'influences externes :	-	Schéma :	TT

CONTROLE:

Visite de contrôle suivant :	RGIE art. 270,
Type de contrôle :	Examen de conformité

MESURES:




RA:	1,5 Ohm	RI tot	5 MOhm
-----	---------	--------	--------



Beter Zeker.
Bien Sûr.


PROCES-VERBAL DE CONTRÔLE FINAL
INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Schémas



VOIR PLAN CUISINE
/ MOD 3 b

SUIVANT ELEVATION DE EMS
DU 22/04/2016 RECUE EN REUNION
LE 19/09/2016

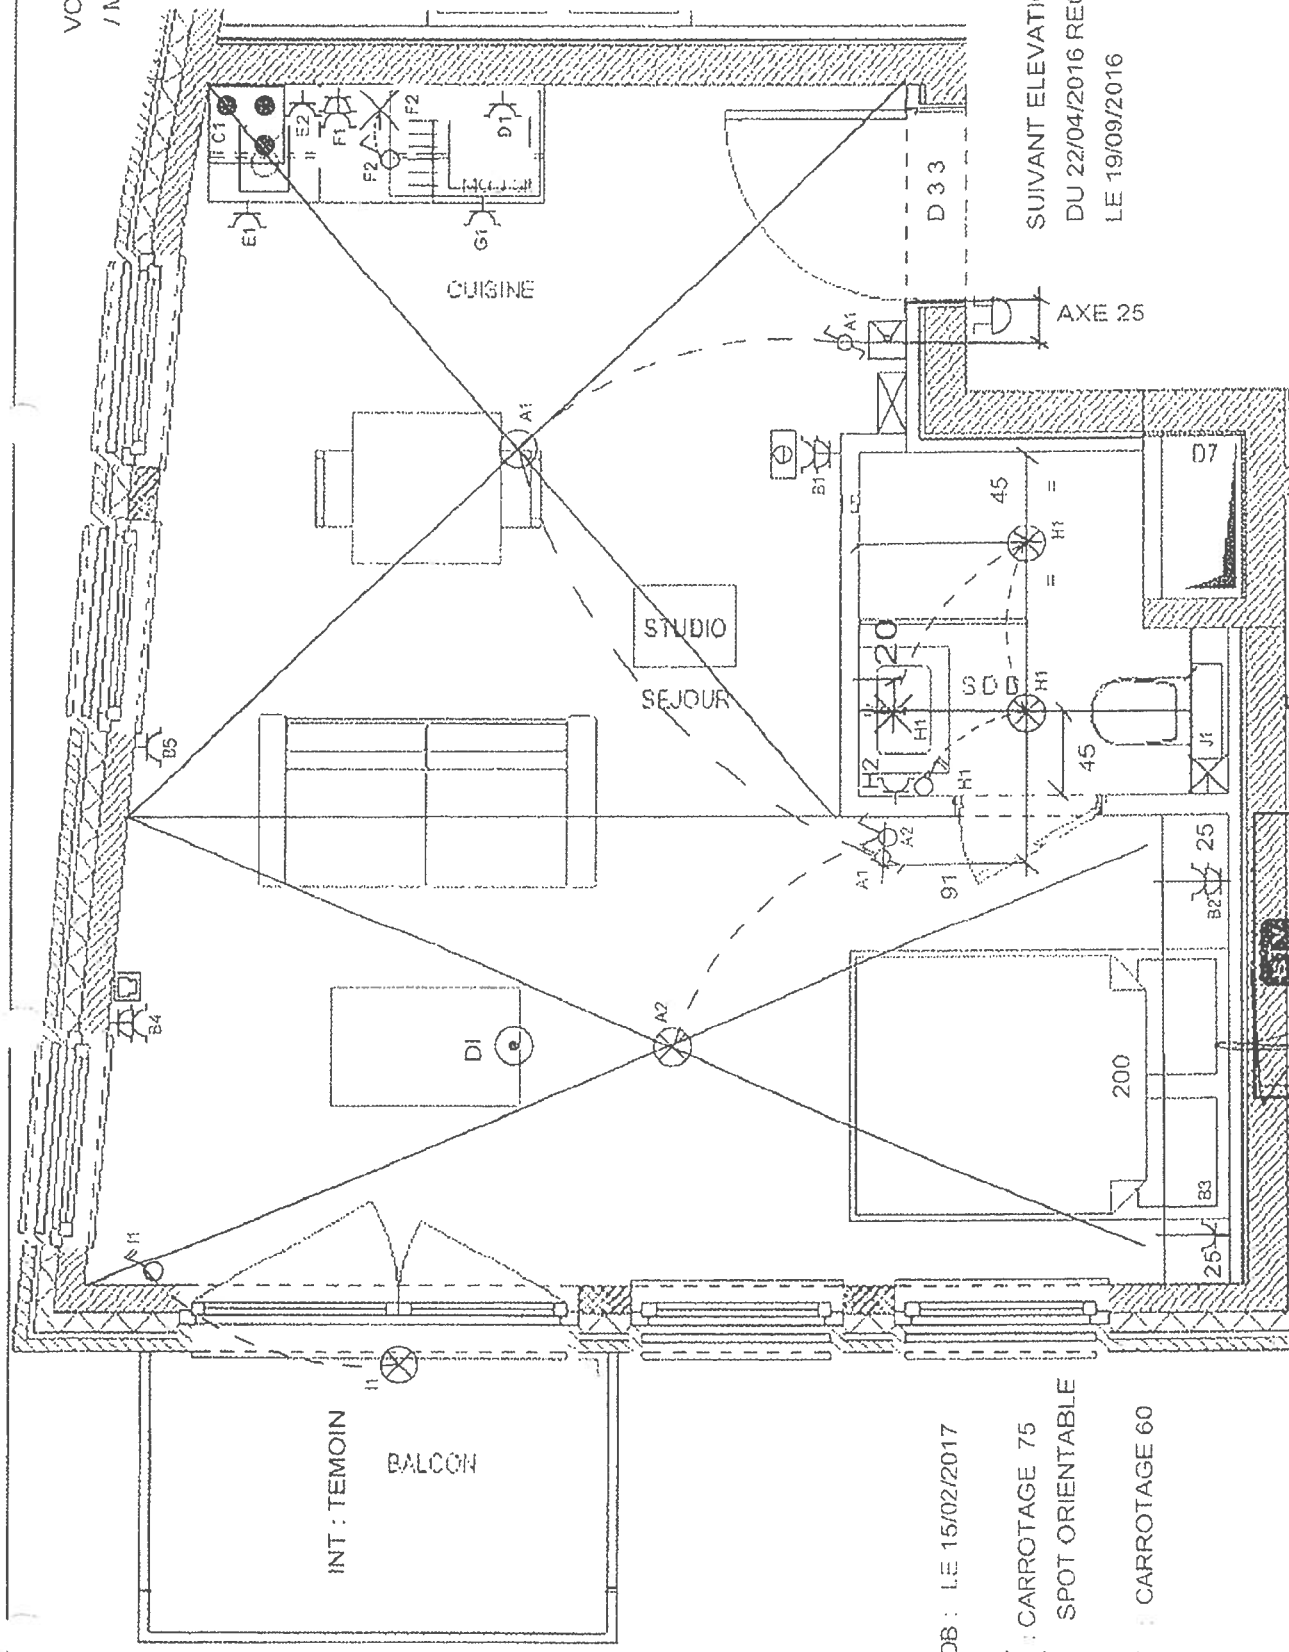


INT : TEMOIN
BALCON

SDB : L.E 15/02/2017

- ✕ : CARROTAGE 75
SPOT ORIENTABLE
- ⊗ : CARROTAGE 60

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		LE 28/02/2017	APP D 3 3
Nom	DEVOGELAERE PHILIPPE	ORGANIS.	..	Nom	ILEOT SACRE APP D 3 3	11-03-02-A	STUDIO
TVA	..	Nom	..	Rue	RUE DILIGENCE		
Date	27/06/2017	Date	..	Comm	1000 BRUXELLES		
Sign	DEVOGELAERE PH.	Sign	Christine Hocquet / 427	Sign			

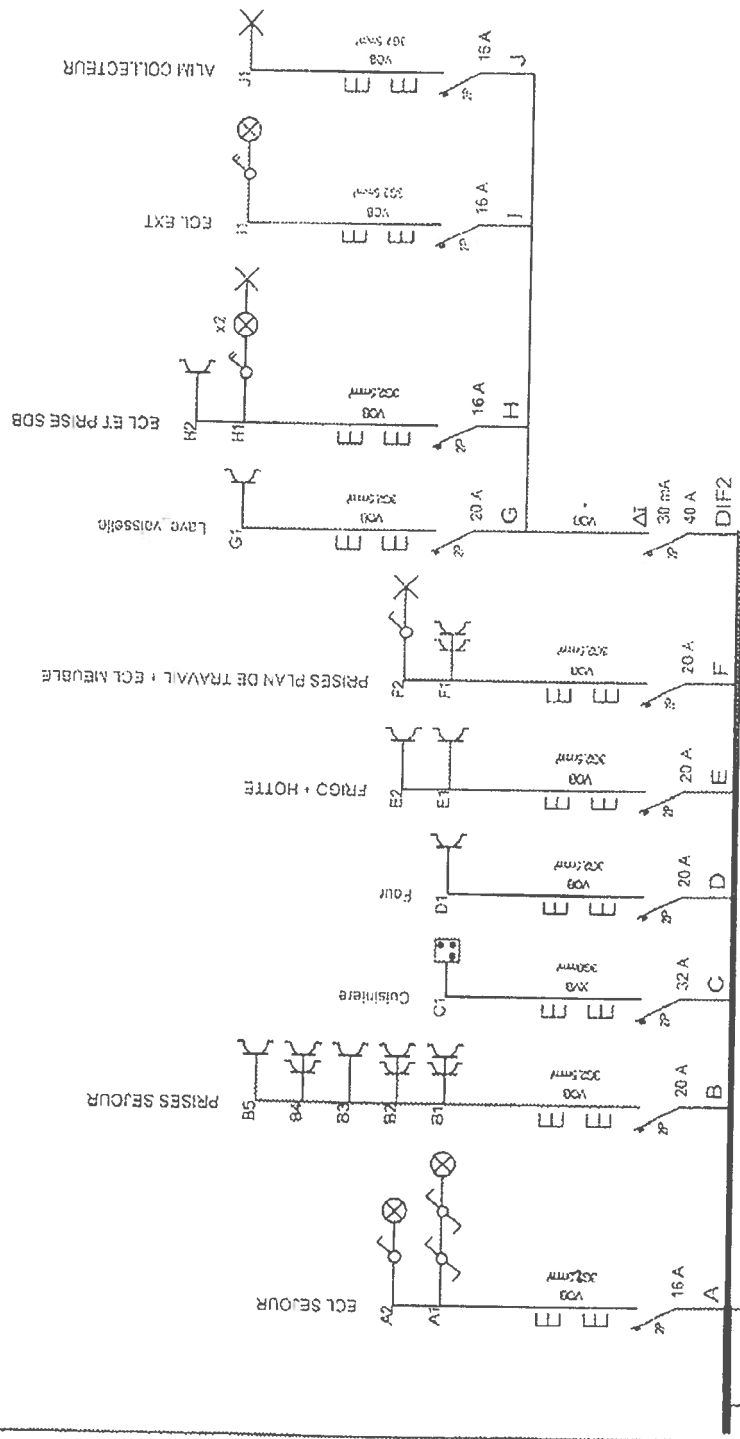

5-07-2017


Christine Hocquet / 427

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		Schema1A		APP D 3 3	
Nom	DEVOGELAERE PHILIPPE	ORGANIS		Nom	ILOT SACRE APP D 3 3				
TVA	..	Nom		Rue	RUE DILIGENCE				
Date	27/06/2017	Date		Comm	1000 BRUXELLES				
Sign	DEVOGELAERE PH.	Sign		Sign					

D33

Sym Detail

01	BOITE DE RACCORDEMENT TAQUE (7800W)
02	E-WCD-Ha (gp) 1 b v
03	PRISE FRIGO (500W)
04	DOUBLE ROSINET SHELL 1/2" (EAU FROIDE)
05	ROBINET SHELL 1/2" (EAU CHAUDE)
06	PVC/GEBERIT AVEC JOINT 40MM
07	PRISE HOTTE
08	TELESCOPIQUE (500W)
09	PRISE FOUR COMBI (3650W)
09	CABLE EN ATTENTE LONG 1500 MM (400W)
10	DOUBLE PRISE DE SERVICE (3500 W)

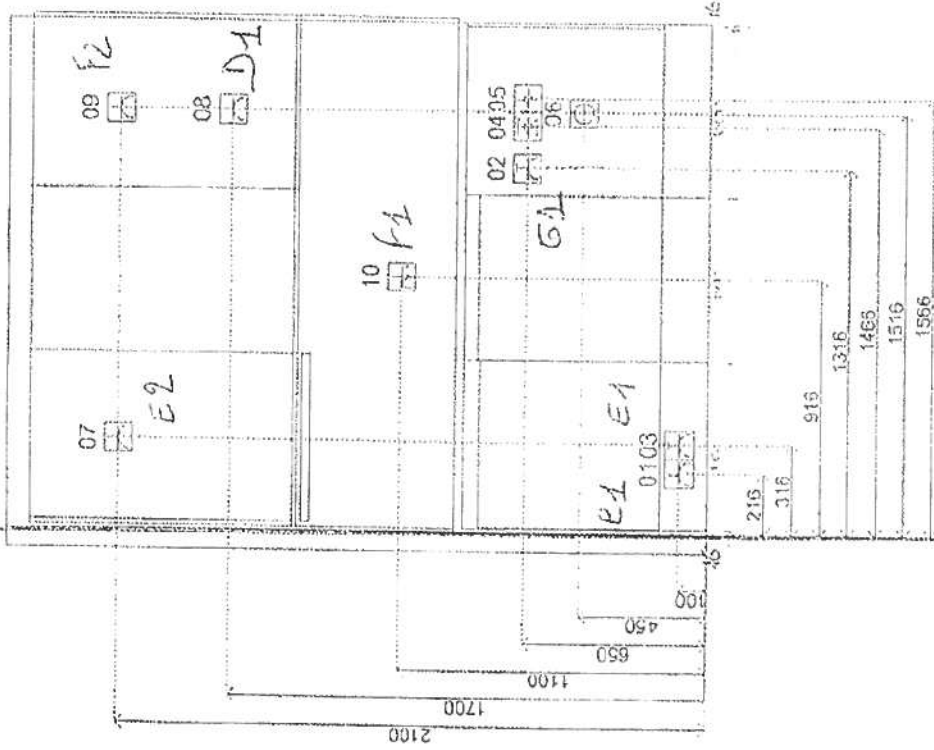

MOD 3B
=> ces classique
(murs L)

Si mur n'est pas L

Ex:



Filature
verticale

on coupe la module
au cas du mur

H02 (1)
H02 (2)

ETUVE (modèle)
N° (modèle)

ETV
- 5 - 07 - 2017
Christine Hocquet / 427

Cliant
Référence
No de bon
Dessin
Installation mur 1

Herpain

45019340.06.28

bruynzeel
KUKERS/GRUINER

Projet
Nr. constr
Adr de livr
Vendeur

Etuve te Brussel
Opstelling 7 / Type 1 Bis - Cuisine 3 Modules
Studio
Henri Huybrechts

Date
Echelle
Version
Format

28-1-2016

Deze tekening is niet bindend / Ce dessin n'est pas contractuelle
