

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT**

**CONFORME**

**Date inspection:** 13/02/2026      **Inspecteur:** Denis Nyssen      **Mentor:**      **Installateur:** BERTRAND LENNERTZ  
**Étiquette d'identification:**      **Référence client:**

N° TVA:BE 0686 613 807

Marque et type d'appareil de mesure:      Numéro de serie:

**Date rapport:** 13/02/2026

**Adresse de l'installation**

Rue      Runschen  
Numéro      4  
Boîte  
Postcode      4837  
Commune      BAELEN  
Pays      Belgique

**Propriétaire**

Nom      Pillitteri  
Rue      Runschen  
Numéro      4  
Boîte  
Postcode      4837  
Commune      BAELEN  
Pays      Belgique

**Installateur**

Nom      -  
N° TVA      -  
Numéro de téléphone  
E-mail      -

**Type :** maison

Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

**EAN :** 54

**N° compteur :** 3200237976



**Type de contrôle:**

Visite de contrôle d'une installation domestique selon(AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.5. et 4.2.4.3.

Distributeur: ORES      Tension: 3N400V      Liaison comp / tableau: 10 mm²      Protection Max: 40 A  
Nombres tableaux: 2      Nombre de circuits: 19  
Prise de terre: Electrode horizontale enterrée

Ri général: 11.6 MΩ

RE: 21.1 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

| Δ (mA) | In (A) | In - autres (A)  | IΔt | Type | Circuits protégés | Test | x 2,5 |
|--------|--------|------------------|-----|------|-------------------|------|-------|
| 300    | 40     |                  | -   | A    | Tous              | OK   | -     |
| 30     | 40     | 22,5kA2s (3000A) |     | A    | TD cuisine        | OK   | -     |
| 30     | 40     | 22,5kA2s (3000A) |     | A    | P à S             | OK   | -     |

DESCRIPTION INSTALLATION

| Nombres circuits          | Curve | Protection IN (A)                 | (autres) | P                | Section (mm²) |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| Voir plans                | -     | -                                 |          | -                | -             |
| Contrôle visuel (général) | OK    | Contact direct                    | OK       | Contact indirect | OK            |
| Raccordement              | OK    | schéma en annexe par Aceg asbl NA |          |                  |               |
| Liaisons équipotentielle  | BON   | Section des conducteurs           | OK       |                  |               |
| Continuité                | OK    | Éclairage / machines              | NVT      |                  |               |

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

N2 Aucune infraction.

N37 L'installation a été entamée avant le 01/06/2020

Notes : Installation existante avant le 01/06/2020: mise en conformité après transfert de propriété uniquement : voir plans - SDB existante équipotentielles supp. non visible. Habitation meublée lors de notre passage. Remplacement du matériel défectueux uniquement.

CONCLUSION

- ☒
- L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 13/2/2051
- ☒
- Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒
- Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut etre diffusé en copie.

Nombre d'annexe(s):

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

Durée de l'inspection: de 09:48 à 10:28

L'inspecteur Denis Nyssen

Denis Nyssen  
ACEG VZW - #512

Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.  
Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

**Qualité**  
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.  
Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.


Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site  
www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

| Feuille de route pour une installation qui est conforme:                 |                                                                                                              |                                                          |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Etape 1                                                                  | Etape 2                                                                                                      | Etape 3                                                  | Etape 4                                                          |
| Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes. | Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler. | Le prochain contrôle périodique est prévu pour 13/2/2051 | ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires. |





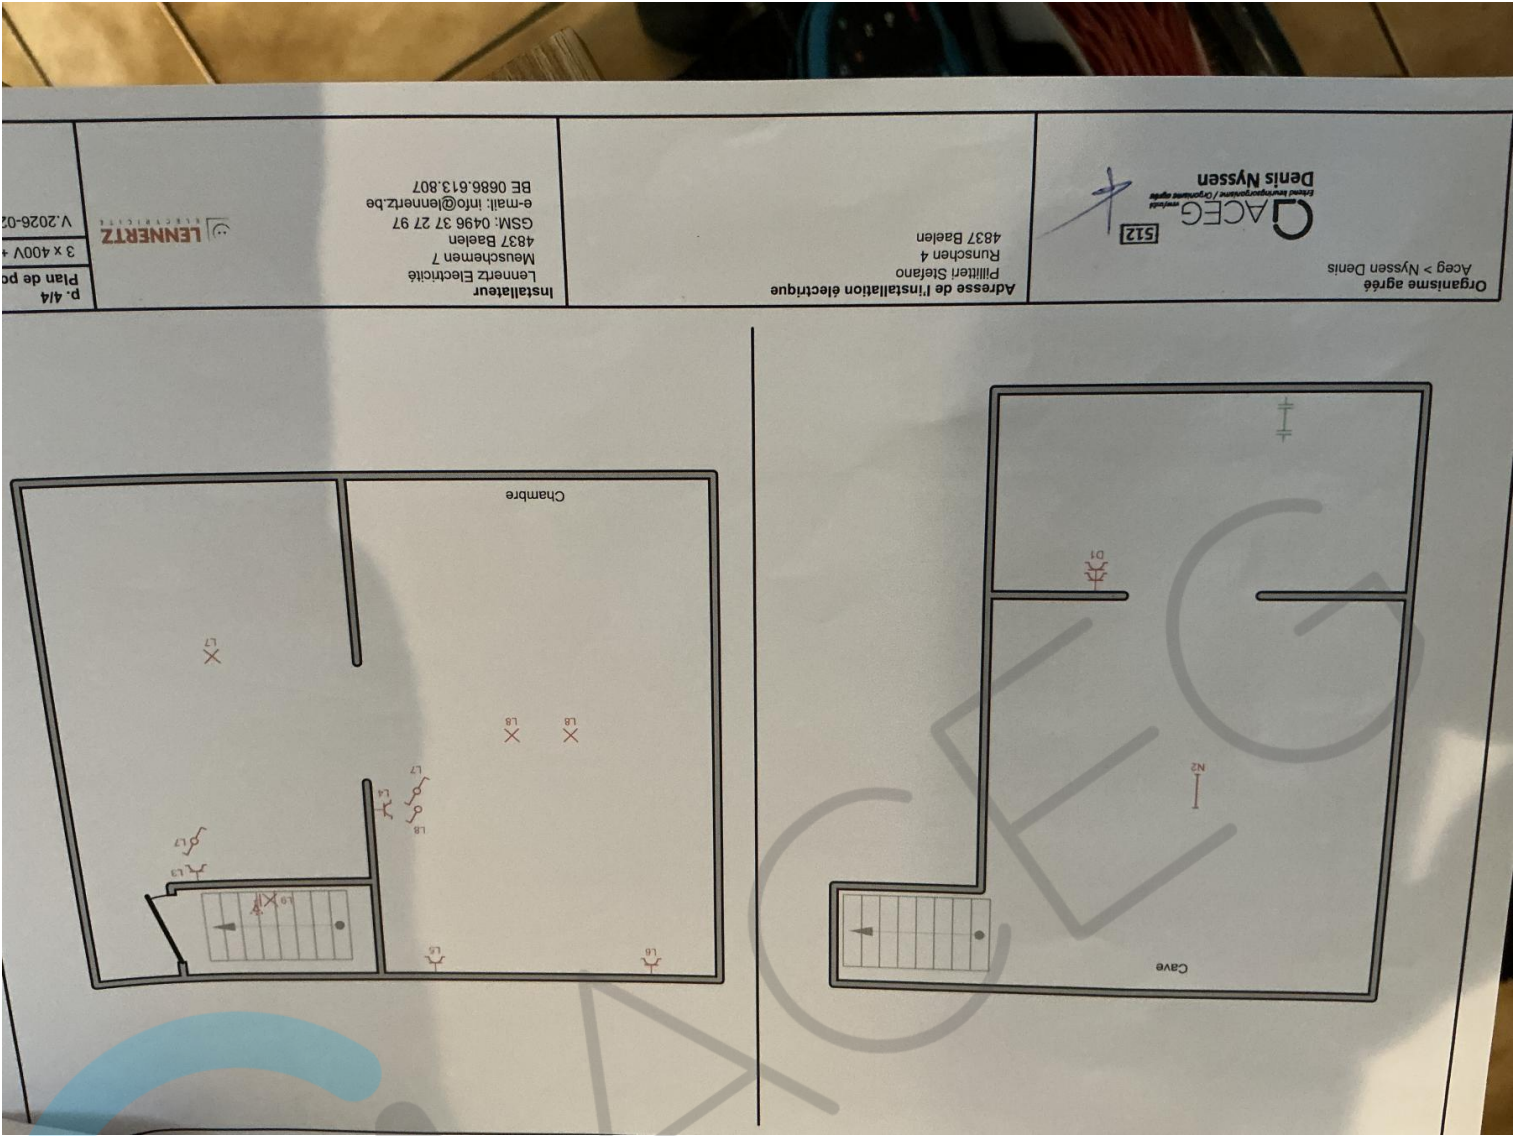

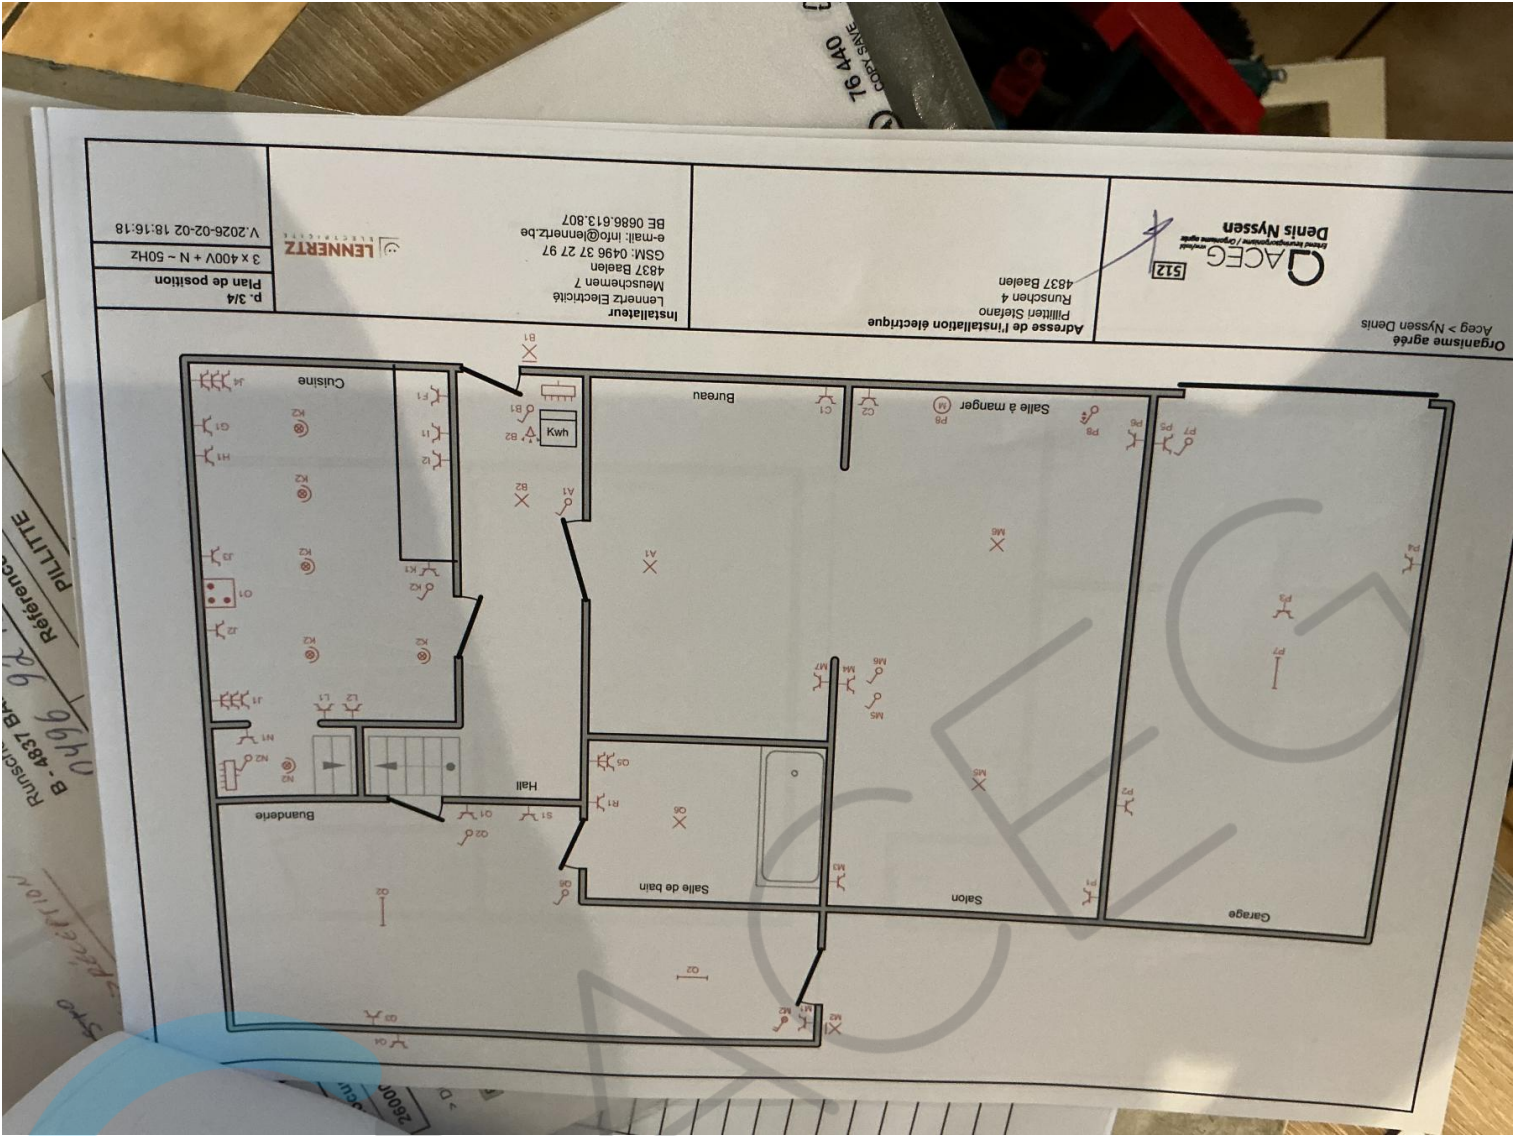

[illegible]

