

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 72/2020/64727/01:1

RÉF. 72/2020/64727/01:2

DATE DU CONTRÔLE 03/07/2020 AGENT VISITEUR Benoît Carlier
ADRESSE DU CONTRÔLE Rue des Artisans 19 - 4030 Grivegnée TYPE DE CONTRÔLE Visite de contrôle (6.5.)



› DONNÉES GÉNÉRALES

Adresse de l'installation	Rue des Artisans 19 - 4030 Grivegnée
Type de locaux	Unité d'habitation (maison)
Propriétaire	Van de Berg
Responsable des travaux	Huvelle Benoît
Dérogations applicables/appliquées	Anciennes installations électriques domestiques (8.2.1.) - Installations électriques domestiques ancien RGIE (8.2.2.)

› DONNÉES DU RACCORDEMENT

Gestionnaire du réseau de distribution (GRD)	NETHYS
Code EAN	541456700000309105
Numéro du compteur	661877
Index jour/nuit	09746,2/
Type de coupure générale	Interrupteur différentiel
Câble compteur - tableau	VFVB 4 x 10 mm ²
Tension nominale de service	3x230V - AC
Courant nominal de la protection de branchement	40A

› CONTRÔLE

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position	OK	Nombre de tableaux	3	Nombre de circuits	2+3+11
Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)					
Les fondations datent	D'avant le 1/10/1981	Dispositif différentiel de tête		ID - 40A - 300mA - type A - test OK	
Type d'électrode de terre	Piquets	Dispositif différentiel "sdb"		ID - 40A - 30mA - type A - test OK	
Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω)	26,9	Fixation/Etat/Détérioration matériel		OK	
Conformité des liaisons équipotentielles et des PE	OK	Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles		OK	
Test de continuité	Concluant	Protection contre les contacts directs		OK	
Contrôle boucle de défaut	Concluant	Résistance générale d'isolement (MΩ)		4,15	
Protection contre les contacts indirects	OK	Adéquation DPCCR – prise de terre		OK	
		Adéquation protections surintensités – sections		OK	

CONCLUSION : CONFORME

A la date du 03/07/2020, l'installation électrique de Rue des Artisans 19 - 4030 Grivegnée est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension. Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le 03/07/2045.

Le contrôle réalisé par Certinergie a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellées.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation sont (ou) ont été datés et signés.

Signature de l'agent



Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 72/2020/64727/01:1

RÉF. 72/2020/64727/01:2

Rappel sur les prescriptions réglementaires :

Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant de l'installation électrique est tenu :

- a) d'en assurer ou d'en faire assurer l'entretien ;
- b) de prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension soient en tout temps observés ;
- c) de conserver les documents, en ce compris le ou les rapports de contrôle, de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire ;
- d) de transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant ;
- e) d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques ;
- f) de renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique ;
- g) de laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité avant la mise en usage sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.
- h) des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension



EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 72/2020/64727/01:1

RÉF. 72/2020/64727/01:2

ANNEXES

Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

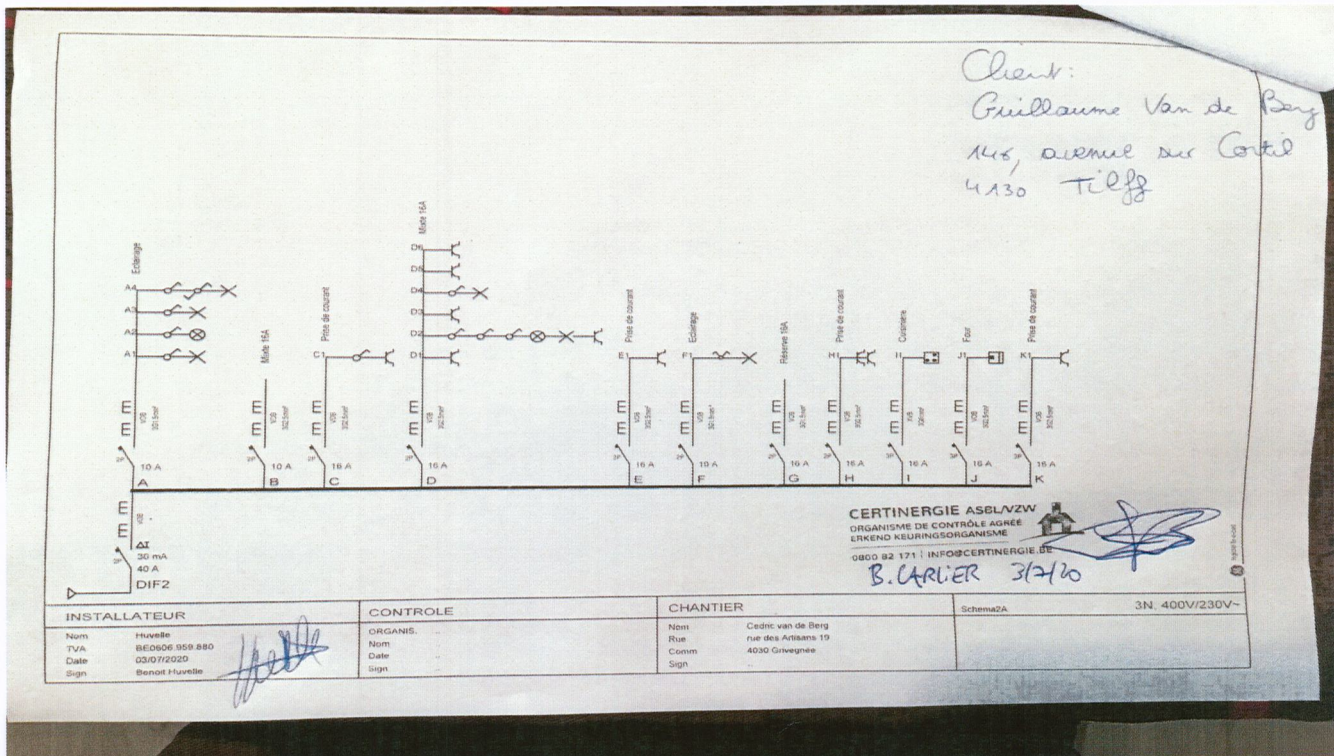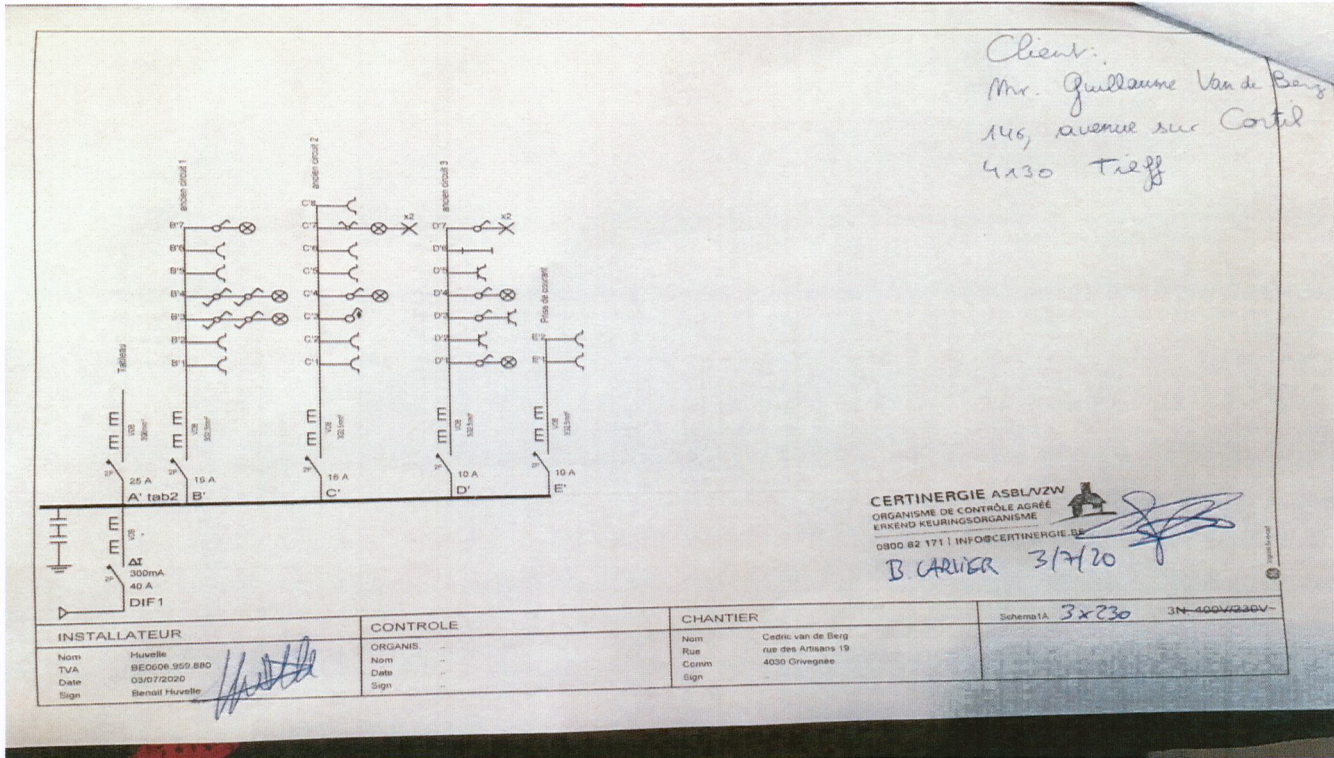

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension


EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 72/2020/64727/01:1

RÉF. 72/2020/64727/01:2

ANNEXES


Plan(s) de position de l'installation

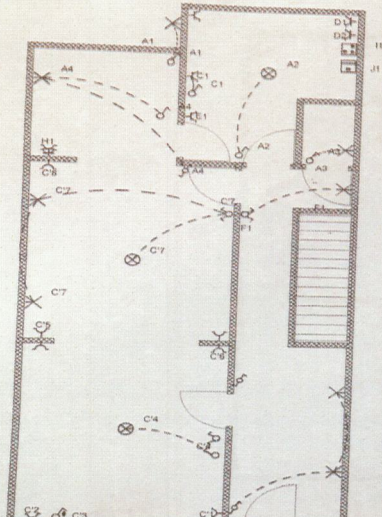

Client:
 Mr. J. Van de Berg
 146, avenue sur Cont
 4130 Tilly

CERTINERGIE ASBLVZW
 ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
 ERKEND KEURINGSORGANISME
 0800 82 171 | INFO@CERTINERGIE.BE
 B. CARLIER 3/7/20

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		RD	3x230	3N-100V/230V
Nom	Huvette	ORGANIS.		Nom	Cedric van de Berg			
TVA	BE0606 959 880	Nom		Rue	rue des Artisans 19			
Date	03/07/2020	Date		Comm	4030 Grivegnée			
Sign	Benoit Huvette	Sign		Sign				

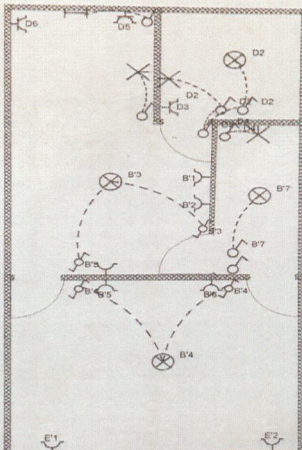

Client:
 Mr. Guillaume
 Van de Berg
 146, avenue sur Cont
 4130 Tilly

CERTINERGIE ASBLVZW
 ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
 ERKEND KEURINGSORGANISME
 0800 82 171 | INFO@CERTINERGIE.BE
 B. CARLIER 3/7/20

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		RD	3x230	3N-100V/230V
Nom	Huvette	ORGANIS.		Nom	Cedric van de Berg			
TVA	BE0606 959 880	Nom		Rue	rue des Artisans 19			
Date	03/07/2020	Date		Comm	4030 Grivegnée			
Sign	Benoit Huvette	Sign		Sign				

Rapport de contrôle d'installations électriques à basse et à très basse tension

EXEMPLAIRE ORIGINAL

CE RAPPORT ANNULE ET REMPLACE LE RAPPORT 72/2020/64727/01:1

RÉF. 72/2020/64727/01:2

ANNEXES

Plan(s) de position de l'installation

Client:
Mr. Guillaume
Van de Berg
Avenue sur Cortil, 146
4130 Tilly

CERTINERGIE ASBL/VZW
ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ
ERKENO KEURINGSORGANISME
0800 82 171 | INFO@CERTINERGIE.BE

B. CARLIER 3/7/20

INSTALLATEUR		CONTROLE		CHANTIER		R-1	IN-4000/230V
Nom	Huvele	ORGANIS.	-	Nom	Cedric van de Berg		
TVA	BE0606 959 880	Nom	-	Rue	rue des Artisans 10		
Date	03/07/2020	Date	-	Comm	4030 Grivegnée		
Sign	Benoit Huvelle	Sign	-	Sign	-		
