

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 09/09/2020 **Uitgiftedatum verslag:** 09/09/2020
Verslagnummer: 0043-200909-08

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
T: 03 216 28 90 E: btv.antwerpen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0043

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: ELEKTRO THYS
Adres: PARKLAAN 56, 2830 WILLEBROEK
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: RAVEN INVESTMENT REAL ESTATE
Adres: FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 1 BUS A, 2060 ANTWERPEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: ELEKTRO THYS
Adres: PARKLAAN 56, 2830 WILLEBROEK
BTW-nummer:

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: RAVEN INVESTMENT REAL ESTATE
Adres: Pioenstraat 24 / ALG. DELEN, 2060 ANTWERPEN
EAN- code:
Nummer teller: Nog te plaatsen
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.




Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V
 Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Type aardelektrode: Aardingsbaren
 Aantal borden: 1
 Aantal stroombanen: 6 (reserve inbegrepen)

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A
 Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA
 Type aardverbindingssysteem: TT

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's
 Zie ééndraadsschema en situatieschema.

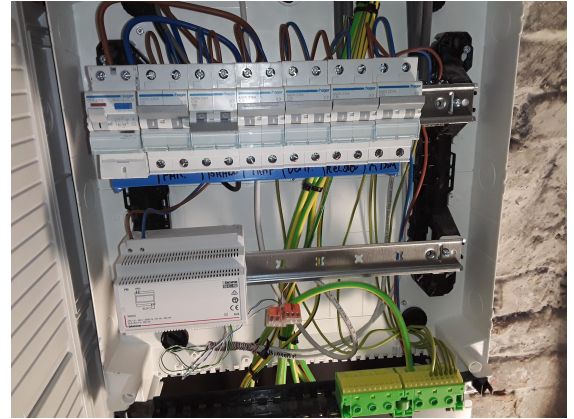

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 22 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 100 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Het begin van de werken van de elektrische installatie is gestart vóór 1 juni 2020, zie document nr. 001 gedateerd op 09-09-2020.

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/09/2045

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



