

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Brussel / Bruxelles, Humaniteitslaan 233 bus 4, 1620
DROGENBOS
T: 02 230 81 82, E: btv.brussel@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0545-180531-04 Datum van het onderzoek : 31/05/18
Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:


ADRES INSTALLATIE : huyssegoms
BEZENWEG 6
1760 ROOSDAAL

EIGENAAR : huyssegoms
Adres : BEZENWEG 6
1760 ROOSDAAL

OPDRACHTGEVER : IZEN ENERGY SYSTEMS
Adres : HOEKSKEN 56
2275 LILLE

INSTALLATEUR : IZEN ENERGY SYSTEMS
Adres : HOEKSKEN 56
2275 LILLE

Visualisatie van de installatie

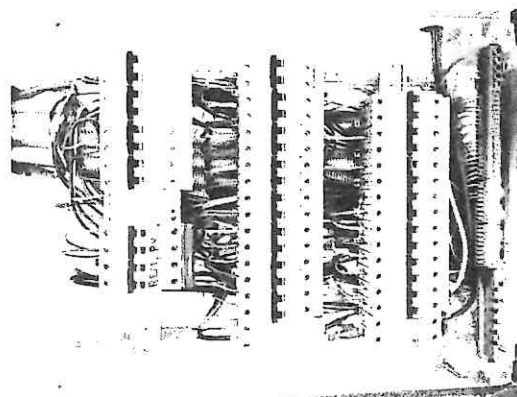

EAN : Teller nr. 31963481 Index :

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie :	Nieuwe Installatie /	Type der Lokalen :	zonnepanelen
Begin werken fundering:	Na 01/10/81	Elektrische installatie :	Na 01/10/81
Aansluiting spanning :	Mono 230V	AREI art. :	86
Voedingskabel hoofdbord :	2 x 10 mm ²	Bescherming van de aansluiting :	MAX 40 A
Type van de aardelektrode:	Lus	Alg. schakelaar: type :	2p 40A/300mA
Aantal borden :	1	Aantal eindstroombanen :	2
Uitwendige invloedsfactoren :		Schema :	TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,
Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 31/05/2043.

BTV Brussel / Bruxelles staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.
