



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Safety, quality and environmental services

Rapport n° : 30396850/14/621



F 071099

tél : 09 244 77 11
tél : 081 432 611

Rési code :

○ Antwerpen-Limburg tél : 03 221 86 11
○ Brabant tél : 02 674 57 11

○ Oost & West -Vlaanderen
○ Wallonie

PROCÈS VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BASSE TENSION

Responsable des travaux :

Installation :

Propriétaire / gestionnaire :

Nom, Prénom : <u>Gibson SPAL</u>	Nom, Prénom : <u>Chouffe de D'Amont 2101</u>
N° carte d'identité :	Adresse : <u>5100 WEPION</u>
N° TVA : BE	CP + Commune : <u>WEPION</u>
	Tél. :

Bases de l'examen : Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE)

☒ Art 270	☐ mise en usage	☐ modification	☐ extension	☒ Art 86	☐ Art 271bis	☒ Unité d'habitation
☐ Art 271	☐ mobile	☐ temporaire		☐ Art 87	☐ Art 278	☐ Unité de travail domestique
☐ Art 276 : renforcement	☐ Art 276bis : vente d'une unité d'habitation			☐ Art 88	☐ Art	☐ Parties communes
				☐ Art	☐ Art	☐ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique :

Données distributeur	EAN :	☐ EAN non communiqué	☒ Compt. kWh non placé
	Compt. kWh n° :	Index jour :	Index nuit :
	Protection branchement (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	n° :	
Données installation	Conçue pour U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type de prise de terre : ☒ boucle de terre ☐ barres / piquets	
	Courant nominal maximum (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100	☐	
	Câble d'alimentation tableau principal : <u>2</u> X <u>16</u> mm ² - Type : <u>XLS</u>	☐	
Description installation	Dispositif diff. gén. : <u>63</u> A / <u>300</u> mA	Nombre de tableaux : <u>1</u>	Nombre de circuits terminaux : <u>10</u>
☐ Voir annexe(s)			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés :

☒ Contacts dir.	☒ Contacts indir.	☒ Montage	☐ Appareils	☐ Matériel	☒ I>/section	☒ Schémas	☐ Contrôle bcl de défaut
☒ Résistance de dispersion de la prise de terre : <u>4</u> Ω		☐ Isolement général : <u>7.1</u> MΩ		☒ Continuité de terre		☐ Test dispositif diff.	
Le dispositif différentiel général : ☐ était plombé ☒ a été plombé ☐ n'a pas été plombé ☐ ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels : voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	
☐ Néant	
Infractions Installation existante	
☐ Néant	
Remarques	Visa GRD ou mandataire :
☐ Néant	

Conclusion(s) :

☒ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être recontrôlée avant

☒ par le même organisme de contrôle.

Agent visiteur :

Nom : ZORRE A

Agent n° : 4445

Date : 30/06/2014

Pour le Directeur Général : Signature

Annexe(s) :

☐ Schéma(s) de position

☐ Schéma(s) unifilaire(s)

- Ce procès verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
- Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
- Le contrôle n'a porté que sur les parties visibles et accessibles de l'installation.

- Les informations recueillies sur place ne nous permettent pas de déterminer la date de réalisation de l'installation électrique.
- Nous vous invitons à compléter le(s) schéma(s) pour les éléments qui n'étaient pas visibles lors de la visite de contrôle. En cas de doute portant sur la sécurité de ces éléments, nous vous invitons vivement à faire procéder à une visite de contrôle complémentaire.

(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

- A: Cuisinière.
- B: Prise buanderie.
- C: Prise buanderie.
- D: Eclairage cuisine , salon ,hall et deux prise dans la chambre 1.
- E: Prise de courant séjour + éclairage de la terrasse.
- F: Prise de courant cuisine.
- G: Prise et éclairage chambre.
- H: Prise de courant cuisine.
- I: Prise cuisine + cave.
- J: S.D.B.
- K: Prise de courant buanderie.
- L: Prise de courant buanderie.

Adresse de l'installation électrique
Appartement C. 1.1
Chaussée de Dinant 1201
5100 Weppion




Entreprise
GILSON Pierre
Electricité

Rue des Aubépines 63 GSM 0475/65 57 93
5101 Erpent Tel/Fax 081/31 01 87
N° Entreprise: R.P.M. Namur BE 0454 618 313

p. 5/5
Liste des circuits
2 x 230V ~ 50Hz

Cave.

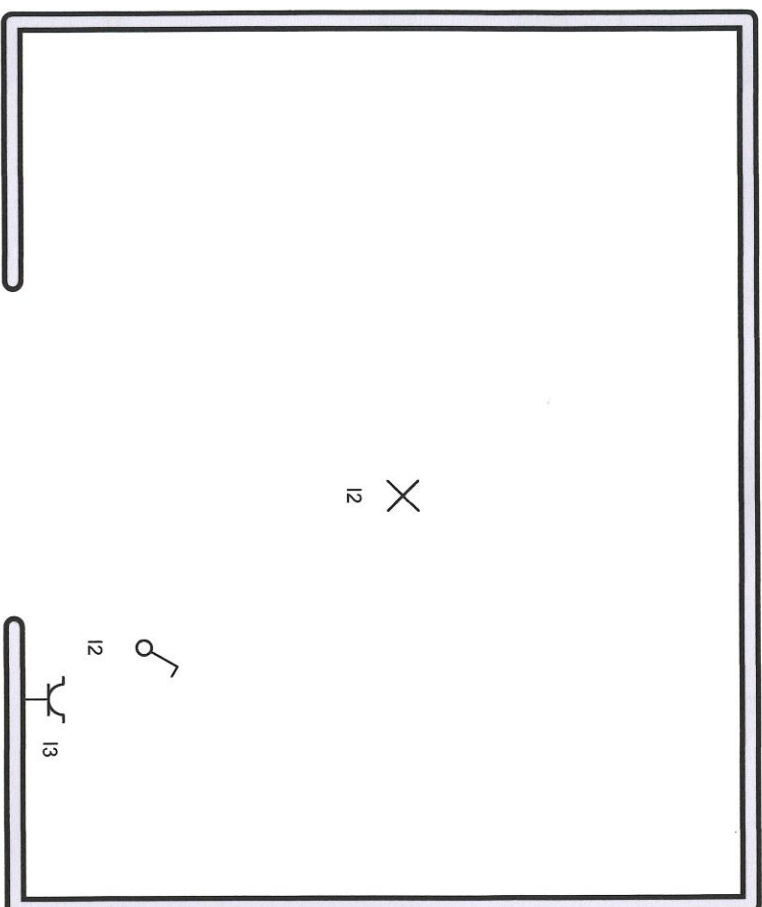

Adresse de l'installation électrique
Appartement C.1.1
Chaussée de Dinant 1201
5100 Wepion


Schéma dessiné par: Gilson Nicolas



Rue des Aubépines 63
5101 Erpent
GSM 0475/65 57 93
Tel-Fax 081/31 01 87

N° Entreprise: R.P.M. Namur BE 0454 618 313

p. 4/5
Schéma de position
2 x 230V ~ 50Hz

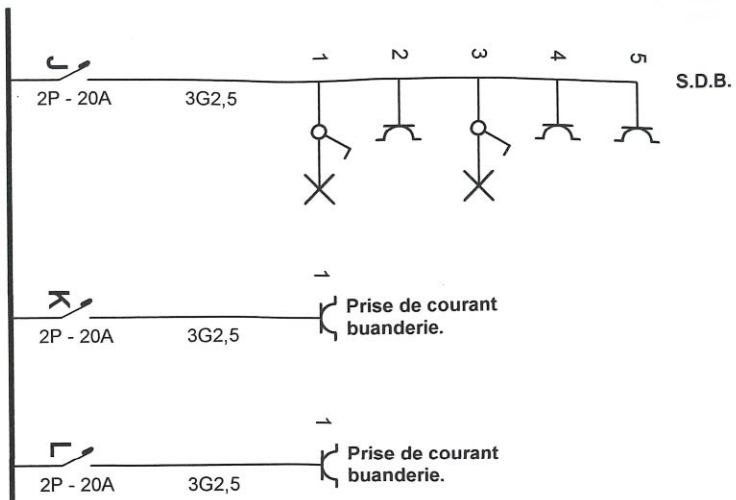

Adresse de l'installation électrique
Appartement C.1.1
Chaussée de Dinant 1201
5100 Wepion




Entreprise
GILSON Pierre
Electricité

Rue des Aubépines 63 GSM 0475/65 57 93
5101 Erpent Tel/Fax 081/51 01 87

N° Entreprise: R.P.M. Namur BE 0454 618 313

p. 2/5
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz

Schéma dessiné par: Gilson Nicolas

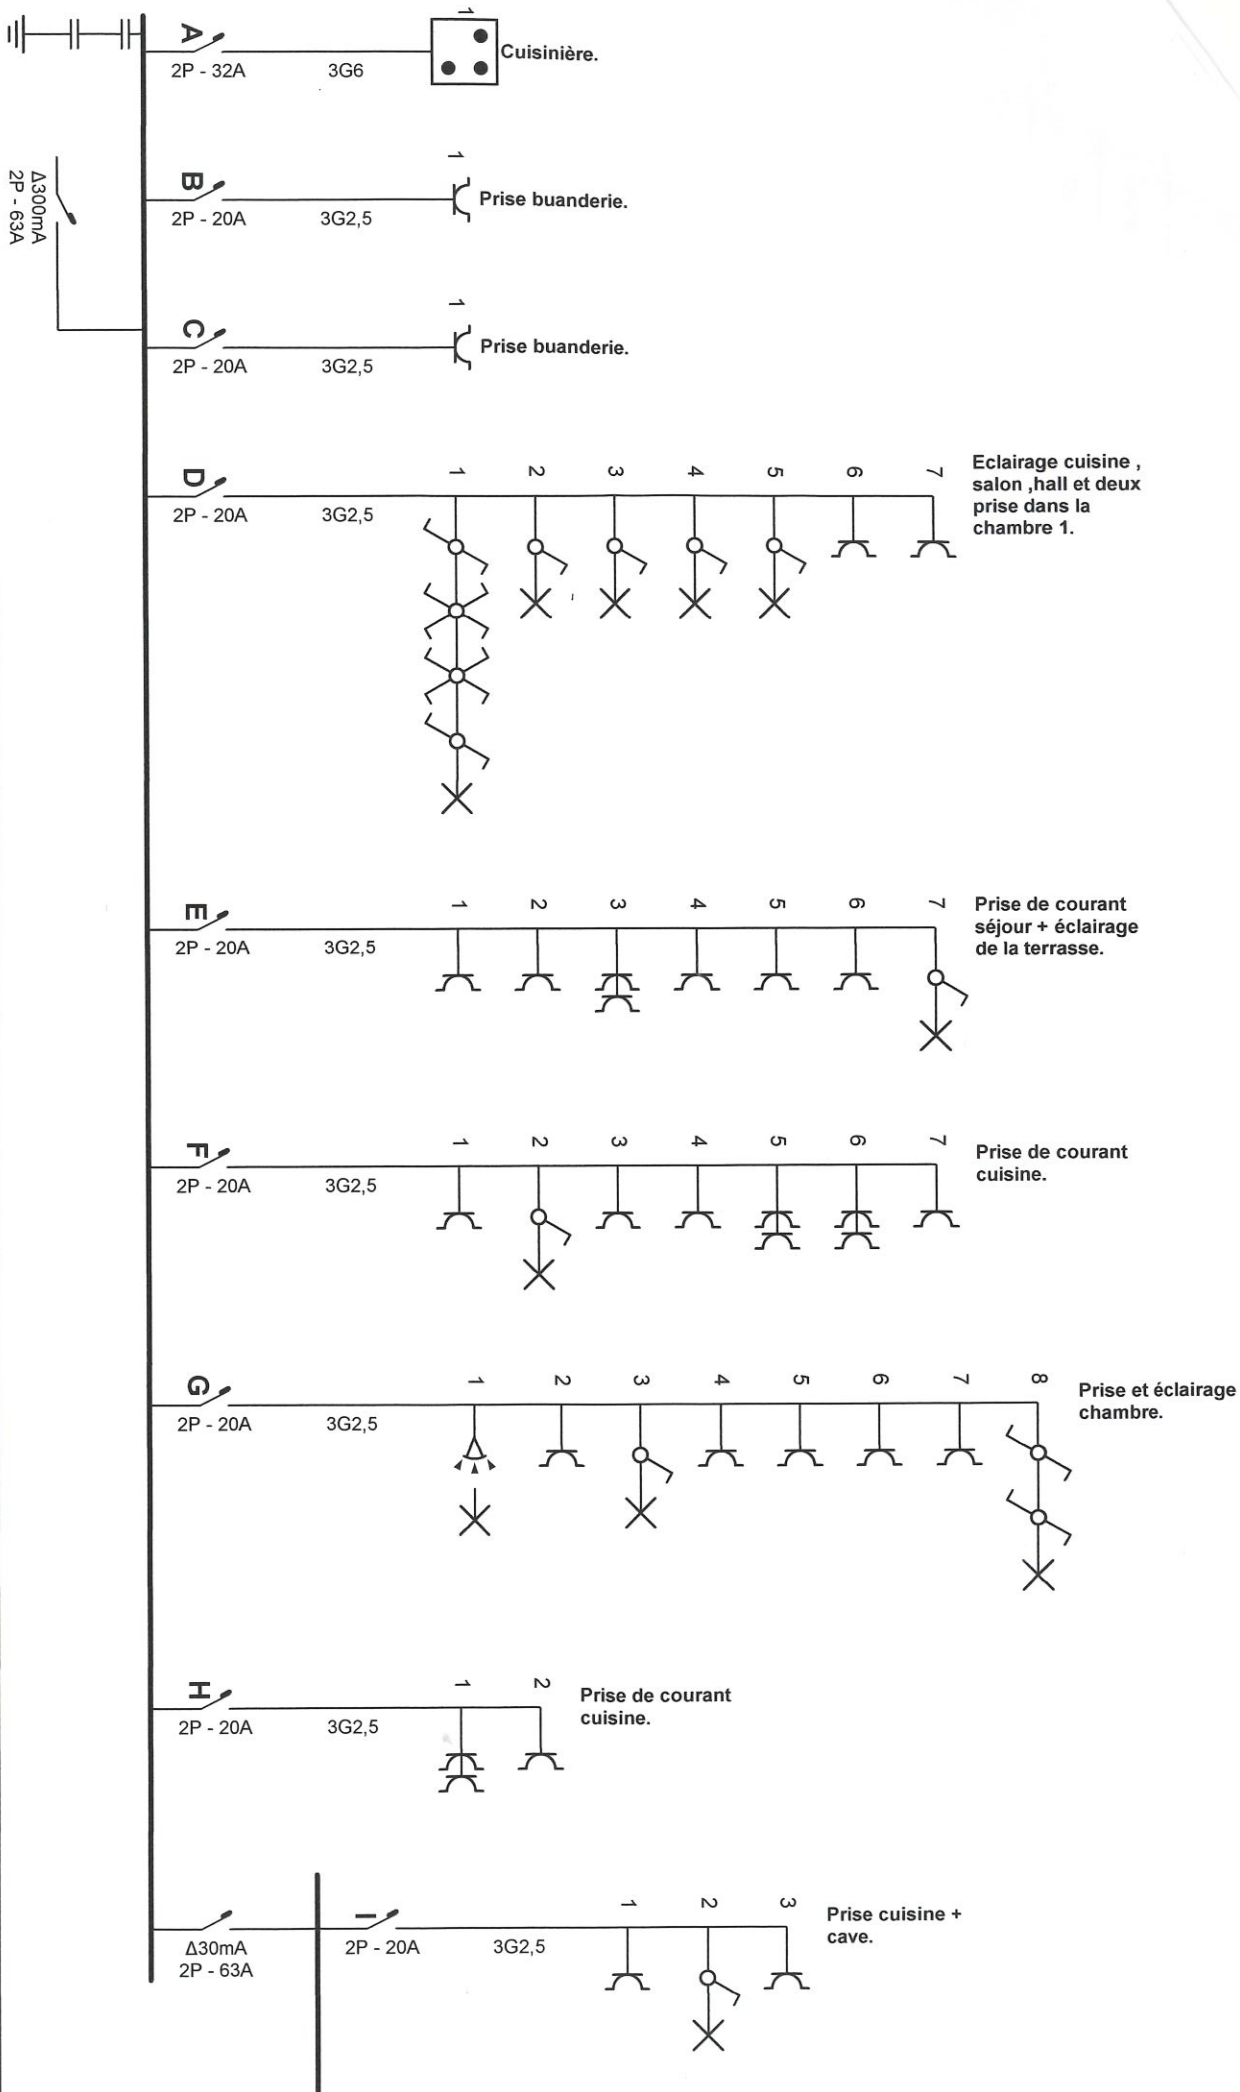

Adresse de l'installation électrique
Appartement C.1.1
Chaussée de Dinant 1201
5100 Weppion

Schéma dessiné par: Gilson Nicolas



Rue des Aubépines 63
5101 Erpelt

GSM 0475/65 57 93
Tel/Fax 081/31 01 87

N° Entreprise: R.P.H. Namur BE 0454 618 313

p. 1/5
Schéma unifilaire
2 x 230V ~ 50Hz
